

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算審核報告

中華民國 108 年度至 109 年度

審計長 陳瑞敏

前 言

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算，行政院於 110 年 4 月 30 日提出於監察院轉行到部，本部已於法定期限內，依法完成審核。

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於 106 年 7 月 7 日公布施行。行政院依據前瞻基礎建設特別條例第 7 條第 1 項：「中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以 4 年為期程，預算上限為新臺幣 4,200 億元，……以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議；其預算編製不受預算法第 23 條不得充經常支出規定之限制。」之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算，執行期間自 108 至 109 年度止，分 2 個年度實施。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算，歲入預算無列數，歲出預算數 2,229 億 5,405 萬餘元，決算審核結果，歲入決算經修正增列 8,793 萬餘元，審定實現數 4 億 5,897 萬餘元，應收數 8,793 萬餘元，合計決算審定數為 5 億 4,690 萬餘元；歲出決算經修正減列 10 億 6,489 萬餘元，審定實現數 1,668 億 4,377 萬餘元，應付保留數 494 億 6,079 萬餘元，合計決算審定數為 2,163 億 456 萬餘元，歲入歲出差短 2,157 億 5,766 萬餘元，經舉借債務 1,594 億 5,013 萬餘元支應，並配合歲出預算保留及國庫資金整體統籌調度，繼續保留債務之舉借預算 563 億 752 萬餘元，以支應以後年度需要。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算計推動軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全及人才培育促進就業等 8 類建設，109 項分支計畫，執行結果，據國家發展委員會評估，108 年度創造 2.84 至 3.1 萬個就業機會，及帶動民間投資 2,031.7 億元；109 年度創造 3.15 至 3.39 萬個工作機會，及帶動民間投資 3,387 億元。各項建設計畫已獲致具體成果，包括：軌道建設南迴鐵路全線電氣化業於 109 年 12 月 23 日通車，高雄至臺東間可縮短行車時間 27 分鐘，高雄至花蓮間可縮短行車時間 39 分鐘；水環境建設完成石門水庫、曾文水庫等 47 座水庫集水區控制土砂量 556.8 萬立方公尺、崩塌地整治面積 249.2 公頃、野溪整治長度 66.18 公里；綠能建設已分別於高雄永安、臺中龍井及彰化彰濱等地建置 7 座儲能示範系統，累計裝置容量 7.270MW/7.745MWh（百萬瓦/百萬瓦小時），達成 7MW/7MWh 之計畫目標；數位建設完成公務體系資安 A 級雲端資料中心 9 座，整併機房 207 座、實體主機降減 1,685 臺，降減比率 29.26%、建置防救災行動通訊平臺定點式 48 臺及機動式 18 臺，提供緊急通訊服務及建構資安監控分析通報平臺等；城鄉建設提升都市與城鄉區域道路及人行街道環境，綠化面積 53,563.8 平方公尺、管線下地長度 8,437.56 公尺、改善道路品質長度 506.82 公里、公共通行路障排除改善 1,222 處；因應少子化友善育兒空間建設補助增設或改善 205 處社區公共托育設施、45 處托育資源中心、106 處家庭（社會）福利服務中心及 21 處綜合社會福利館，擴充服務量能，增加民眾使用托育服務及福利服務之普及性與可近性；食品安全建設補助 21 市縣衛生局購置檢驗所需儀器設備計 442 套、標準品或試劑耗材，與聘用檢驗人力計 135 人，以提升檢驗量能，

市縣衛生局累計完成聯合分工檢驗體系檢驗 31,818 件、一般例行性檢驗 211,648 件，及通過衛生福利部食品藥物管理署實驗室認證之檢驗方法計 1,005 件；人才培育促進就業建設補助跨域實作場域 91 案、成立產業菁英訓練基地 26 案、建置類產業環境工廠 19 案及補助充實基礎教學實習設備 486 校次等。綜觀本特別預算執行結果，已有振興經濟，帶動國內經濟動能效果，相關建設計畫亦有實質進展，有助於對人民生活產生正面影響，惟整體預算執行力仍有努力空間，部分建設計畫之執行及管控機制與部分計畫完工後營運績效尚待持續研謀改善。

本部對於中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算執行之審核、計畫實施之考核及重要審核意見，已在本報告有關章節予以分析說明，以供參閱。

茲當本特別決算審核完竣，謹依法編具審核報告，敬請審議。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算審核報告

中華民國 108 年度至 109 年度

目 錄

前言

甲、總述

壹、預算執行之審核·····	甲— 1
一、歲入部分·····	甲— 1
二、歲出部分·····	甲— 1
(一) 主管機關別·····	甲— 1
(二) 建設類別·····	甲— 5
三、融資調度部分·····	甲— 8
貳、計畫實施之考核·····	甲— 8
參、重要審核意見·····	甲— 11
一、整體性意見·····	甲— 11
二、軌道建設·····	甲— 24
三、水環境建設·····	甲— 44
四、綠能建設·····	甲— 57
五、數位建設·····	甲— 66
六、城鄉建設·····	甲— 82
七、因應少子化友善育兒空間建設·····	甲— 103
八、食品安全建設·····	甲— 109

九、人才培育促進就業建設	甲—111
--------------------	-------

乙、最終審定數額表

壹、歲入歲出決算審定數簡明比較表	乙— 1
貳、審定後收支簡明比較分析表	乙— 3
參、融資調度決算審定表	乙— 5

丙、平衡表之查核	丙— 1
----------------	------

丁、其他附表

壹、歲入來源別決算審定表	丁— 1
貳、歲出政事別決算審定表	丁— 11
參、歲出機關別決算審定表	丁— 25
肆、歲入決算修正數明細表	丁— 53
伍、歲出決算修正數明細表	丁— 53
陸、歲入應收保留原因分析簡明表	丁— 55
柒、歲入超收原因分析簡明表	丁— 55
捌、歲出應付保留原因分析簡明表	丁— 57
玖、歲出賸餘原因分析簡明表	丁— 61

戊、附錄

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行成果	戊— 1
貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形	戊— 7
一、主管機關別	戊— 7
二、建設類別	戊— 10

參、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助地方政府計畫	
經費暨各地方政府自籌經費編列及執行情形·····	戊— 13
一、中央政府補助地方政府計畫經費編列及執行情形	戊— 13
(一) 主管機關別·····	戊— 13
(二) 建設類別·····	戊— 22
(三) 市縣別·····	戊— 28
二、地方政府自籌經費預算編列及執行情形·····	戊— 52
肆、國家發展委員會前瞻基礎建設計畫 109 年度總績效檢討	
報告第 2 期特別預算執行情形摘要 ·····	戊— 89

審編說明

- 一、內文及統計圖表敘及資料年度，以民國年度為原則，如引用國際資訊，或有以西元年度表達情形。
- 二、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算審核報告審編期間，國內新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心於 110 年 5 月 19 日宣布全國進入第三級疫情警戒，警戒期間並經延長至同年 7 月 26 日止，中央政府各機關除依執掌事項辦理疫情防治及紓困振興等業務，並依行政院人事行政總處通報，配合採行擴大彈性上班時間、異地辦公及居家辦公等分流作法。本部審核特別決算所提審核意見，部分機關囿於第三級疫情警戒期間人力調度等，無法如期聲復，爰本特別決算審核報告「甲、總述」所列重要審核意見，間有未一併揭露機關聲復內容情形。
- 三、約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 四、各決算書表內各細目金額係採四捨五入表達至元，而合計數係以各細目原值加總後，四捨五入表達至元，故表列各細目之和與合計數或有差異；各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 五、統計表內數值為零或數值無統計者，以「—」表示；數值尚未發布者，以「…」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，最多表達至小數點後 2 位，否則以「0」表示。
- 六、科技部所屬中部科學工業園區管理局及南部科學工業園區管理局，於 108 年 12 月 13 日分別更名為中部科學園區管理局及南部科學園區管理局，其機關名稱以事實發生時點之名稱為表達原則。

甲、總述

壹、預算執行之審核

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算，歲入預算數無列數，歲出預算數 2,229 億 5,405 萬餘元，全數以舉借債務支應。茲將預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入部分

歲入預算無列數，決算審核結果，修正增列應收保留數 8,793 萬餘元，係內政部營建署應收廢舊物資售價收入，審定實現數 4 億 5,897 萬餘元，主要係交通部公路總局變賣刨除料收入；應收數 8,793 萬餘元，主要係內政部營建署應收廢舊物資售價收入，合計決算審定數 5 億 4,690 萬餘元。

二、歲出部分

歲出預算 2,229 億 5,405 萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數 10 億 6,489 萬餘元，增列應付數 1 億 7,013 萬餘元及保留數 8 億 9,476 萬餘元，審定實現數 1,668 億 4,377 萬餘元（74.83%），應付保留數 494 億 6,079 萬餘元（22.18%），合計決算審定數為 2,163 億 456 萬餘元，預算賸餘 66 億 4,948 萬餘元（2.98%）。茲依主管機關別及建設類別分述如次：

（一） 主管機關別

1. 總統府主管：預算數 8 億 476 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 7 億 7,013 萬餘元（95.70%），預算賸餘 3,462 萬餘元（4.30%），主要係中央研究院執行建設下世代科研與智慧學習環境計畫經費結餘。

2. 行政院主管：預算數 48 億 4,224 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 42 億 9,953 萬餘元（88.79%），應付保留數 4 億 7,780 萬餘元（9.87

％），主要係原住民族委員會、行政院（本院）及客家委員會補助市縣政府辦理部落之心示範點、強化政府基層機關資安防護及區域聯防、客家浪漫臺三線等計畫，部分補助工程因多次變更設計、工期延宕等尚未完工，或採購案未完成驗收作業，或未及完成結報作業等，須保留繼續執行。合計決算審定數為 47 億 7,734 萬餘元，預算賸餘 6,490 萬餘元（1.34％），主要係補助計畫經費結餘。

3. **內政部主管：**預算數 333 億 3,815 萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數 1 億 7,013 萬餘元，增列應付數 1 億 7,013 萬餘元，係營建署補助地方政府經費，尚未支用即逕列實現數；審定實現數 233 億 7,785 萬餘元（70.12％），應付保留數 91 億 6,788 萬餘元（27.50％），主要係營建署補助地方政府辦理城鎮之心工程計畫，因合約期程跨年度，或部分地方政府尚未完成核銷作業等，須保留繼續執行。合計決算審定數為 325 億 4,573 萬餘元，預算賸餘 7 億 9,241 萬餘元（2.38％），主要係補助計畫經費結餘。

4. **財政部主管：**預算數 7 億 6,687 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 7 億 6,674 萬餘元（99.98％），預算賸餘 12 萬餘元（0.02％），主要係財物採購及補助計畫經費結餘。

5. **教育部主管：**預算數 191 億 1,826 萬元，決算審核結果，修正減列實現數 8 億 9,476 萬餘元，增列保留數 8 億 9,476 萬餘元，主要係體育署補助地方政府辦理營造休閒運動環境計畫，尚未支用即逕列實現數；審定實現數 144 億 2,516 萬餘元（75.45％），應付保留數 41 億 3,047 萬餘元（21.60％），主要係體育署補助地方政府辦理營造休閒運動環境計畫，因執行期程跨年度或採購多次流廢標影響執行進度，須保留繼續執行。合計決算審定數為 185 億 5,564 萬餘元，預算賸餘 5 億 6,261 萬餘元（2.94％），主要係補助計畫經費結餘。

6. **法務部主管：**預算數 8,918 萬元，決算審核結果，審定實現數 8,918 萬元（100.00%），已全數執行完畢。

7. **經濟部主管：**預算數 592 億 3,694 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 465 億 7,159 萬餘元（78.62%），應付保留數 100 億 6,761 萬餘元（17.00%），主要係水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善與全國水環境改善等計畫期程跨年度；能源局辦理高雄海洋科技產業創新專區等計畫，因當地漁民抗爭或受新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫情等影響執行進度，須保留繼續執行。合計決算審定數為 566 億 3,920 萬餘元，預算賸餘 25 億 9,774 萬餘元（4.39%），主要係水利署辦理全國水環境改善計畫及營繕工程，暨能源局辦理高雄海洋科技產業創新專區等委辦計畫之經費結餘。

8. **交通部主管：**預算數 569 億 5,082 萬元，決算審核結果，審定實現數 413 億 8,809 萬餘元（72.67%），應付保留數 146 億 5,869 萬餘元（25.74%），主要係臺鐵電務智慧化提升計畫招標作業延誤、臺南市區鐵路地下化計畫因民眾抗爭及部分工程挖掘發現遺構，致局部停工、桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運暨土地整合發展計畫工程預付款未達核銷轉正標準，及軌道技術研究暨驗證中心計畫因缺工及天候影響，致土建工程進度落後，須保留繼續執行。合計決算審定數為 560 億 4,679 萬餘元；預算賸餘 9 億 402 萬餘元（1.59%），主要係臺中港離岸風電產業專區辦理臺中港 5A 碼頭改建、5B 碼頭新建暨淺水船渠整建工程及臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫依現地實際施作數量減帳之經費結餘。

9. **原子能委員會主管：**預算數 1 億 9,600 萬元，決算審核結果，審定實現數 1 億 9,597 萬餘元（99.99%），預算賸餘 2 萬餘元（0.01%），係採購經費結餘。

10. **農業委員會主管：**預算數 74 億 546 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 64 億 7,582 萬餘元（87.45%），應付保留數 5 億 521 萬餘元（6.82%），主要係漁業署補助地方政府辦理漁業環境營造工程，暨林務局辦理阿里山林業鐵路第一分道周邊護坡加強及排水改善等工程，因部分計畫多次流標、受天候因素停工、施工履約爭議，及受規劃或發包作業時程影響，致執行進度未如預期，須保留繼續執行。合計決算審定數為 69 億 8,104 萬餘元，預算賸餘 4 億 2,442 萬餘元（5.73%），主要係工程經費結餘。

11. **衛生福利部主管：**預算數 73 億 272 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 23 億 4,872 萬餘元（32.16%），應付保留數 43 億 8,691 萬餘元（60.07%），主要係整建長照衛福據點計畫，補助部分地方政府案件，工程合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為 67 億 3,564 萬餘元，預算賸餘 5 億 6,707 萬餘元（7.77%），主要係補助地方政府辦理建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫經費結餘。

12. **環境保護署主管：**預算數 50 億 5,209 萬元，決算審核結果，審定實現數 26 億 1,078 萬餘元（51.68%），應付保留數 24 億 893 萬餘元（47.68%），主要係補助地方政府辦理污水截流及水質淨化等水環境改善工作，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為 50 億 1,971 萬餘元，預算賸餘 3,237 萬餘元（0.64%），主要係補助及委辦計畫經費結餘。

13. **文化部主管：**預算數 154 億 3,667 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 116 億 7,525 萬餘元（75.63%），應付保留數 34 億 5,019 萬餘元（22.35%），主要係補助地方政府辦理再造歷史現場計畫，因部分市縣政府辦理招標多次流標或前期規劃設計作業期程延宕，須保留繼續執行。合計決算審定數為 151 億 2,544 萬餘元，預算賸餘 3 億 1,123 萬餘元（2.02%），主要係補助及委辦計畫經費結餘。

14. **科技部主管：**預算數 123 億 3,839 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 117 億 7,881 萬餘元（95.46%），應付保留數 2 億 175 萬餘元（1.64%），主要係南部科學園區管理局辦理園區智慧機器人創新自造基地計畫之補助案件，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為 119 億 8,056 萬餘元，預算賸餘 3 億 5,782 萬餘元（2.90%），主要係國家科學技術發展基金加速綠能科學城建置計畫及年輕學者養成計畫等補助經費結餘。

15. **金融監督管理委員會主管：**預算數 1,470 萬元，決算審核結果，審定實現數 1,463 萬餘元（99.58%），預算賸餘 6 萬餘元（0.42%），係採購經費結餘。

16. **國軍退除役官兵輔導委員會主管：**預算數 6,076 萬元，決算審核結果，審定實現數 5,545 萬餘元（91.27%），應付保留數 530 萬餘元（8.73%），主要係該會資料中心平臺管理系統建置案，因廠商開發期程落後，尚未完成驗收程序，須保留繼續執行。合計決算審定數為 6,075 萬餘元，預算賸餘 2,299 元（0.00%），係採購經費結餘。

（二） 建設類別（表1）

1. **軌道建設：**預算數 416 億 2,043 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 274 億 7,926 萬餘元（66.02%），應付保留數 137 億 3,386 萬餘元（33.00%），主要係臺鐵電務智慧化提升計畫招標作業延誤、臺南市區鐵路地下化計畫因民眾抗爭及部分工程挖掘發現遺構，致局部停工、桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運暨土地整合發展計畫工程預付款未達核銷轉正標準，及軌道技術研究暨驗證中心計畫因缺工及天候影響，致土建工程進度落後，須保留繼續執行。合計決算審定數 412 億 1,313 萬餘元，預算賸餘 4 億 729 萬餘元（0.98%），主要係臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫依現地實際施作數量減帳之經費結餘。

2. **水環境建設：**預算數 581 億 5,576 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 441 億 4,002 萬餘元(75.90%)，應付保留數 109 億 9,680 萬餘元(18.91%)，主要係水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善與全國水環境改善等計畫期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 551 億 3,682 萬餘元，預算賸餘 30 億 1,894 萬餘元 (5.19%)，主要係全國水環境改善計畫、營繕工程等經費結餘。

3. **綠能建設：**預算數 114 億 504 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 90 億 9,817 萬餘元 (79.77%)，應付保留數 15 億 5,372 萬餘元 (13.62%)，主要係能源局辦理高雄海洋科技產業創新專區等計畫，因當地漁民抗爭或受新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情等影響執行進度，須保留繼續執行。合計決算審定數 106 億 5,189 萬餘元，預算賸餘 7 億 5,314 萬餘元 (6.60%)，主要係能源局辦理高雄海洋科技產業創新專區等委辦計畫之經費結餘。

4. **數位建設：**預算數 272 億 3,093 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 251 億 4,944 萬餘元 (92.36%)，應付保留數 16 億 795 萬餘元 (5.90%)，主要係文化部及所屬辦理發展數位文創計畫，補助或委託計畫合約期程跨年度；暨行政院、內政部及所屬、衛生福利部推動資安基礎建設計畫，受補助地方政府尚未完成驗收及結報作業、廠商履約進度延宕、合約期程跨年度等，須保留繼續執行。合計決算審定數 267 億 5,739 萬餘元，預算賸餘 4 億 7,353 萬餘元(1.74%)，主要係各機關按業務需要減少支付之賸餘及補助計畫經費之結餘。

5. **城鄉建設：**預算數 719 億 7,519 萬元，決算審核結果，修正減列實現數 10 億 3,538 萬餘元，增列應付數 1 億 7,013 萬餘元及保留數 8 億 6,525 萬餘元，主要係教育部、內政部補助地方政府分別辦理營造休閒運動環境及校園社區化改造計畫、提升道路品質計畫，尚未支用即逕列實現數；審定實現數 499 億 8,098 萬餘元 (69.44%)，應付保留數 206 億 6,858 萬餘元 (28.72%)，主要係衛生福

利部、教育部、文化部、內政部、經濟部補助地方政府分別辦理公共服務據點整備、營造休閒運動環境、文化生活圈建設、提升道路品質、開發在地型產業園區等計畫，合約期程跨年度，或招標作業延誤，或多次流廢標影響執行進度，須保留繼續執行。合計決算審定數 706 億 4,957 萬餘元，預算賸餘 13 億 2,561 萬餘元（1.84%），主要係教育部、衛生福利部、文化部、內政部補助地方政府分別辦理營造休閒運動環境、公共服務據點整備、文化生活圈建設、城鎮之心工程等計畫經費結餘。

6. **因應少子化友善育兒空間建設：**預算數 22 億 1,920 萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數 2,950 萬餘元，增列保留數 2,950 萬餘元，主要係教育部國民及學前教育署補助地方政府辦理校園社區化改善計畫—營造友善育兒空間，尚未支用即逕列實現數；審定實現數 10 億 6,040 萬餘元（47.78%），應付保留數 7 億 3,723 萬餘元（33.22%），主要係衛生福利部社會及家庭署補助地方政府修建綜合社會福利館等案件，因規劃或發包作業期程未如預期，及部分地方政府尚未完成核銷作業等，須保留繼續執行。合計決算審定數 17 億 9,763 萬餘元，預算賸餘 4 億 2,156 萬餘元（19.00%），主要係補助計畫經費結餘。

7. **食品安全建設：**預算數 5 億 6,154 萬元，決算審核結果，審定實現數 4 億 6,895 萬餘元（83.51%），應付保留數 8,612 萬餘元（15.34%），主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫之先期規劃採購案後續擴充及委託監造服務案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 5 億 5,508 萬餘元，預算賸餘 645 萬餘元（1.15%），主要係營繕工程經費結餘。

8. **人才培育促進就業建設：**預算數 97 億 8,593 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 94 億 6,652 萬餘元（96.74%），應付保留數 7,650 萬元（0.78%），主要係教育部補助大專校院辦理工具機教學設備更新計畫，合約期程跨年度，須

保留繼續執行。合計決算審定數 95 億 4,302 萬餘元，預算賸餘 2 億 4,291 萬餘元（2.48%），主要係科技部核定年輕學者養成計畫補助案件未如預期之結餘。

表 1 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算歲出決算簡表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	預算數	決算審定數					決算審定數與 預算數比較增減	
		實現數	應付數	保留數	合計	占預 算數 %	金額	%
合計	222,954,054	166,843,772	12,303,420	37,157,375	216,304,568	97.02	- 6,649,485	- 2.98
軌道建設	41,620,432	27,479,269	6,622	13,727,245	41,213,137	99.02	- 407,294	- 0.98
水環境建設	58,155,767	44,140,022	8,996,549	2,000,255	55,136,826	94.81	- 3,018,940	- 5.19
綠能建設	11,405,048	9,098,178	—	1,553,721	10,651,899	93.40	- 753,148	- 6.60
數位建設	27,230,937	25,149,442	237,803	1,370,151	26,757,397	98.26	- 473,539	- 1.74
城鄉建設	71,975,190	49,980,980	3,062,445	17,606,143	70,649,570	98.16	- 1,325,619	- 1.84
因應少子化友善育兒 空間建設	2,219,205	1,060,402	—	737,232	1,797,635	81.00	- 421,569	- 19.00
食品安全建設	561,540	468,956	—	86,124	555,080	98.85	- 6,459	- 1.15
人才培育促進就業建設	9,785,935	9,466,520	—	76,500	9,543,020	97.52	- 242,914	- 2.48

三、融資調度部分

債務之舉借預算數 2,229 億 5,405 萬餘元，決算審核結果，修正減列保留數 8,793 萬餘元，係配合歲入之修正，減列待舉借數，審定實現數 1,594 億 5,013 萬餘元（71.52%），保留數 563 億 752 萬餘元（25.26%），係配合各項未完工程經費需求及國庫資金整體統籌調度，須保留繼續執行。合計決算審定數 2,157 億 5,766 萬餘元，較預算減少 71 億 9,638 萬餘元（3.23%）。

貳、計畫實施之考核

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算，自 108 至 109 年度止，分 2 個年度實施，列有 98 項業務計畫，133 項工作計畫，分由總統府、行政院（含行政院、國立故宮博物院、國家發展委員會、原住民族委員會、客家委員會及所屬、

國家通訊傳播委員會)、內政部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、原子能委員會、農業委員會、衛生福利部、環境保護署、文化部、科技部、金融監督管理委員會及國軍退除役官兵輔導委員會等 16 個主管機關執行。執行結果，已完成者 56 項 (42.11%)，尚待繼續執行者 77 項 (57.89%) (表 2)。茲將各主管機關工作計畫執行情形分述如次：

表 2 各主管機關工作計畫執行結果彙總表

主管機關名稱	工作計畫 項數	已完成計畫 項數	尚待繼續執 行計畫項數
合計	133	56	77
總統府	4	4	—
行政院	8	1	7
內政部	15	3	12
財政部	2	2	—
教育部	13	6	7
法務部	2	2	—
經濟部	22	11	11
交通部	19	5	14
原子能委員會	1	1	—
農業委員會	11	4	7
衛生福利部	7	1	6
環境保護署	3	—	3
文化部	13	7	6
科技部	11	8	3
金融監督管理委員會	1	1	—
國軍退除役官兵輔導委員會	1	—	1

一、總統府主管：業務計畫 3 項，下分工作計畫 4 項，包含發展數位文創、建構開放政府及智慧城鄉服務、建構下世代科研與智慧學習環境、前瞻技術驗證及健全綠色金融機制等項目，已全數執行完成。

二、行政院主管：業務計畫 7 項，下分工作計畫 8 項，包含推動資安基礎建設、發展數位文創、保障寬頻人權、原民部落營造、客家浪漫臺三線等項目，其中已執行完成者 1 項，尚在執行者 7 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

三、內政部主管：業務計畫 12 項，下分工作計畫 15 項，包含推動資安基礎建設、公共服務據點整備、城鎮之心工程、提升道路品質、水與發展、水與安全、水與環境、加速綠能科學城建置、建構開放政府及智慧城鄉服務、保障寬頻人權等項目，其中已執行完成者 3 項，尚在執行者 12 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

四、財政部主管：業務（工作）計畫 2 項，係推動資安基礎建設，已全數執行完成。

五、教育部主管：業務計畫11項，下分工作計畫13項，包含推動資安基礎建設、保障寬頻人權、建設下世代科研與智慧學習環境、校園社區化改造、人才培育促進就業建設、少子化友善育兒空間建設、營造休閒運動環境等項目，其中已執行完成者6項，尚在執行者7項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

六、法務部主管：業務（工作）計畫2項，係推動資安基礎建設，已全數執行完成。

七、經濟部主管：業務計畫15項，下分工作計畫22項，包含推動資安基礎建設、建構開放政府及智慧城鄉服務、公共服務據點整備、開發在地型產業園區、前瞻技術驗證及健全綠色金融機制、水與發展、水與安全、水與環境、保障寬頻人權、完備綠能技術及建設、加速綠能科學城建置等項目，其中已執行完成者11項，尚在執行者11項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

八、交通部主管：業務計畫10項，下分工作計畫19項，包含推動資安基礎建設、高鐵臺鐵連結成網、臺鐵升級及改善東部服務、中南部觀光鐵路、完備綠能技術及建設、鐵路立體化及通勤提速、都市推動捷運、建構開放政府及智慧城鄉服務、水與環境、加速綠能科學城建置、改善停車問題、提升道路品質、水與安全等項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者14項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

九、原子能委員會主管：業務（工作）計畫1項，係前瞻技術驗證及健全綠色金融機制，已執行完成。

十、農業委員會主管：業務計畫9項，下分工作計畫11項，包含水與安全、水與發展、建構開放政府及智慧城鄉服務、中南部觀光鐵路、水與環境等項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者7項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十一、衛生福利部主管：業務計畫6項，下分工作計畫7項，包含公共服務據

點整備、推動資安基礎建設、保障寬頻人權、食品安全建設、少子化友善育兒空間建設等項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者6項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十二、環境保護署主管：業務計畫2項，下分工作計畫3項，包含水與發展、水與環境、建構開放政府及智慧城鄉服務等項目，全數尚在執行中，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十三、文化部主管：業務計畫12項，下分工作計畫13項，包含推動資安基礎建設、發展數位文創、文化生活圈建設等項目，其中已執行完成者7項，尚在執行者6項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十四、科技部主管：業務計畫4項，下分工作計畫11項，包含建構開放政府及智慧城鄉服務、建設下世代科研與智慧學習環境、加速綠能科學城建置、推動國際產學聯盟、青年科技創新創業基地建置、重點產業高階人才培訓與就業、年輕學者養成、領袖學者助攻方案等項目，其中已執行完成者8項，尚在執行者3項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十五、金融監督管理委員會主管：業務（工作）計畫1項，係推動資安基礎建設，已執行完成。

十六、國軍退除役官兵輔導委員會主管：業務（工作）計畫1項，係推動資安基礎建設，尚在執行中，原因詳「壹、預算執行之審核」。

參、重要審核意見

一、整體性意見

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，規劃辦理前瞻基礎建設計畫，並制定

前瞻基礎建設特別條例。行政院依據該條例第 7 條第 1 項規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算（下稱前瞻第 1 期特別預算）及中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算（下稱前瞻第 2 期特別預算）。前瞻第 1 期特別預算執行期間自 106 至 107 年度止，歲出預算數 1,070 億 7,084 萬餘元，分由總統府、行政院及內政部等 14 個主管機關辦理 76 項業務計畫，105 項工作計畫。前瞻第 2 期特別預算執行期間自 108 至 109 年度止，歲出預算數 2,229 億 5,405 萬餘元，分由總統府、行政院及內政部等 16 個主管機關辦理 98 項業務計畫，133 項工作計畫。截至 109 年底止，前瞻第 1 期及第 2 期特別預算實現數合計 2,635 億 5,574 萬餘元，共計辦理 121 項分支計畫，部分計畫（工程）已完工營運並獲致具體成效，例如經濟部水利署伏流水開發工程計畫辦理之高雄溪埔（109 年 5 月完工）、大泉（110 年 1 月啟用）伏流水工程，於 110 年 3 月乾旱時每日供應 16.3 萬噸伏流水，分別占高屏溪伏流水供給量及大高雄地區用水量之 48.22% 及 10.19%，有助於緩解大高雄地區旱象；110 年初完工之桃園－新竹備援管線工程計畫，透過管線進行區域調度，每日由石門水庫支援水情嚴峻之新竹 20 萬噸用水，占大新竹每日用水量 56 萬噸之 1/3，另水利署防災及備援水井建置計畫建置之頭前溪高灘地 17 口備援水井，亦因應 110 年旱季支援新竹缺水地區，每日取水約 3 萬噸，占新竹地區每日 56 萬噸用水量之 5%，均有助於紓緩新竹地區水情；臺灣港務股份有限公司辦理臺中港離岸風電產業專區計畫之 106 號碼頭新建工程，以其工程量體較一般碼頭多出 1.3 倍至 1.5 倍，但採經濟性佳、工期短、易施工及節能減碳設計，建造成本較傳統棧橋碼頭降低 40%、興建工期縮短 30%，且施工期間對海域生態、水質、空氣品質等，均無造成污染，經提報第 20 屆公共工程金質獎，獲優等獎殊榮；公路總局改善停車問題計畫補助地方政府興建停車場，其中新北市三重商工地下停車場 108 年 9 月開始營運，109 年度每月尖峰停車率皆超過 9 成，平均停車率皆超過 8 成，有效改善當地停車問題等。經查前瞻第 1 期及第 2 期特別預算整體執行情形，核有下列重要審核意見：

（一） 前瞻第2期特別預算保留比率22.18%遠高於109年度總決算資本門保留比率7.13%，其中軌道建設計畫14項分支計畫無實現數；第1期特別預算已屆期

2年，仍有3成分支計畫尚未執行完竣，其中軌道建設計畫6項分支計畫迄無實現數，允宜積極檢討研謀改善。

前瞻第2期特別預算歲出預算數2,229億5,405萬餘元，執行結果，實現數1,668億4,377萬餘元，占預算數之74.83%，實現率最低者為衛生福利部，僅32.16%，其次為環境保護署之51.68%，再其次為內政部之70.12%；應付保留數494億6,079萬餘元，占預算數之22.18%，遠高於109年度中央政府總決算資本門保留比率7.13%，保留金額最高者為交通部之146億5,869萬餘元（占預算數25.74%），其次為經濟部之100億6,761萬餘元（占預算數17.00%），再其次為內政部之91億6,788萬餘元（占預算數27.50%）（表1）。前瞻第2期特別預算編列補助地方政府計畫經費1,259億9,085萬元，據本部調查結果，實際補助地方政府經費1,145億4,654萬餘元，實現數819億5,712萬餘元，實現率71.55%，應付保留數312億1,294萬餘元，保留比率27.25%。前瞻第2期特別預算辦理之109項分支計畫中，計有86項分支計畫尚未執行完竣，預算保留比率超過2成者計有臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業等41項分支計畫，其中高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫、桃園都會區鐵路地下化計畫及恆春觀光鐵道計畫規劃作業等14項分支計畫無實現數（表2）；臺鐵電務智慧化提升計畫、全國水環境改善計畫、縣市管河川及區域排水整體改善計畫等14項分支計畫之保留金額超過10億元（表3）。中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算以前年度歲出轉入109年度執行數114億3,136萬餘元（其中補助地方政府經費86億3,229萬餘元），執行結果，實現數62億9,758萬餘元，實現率僅55.09%，須保留至下（110）年度繼續執行數44億1,495萬餘元（其中補助地方政府經費35億392萬餘元），占轉入數之38.62%，其中保留金額最高者為交通部17億7,771萬餘元，其次為經濟部9億6,138萬餘元，再其次為衛生福利部9億1,988萬餘元（表4）。第1期特別預算辦理之103項分支計畫中，尚有30項分支計畫未執行完竣，其中恆春觀光鐵道計畫規劃作業、臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業、桃園綠線延伸至中壢規劃作業、臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業、大臺中地區山海線計畫第一階段（大甲—追分、大慶—烏

表 1 前瞻第 2 期特別預算各主管機關歲出預算執行情形

108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

主管機關	預算數	實現數		應付保留數		賸餘數	
		金額	占預算數%	金額	占預算數%	金額	占預算數%
合計	222,954	166,843	74.83	49,460	22.18	6,649	2.98
總統府	804	770	95.70	—	—	34	4.30
行政院小計	4,842	4,299	88.79	477	9.87	64	1.34
行政院	1,066	881	82.68	170	15.94	14	1.38
原住民族委員會	1,515	1,299	85.77	213	14.09	2	0.14
客家委員會及所屬	1,187	1,134	95.53	53	4.47	—	—
國立故宮博物院	197	186	94.19	8	4.36	2	1.45
國家通訊傳播委員會	754	678	89.97	32	4.32	43	5.71
國家發展委員會	120	118	98.21	—	—	2	1.79
內政部	33,338	23,377	70.12	9,167	27.50	792	2.38
財政部	766	766	99.98	—	—	0.1	0.02
教育部	19,118	14,425	75.45	4,130	21.60	562	2.94
法務部	89	89	100.00	—	—	—	—
經濟部	59,236	46,571	78.62	10,067	17.00	2,597	4.39
交通部	56,950	41,388	72.67	14,658	25.74	904	1.59
原子能委員會	196	195	99.99	—	—	0.02	0.01
農業委員會	7,405	6,475	87.45	505	6.82	424	5.73
衛生福利部	7,302	2,348	32.16	4,386	60.07	567	7.77
環境保護署	5,052	2,610	51.68	2,408	47.68	32	0.64
文化部	15,436	11,675	75.63	3,450	22.35	311	2.02
科技部	12,338	11,778	95.46	201	1.64	357	2.90
金融監督管理委員會	14	14	99.58	—	—	0.06	0.42
國軍退除役官兵輔導委員會	60	55	91.27	5	8.73	0	0.00

表 2 前瞻第 2 期特別決算無實現數分支計畫

108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

項次	主管機關	分支計畫	預算數
1	交通部	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫	575
2	交通部	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫	408
3	交通部	桃園都會區鐵路地下化計畫	232
4	交通部	恆春觀光鐵道計畫規劃作業	55
5	交通部	臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業	51
6	交通部	高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）建設及周邊土地開發計畫	50
7	交通部	桃園綠線延伸至中壢規劃作業	49
8	交通部	新竹環線輕軌計畫規劃作業	46
9	交通部	臺中捷運藍線規劃作業	41
10	交通部	嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	30
11	交通部	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	30
12	交通部	新竹大車站平台計畫規劃作業	24
13	交通部	大臺中地區山海線計畫第一階段（大甲—追分、大慶—烏日）暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作業	10
14	交通部	臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業	7

註：1. 本表依預算數由高至低排序。

2. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

日)暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作業及臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業等6項分支計畫迄無實現數;保留金額最高者為桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫15億5,693萬餘元。綜計前瞻第1期及第2期特別預算共計辦理121項分支計畫,截至109年底止,計有90項分支計畫(占全部計畫數之74.38%)預算尚未執行完竣,保留金額共計538億7,575萬餘元,主要係因可行性評估研究或綜合規劃尚未奉核定或核定時程未如預期,影響後續之規劃作業或工程進度、已完成工項尚未辦理經費核銷、民眾抗爭、招標不順、計畫執行須待其他相關計畫核定或須配合相關法令修正計畫內容等所致,經函請行政院督促各機關針對計畫執行落後原因積極研謀改善,並滾動檢討預算執行大幅落後計畫後續年度預算編列額度,以提升預算執行率,避免預算資源閒置。

表 3 前瞻第2期特別決算應付保留數超過10億元分支計畫

108年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣百萬元

項次	主管機關	分支計畫	應付保留數
1	交通部	臺鐵電務智慧化提升計畫	4,735
2	經濟部	全國水環境改善計畫	4,235
3	經濟部	縣市管河川及區域排水整體改善計畫	3,970
4	教育部	營造休閒運動環境計畫	3,661
5	衛生福利部	整建長照衛福據點計畫	3,394
6	內政部	公有危險建築補強重建計畫	3,380
7	文化部	文化生活圈建設計畫	2,824
8	交通部	臺南市區鐵路地下化計畫	2,025
9	內政部	提升道路品質計畫—公共環境改善計畫(內政部)	1,989
10	經濟部	開發在地型產業園區計畫	1,957
11	內政部	城鎮之心工程計畫	1,954
12	交通部	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	1,590
13	交通部	軌道技術研究暨驗證中心計畫	1,517
14	經濟部	高雄海洋科技產業專區計畫	1,479

註：1. 本表依應付保留數金額由高至低排序。

2. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 4 前瞻第1期特別決算(以前年度保留部分)執行情形

109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣百萬元

主管機關	以前年度 轉入數	註 銷 數	實現數		應付保留數	
			金額	%	金額	%
合計	11,431	718	6,297	55.09	4,414	38.62
行政院小計	142	14	127	89.64	—	—
原住民族委員會	138	14	124	89.38	—	—
客家委員會及所屬	3	—	3	100.00	—	—
內政部	800	46	732	91.52	21	2.68
教育部	1,399	10	791	56.53	597	42.72
經濟部	3,579	617	2,000	55.88	961	26.86
交通部	2,632	0.4	854	32.46	1,777	67.52
農業委員會	217	2	172	79.30	42	19.59
衛生福利部	1,661	12	729	43.89	919	55.37
環境保護署	806	2	773	95.88	31	3.86
文化部	183	12	108	59.13	62	34.25
科技部	7	—	7	100.00	—	—

(二) 地方政府配合辦理前瞻基礎建設計畫自籌經費預算執行進度未如預期，允宜加強控管，俾如期發揮預期效益。

依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第 14 條第 2 項規定，直轄市、縣(市)政府執行補助計畫時，如有未依中央政府各主管機關規定編列或撥付應分擔款，或執行績效不佳等情形者，各該主管機關得縮減或取消補助。同辦法第 19 條第 1 項第 1 款規定，中央各機關對直轄市、縣(市)政府計畫型補助款之撥付及執行，應依各項計畫實際經費需求或發包金額與執行進度及地方分擔款支用情形核實撥款。另依前瞻基礎建設特別條例第 10 條規定，主管機關專案列管及考核本條例所列計畫之執行。又前瞻基礎建設計畫各執行機關所訂各類建設計畫補助作業規定均訂有地方政府自籌經費比率。經查截至 109 年底止，中央各主管機關核定前瞻基礎建設計畫補助地方政府計畫之總經費(第 1、2 期)計 8,074 億 3,778 萬餘元，其中地方政府須配合自行籌措經費計 3,969 億 3,922 萬餘元，約占 49.16%。各地方政府自籌經費執行結果，第 1 期特別預算部分，地方政府編列自籌經費預算數 314 億 860 萬餘元、累計執行數 249 億 2,854 萬餘元，執行率 79.37%，其中

表 5 截至 109 年底前瞻第 1 期及第 2 期特別預算補助地方政府計畫地方政府自籌經費預算編列及執行情形

單位：新臺幣百萬元、%

市縣別	第 1 期特別預算			第 2 期特別預算		
	預算 編列數	累計 執行數	執行率	預算 編列數	累計 執行數	執行率
合 計	31,408	24,928	79.37	54,488	34,595	63.49
臺北市	1,328	1,207	90.90	2,734	2,207	80.72
新北市	9,393	8,962	95.41	16,843	15,025	89.21
桃園市	3,637	3,419	94.02	7,474	6,013	80.45
臺中市	3,049	2,458	80.60	5,293	1,955	36.94
臺南市	3,037	1,898	62.50	1,972	814	41.31
高雄市	2,189	1,544	70.52	3,624	2,066	57.01
基隆市	563	293	52.12	889	412	46.38
宜蘭縣	659	415	63.02	961	644	67.03
新竹縣	617	424	68.82	1,831	578	31.61
新竹市	906	370	40.89	1,634	696	42.60
苗栗縣	594	424	71.42	772	295	38.32
彰化縣	607	425	69.97	1,356	562	41.46
南投縣	439	261	59.56	401	204	50.96
雲林縣	837	639	76.30	1,968	1,006	51.13
嘉義縣	663	322	48.54	1,298	555	42.79
嘉義市	680	514	75.65	1,050	469	44.64
屏東縣	975	514	52.81	2,029	227	11.23
花蓮縣	194	167	86.06	519	250	48.16
臺東縣	256	203	79.35	369	286	77.56
澎湖縣	122	89	73.13	685	73	10.74
金門縣	412	245	59.48	297	131	44.20
連江縣	240	124	51.72	478	116	24.34

註：1. 預算編列數含經議會同意墊付支應金額等。

2. 資料來源：整理自各市縣政府提供資料。

新竹市及嘉義縣執行率未及 50%；臺南市等 15 個市縣執行率達 50%而未及 80%。第 2 期特別預算部分，地方政府編列自籌經費預算數 544 億 8,853 萬餘元，累計執行數 345 億 9,541 萬餘元，執行率 63.49%，其中澎湖縣等 14 個市縣執行率未及 50%；高雄市等 5 個市縣執行率達 50%而未及 80%（表 5），經函請行政院督促各主管機關加強控管地方政府辦理前瞻特別預算自籌經費執行情形，俾如期發揮前瞻基礎建設計畫預期效益。

（三）為免地方政府配合籌措前瞻基礎建設計畫自籌經費，而影響各該地方政府財政資源之有效配置，允宜督促各主管機關衡酌地方政府財政狀況，適量核定補助計畫及經費數額，俾各地方政府能有效完成各項補助計畫，發揮補助計畫預期效益。

依公共債務法第 5 條第 3 項、第 4 項及第 6 條規定，各直轄市於 102 年 6 月 27 日修正之本條文施行前、後合計可舉借之 1 年以上公共債務未償餘額占前 3 年度名目國內生產毛額平均數之比率，每年由財政部公告之；縣（市）所舉借之 1 年以上公共債務未償餘額預算數，占各該政府總預算及特別預算歲出總額之比率，不得超過 50%。財政部為強化債務管理輔導措施，並落實監督地方政府債務增減變化情形，依債務未償餘額比率高低分 4 級（輕度、中度、強度及超強度）管理，其中債務未償餘額比率瀕臨預警門檻（90%）者，採中度管理（達債限 60%，但未達 90%）。經查截至 109 年底止，地方政府辦理前瞻基礎建設計畫第 1、2 期特別預算補助計畫需自籌款為 3,969 億餘元，扣除地方政府已執行自籌款經費 595 億餘元後，尚待自籌經費為 3,374 億餘元。若地方政府全仰賴舉借公共債務方式籌措前瞻自籌經費，除債務風險等級原為中度（達債限 60%）以上之臺中市、高雄市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣等 9 個市縣外，新北市、桃園市、新竹市、彰化縣及屏東縣等 5 個市縣債務風險亦將由原輕度提升至中度以上風險；另前瞻自籌經費舉借債務數額占各該地方政府截至 109

年底可舉債限額超逾 20%者，計有臺北市、新北市、桃園市、高雄市、宜蘭縣、南投縣及屏東縣等 7 個市縣，影響各該地方政府財政資源配置（表 6），其中新北市及高雄市債務舉借更已逾可舉債空間 90%，雖多為因應前瞻軌道建設經費龐鉅而舉借之自償性債務，惟截至 109 年底止，部分軌道建設原規劃大眾運輸導向發展（Transit-Oriented Development, TOD）之土地開發效益、租稅增額財源（Tax Increment Financing, TIF）及通車後營運收益等自償性財源，因捷運軌道建設之旅運需求未如預期，或調整土地使用分區等作業延宕等因素，屢有預期效益隨之遞延或大幅縮減之情事，若未研謀改善，致自償性財源喪失或無法實現，該債務應依規定併入各該地方政府舉債空間限額計算，增加地方政府債務負擔。為避免地方政府配合籌措前瞻基礎建設計畫自籌經費，而影響各該地方政府財政資源之有效配置，經函請行政院督促各主管機關衡酌地方政府財政狀況，適量核定補助計畫及經費數額，俾各地方政府能在財政穩健情況下，完成各項中央補助計畫，發揮補助計畫預期效益。

表 6 截至 109 年底地方政府配合前瞻第 1 期及第 2 期特別預算計畫之自籌經費財務情形

單位：新臺幣億元、%

市縣別	須負擔自籌經費	自籌經費執行數	尚待自籌經費	109 年底可舉借債務剩餘額度	地方政府債限比率		尚待自籌經費占可舉借債務剩餘額度比率
					109 年底 1 年以上非自償性債務占公共債務法之債限比率	尚待自籌經費全由舉借 1 年以上非自償性債務支應，其債限比率（註 2）	
合計	3,969	595	3,374	7,732			43.64
臺北市	1,077	34	1,043	2,864	36.73	59.76	36.42
新北市	1,000	239	761	789	57.31	98.49	96.45
桃園市	704	94	610	1,040	25.71	69.29	58.65
臺中市	82	44	38	543	66.36	68.73	7.00
臺南市	67	27	40	822	39.08	42.07	4.87
高雄市	802	36	766	818	75.25	98.40	93.64
基隆市	13	7	6	47	61.82	66.94	12.77
宜蘭縣	19	10	9	17	86.44	93.89	52.94
新竹縣	21	10	11	64	63.66	69.89	17.19
新竹市	18	10	8	53	59.66	65.91	15.09
苗栗縣	11	7	4	—	117.28	119.57	已無舉債空間
彰化縣	18	9	9	114	59.00	62.23	7.89
南投縣	19	4	15	66	60.72	69.64	22.73

表 6 截至 109 年底地方政府配合前瞻第 1 期及第 2 期特別預算計畫之自籌經費財務情形（續）

單位：新臺幣億元、%

市縣別	須負擔自籌經費	自籌經費執行數	尚待自籌經費	109 年底可舉借債務剩餘額度	地方政府債限比率		尚待自籌經費占可舉借債務剩餘額度比率
					109 年底 1 年以上非自償性債務占公共債務法之債限比率	尚待自籌經費全由舉借 1 年以上非自償性債務支應，其債限比率（註 2）	
雲林縣	21	16	5	75	69.78	71.77	6.67
嘉義縣	16	8	8	83	60.82	64.62	9.64
嘉義市	8	9	- 1（註 3）	—	—	—	—
屏東縣	33	7	26	113	59.56	68.57	23.01
花蓮縣	7	4	3	65	54.62	56.94	4.62
臺東縣	7	4	3	98	25.98	27.82	3.06
澎湖縣	3	1	2	53	15.48	17.74	3.77
金門縣	7	3	4	—	—	—	—
連江縣	5	2	3	—	—	—	—

註：1. 本表公共債務未償餘額等相關資訊係彙整自各市縣總決算審核報告。其中嘉義市、金門縣及連江縣等 3 縣市截至 109 年底止未舉借 1 年以上非自償性公共債務，故未分析。

2. 地方政府執行前瞻計畫尚待自籌經費若全額以舉借 1 年以上非自償性債務支應，加上地方政府截至 109 年底止已舉借 1 年以上非自償性債務占公共債務法規定之債限比率。

3. 嘉義市政府因西區社會福利服務中心等計畫中央補助經費不足，該府自籌財源編列預算執行，故實際執行數超逾計畫核定數。

4. 資料來源：整理自中央政府各主管機關、地方政府提供前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形資料。

（四） 部分已完工營運計畫效益未如預期，相關執行機關允宜積極檢討研謀改善。

前瞻第 1 期及第 2 期特別預算合計 3,300 億 2,490 萬餘元，共計辦理 121 項分支計畫。截至 109 年底止，實現數合計 2,635 億 5,574 萬餘元。經抽查部分已完工（成）之計畫（工程）營運效益目標達成情形，核有：1. 內政部移民署辦理保障新住民寬頻上網計畫，於所屬服務站建置新住民數位機會據點，106 至 109 年度購置各式電腦設備 581 臺、數位看板 25 組、顯示器 24 臺，合計支出 4,711 萬餘元，惟未妥適審酌服務站欠缺空間之因應方式或研謀其他替代方案，仍配發筆記型電腦、平板電腦、數位看板及液晶顯示器等資訊設備予各該服務站，致購置之資訊設備使用率偏低，或長期閒置，或移作一般公務使用；又提供 700 臺平板電腦（以 4,584 萬餘元委由電信業者提供）實施免費平板電腦借用服務與建置新住民交流平臺，惟計畫未適時修正調整，致計畫內容偏離新住民實際需求，平板電腦借用率低且未能確實服務於弱勢新住民；2. 內政部辦理強化政府基層機關資

安防護及區域聯防一戶役政機關計畫，採購端末工作站等相關電腦設備，決標金額 2 億 7,774 萬餘元，未及早辦理軟體相容性測試及後續程式修正作業，或調整硬體購置時程，致因軟體測試及修改作業進度延遲，硬體採購交貨驗收逾年未能上線使用，影響使用效益；3. 農業委員會漁業署補助高雄市政府辦理中芸漁港整補場及港區環境改善工程，計畫總經費 5,400 萬元（該署補助 4,158 萬元），高雄市政府海洋局未依漁民需求規劃設計興建倉庫，且未申領建築執照即行建置，致相關設施完工後遲未能使用；4. 文化部國立臺灣美術館辦理文化生活圈建設計畫—重建臺灣藝術史計畫，採購數位展示影音設備發展新媒體藝術，未妥適規劃高單價數位展示影音設備使用需求及期程，致有 4K 高畫質雷射劇院機（4 臺總價 232 萬元）及高畫質劇院機（12 臺總價 118 萬餘元）未曾使用，及已購置之高亮度雷射工程機（2 臺單價 23 萬元或 32 萬餘元）撤展後未有其他使用需求規劃，又重複採購相同設備，部分高單價設備採購後閒置或低度使用；5. 衛生福利部補助市縣政府及部屬機關運用公有空間整建設置長照 ABC 據點及長照創新整合型服務據點，預算數 71 億 2,468 萬餘元，截至 110 年 3 月底止，已完工驗收者 572 件，惟有 125 件於完工後，受補助單位因辦理前置行政準備工作未完成、輔導團體籌設中、志工人力不足、社區人事異動或缺乏辦理意願、建物尚有其他工程施作等，遲未能開辦長照據點服務；6. 桃園市政府辦理經濟部補助之工四工業區東側坑溝兩岸滯洪沉砂設施工程等 2 件工程，預計施作 3 座滯洪沉砂設施，滯洪量體 11,780 立方公尺，沉砂量體 4,050 立方公尺，決標金額共 8,825 萬餘元，實際竣工之滯洪量體及沉砂量體分別為 10,191 立方公尺及 1,040 立方公尺，規模僅為原計畫預計量體之 86.51% 及 25.67%，未能符合當地所需滯洪量；7. 臺中市政府辦理經濟部補助之臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程，新建 39 間標準廠房單元，決標金額共 10 億 7,950 萬元，109 年 9 月完成驗收後，因廠商除公告受理申請期間外，無法申請承租，而且已申請承租之廠商，尚須等待抽籤及待該府召開審查會通過後始能承租，迄 110 年 3 月底，仍有 29 間廠房單元未租出（占 74.36

％)，已閒置 6 個月餘；8. 新竹縣政府辦理內政部（營建署）補助之新竹縣竹北市內生活道路養護整建工程，決標金額 5,555 萬元，因未考量部分道路已有其他工程將於近期辦理創鋪，仍列入改善施作路段，肇致 223 萬餘元公帑虛擲；9. 花蓮縣政府辦理教育部 107 年度核定補助之前瞻基礎建設－國民中小學校園數位建設計畫，建置花蓮縣智慧校園親師生平臺及行動裝置 APP，決標金額 323 萬餘元，惟計畫建置完成後，因未有效積極輔導家長安裝，或對家長、教師及學生等使用者教育訓練不足，致家長申請平臺帳號之註冊率僅 4.14%，且 108 年 1 月至 109 年 9 月約 1 年 8 個月期間，逾 9 成登記註冊者登入次數低於 50 次，使用率偏低等情事，經函請行政院督促檢討改善。

（五） 前瞻基礎建設計畫 109 年度總績效檢討報告部分內容未盡完整，允宜檢討改善。

國家發展委員會（下稱國發會）依前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則規定彙整登載於行政院全球資訊網前瞻基礎建設計畫專區之前瞻基礎建設計畫 109 年度總績效檢討報告（下稱 109 年度總績效檢討報告）。經查相關資訊揭露情形，核有：1. 依據前瞻基礎建設特別條例（下稱前瞻特別條例）第 9 條規定，中央執行機關應將執行進度及績效，每年向立法院提出書面報告。查前瞻第 1 期特別預算辦理之 103 項分支計畫，其中未續編前瞻第 2 期特別預算之高雄捷運延伸環線規劃作業、高鐵彰化與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業、集集支線基礎設施改善規劃作業、雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業、嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業及阿里山森林鐵路 42 號隧道計畫等 6 項分支計畫截至 108 年底止仍未執行完竣，相關經費計 1 億 7,088 萬餘元轉入 109 年度繼續執行，惟執行機關並未依照上開規定將該等計畫 109 年度執行進度及績效報告提送立法院，國發會亦未將其納入前瞻基礎建設計畫 109 年度總績效檢討報告；2. 109 年度總績效檢討報告揭露各類建設計畫重要執行成果內容，或僅揭露 109 年度之執行成果，或

完整揭露 106 至 109 年度累計之執行成果，或未註明執行成果之辦理期間，資訊揭露內容期程不一；3. 前瞻第 1、2 期特別預算編列補助地方政府計畫經費共計 1,823 億 2,540 萬餘元，占整體預算比率超過 5 成，且查地方政府執行中央補助計畫經費進度落後，係整體預算實現率未達 80% 之主要原因，惟各機關提送之 109 年度執行進度及績效報告並未揭露地方政府執行中央補助計畫預算情形。又截至 109 年底止，中央各機關核定補助地方政府前瞻計畫總經費計 8,074 億 3,778 萬餘元，其中須由地方自籌之經費計 3,969 億 3,922 萬餘元，各地方政府是否確依前瞻特別條例第 3 條第 2 項規定，依預算程序配合編列相關預算，亦乏相關控管機制；4. 依據前瞻特別條例第 9 條第 2 項規定，前瞻基礎建設計畫執行完成後，中央執行機關應就其實施成效作成總結評估報告，並即送立法院。經查截至 109 年底止，已有部分計畫陸續執行完竣，允宜督促各執行機關依照上開規定向立法院提送各該計畫之總結評估報告，並研議將其列入年度總績效檢討報告，俾利各界瞭解相關計畫執行成效；5. 依據行政院 106 年 4 月核定之前瞻基礎建設計畫內列可量化之總體經濟效益包括可提升各年的國內生產毛額規模，自 106 至 113 年計 8 年累計 9,759 億元；計畫執行期間，預期平均每年約可創造 3.6 萬至 4.5 萬個工作機會；政府投入 8,824.9 億元，可直接帶動公民營企業投資共 17,777.3 億元。經查 109 年度總績效檢討報告未揭露累計帶動公民營企業投資金額及國內生產毛額，亦未說明各項可量化經濟未達預期目標之原因，未盡周妥，經函請行政院督促檢討改善。

（六） 行政院全球資訊網已設置前瞻基礎建設專區，揭露競爭型補助計畫相關資訊，惟部分資訊揭露未臻完整（善），有待檢討改善。

國家發展委員會依前瞻基礎建設特別條例第 14 條規定，於行政院全球資訊網設置前瞻基礎建設計畫專區，並設置前瞻基礎建設計畫已核定之競爭型補助地方計畫連結，俾利各界蒐集瞭解各類建設計畫核定補助地方計畫相關資訊。經查相

關資訊揭露情形，核有：1. 專區設置前瞻基礎建設已核定之競爭型補助地方計畫連結，民眾點選後可開啟「前瞻基礎建設計畫－競爭型補助計畫核定結果資訊公開連結一覽表」（下稱一覽表）連結搜尋核定補助地方計畫資訊，經於110年4月26日檢視一覽表內容，列有25項競爭型補助地方計畫，建立27項連結，惟專區各類建設計畫網頁所列「前瞻基礎建設計畫－已核定之競爭型補助計畫」連結之內容，僅列有21項競爭型計畫及建立23項連結，相關資訊未臻一致；2. 經運用一覽表建立之連結，搜尋及開啟相關計畫核定補助地方政府計畫資訊，發現無自來水地區供水改善計畫第三期、推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫等7項計畫係連結至機關全球資訊網，無法直接搜尋核定補助相關資訊；縣市管河川及區域排水整體改善計畫－內政部部分係連結至機關競爭型補助計畫查詢平臺，惟查詢結果包含該項分支計畫以外之核定補助資訊；提升道路品質計畫、城鎮之心工程計畫等7項計畫，僅揭露核定補助計畫名稱、核定年度或辦理期間、縣市別等，未揭露核定補助金額，且其中校園社區化改造係揭露為辦理學校社區共讀站（國中小）部分各年度之決算數，尚乏核定補助各市縣情形，普及國民寬頻上網環境計畫－數位機會中心行動近用計畫僅揭露106至107年度核定補助資訊，未更新第2期特別預算核定補助情形；3. 加強水庫集水區保育治理計畫係由經濟部與環境保護署共同辦理，惟一覽表僅可連結至經濟部水利署全球資訊網首頁，尚未建立環境保護署核定補助資訊之連結；全國水環境改善計畫係由內政部、交通部、環境保護署、經濟部及農業委員會共同辦理，惟一覽表僅建立經濟部與內政部之連結，無法搜尋交通部、環境保護署及農業委員會核定補助情形；另強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫係由行政院、內政部及財政部共同辦理，惟一覽表開啟核定補助資訊，僅揭露第1期（106—107年度）特別預算核定補助各地方政府金額及地方政府負擔經費明細資訊，未揭露補助機關名稱及第2期特別預算核定補助情形，經函請行政院督促相關機關研謀改善。

二、軌道建設

政府為針對未來 30 年發展之需求，就全國鐵路網之建置，包括骨幹、城際及都會內之鐵道建設做全面性規劃，及因應綠色交通運輸之趨勢，各縣市對軌道交通之需求不斷增加，一般公共建設經費不足，使軌道建設延滯，將軌道建設納入前瞻基礎建設計畫，自 106 年度起編列特別預算加速推動，期能於短期內加速我國公共建設之推動與執行，並將我國軌道系統打造為具友善無縫 (Friendliness)、產業機會 (Opportunity)、安全可靠 (Reliability)、悠遊易行 (Mobility)、永續發展 (Sustainability)、文化魅力 (Attraction) 等 6 項軌道運輸發展目標之骨幹運輸服務。前瞻基礎建設計畫第 1、2 期特別預算（下稱前瞻第 1、2 期特別預算）軌道建設計畫共計編列預算 581 億 8,701 萬元（第 1 期 165 億 6,657 萬餘元；第 2 期 416 億 2,043 萬餘元），推動辦理高鐵臺鐵連結成網、臺鐵升級及改善東部服務、鐵路立體化或通勤提速、都市推捷運及中南部觀光鐵路等 5 大主軸共 44 項建設計畫（第 1 期 36 項；第 2 期 35 項，其中 27 項為第 1 期之延續性計畫），分由交通部、農業委員會（下稱農委會）等 2 個主管機關執行。截至 109 年底止，部分計畫已完成，包括：淡海輕軌運輸系統第一期路網綠山線及藍海線通車營運，串聯淡水地區觀光景點，改善淡海新市鎮聯外交通問題；臺鐵成功追分段完成雙軌化通車切換，強化臺中山城與沿海區域之聯繫、南迴鐵路臺東潮州段電氣化全線通車，高雄至臺東間可縮短行車時間 27 分鐘、高雄至花蓮間可縮短行車時間 39 分鐘、臺鐵局第四代票務系統上線，提供 QR Code 無紙化票證服務、新版旅客訂票 APP「台鐵 e 訂通」及智慧劃座等功能、完成 EMU500 型電聯車車廂服務設施更新施作 8 組，提供通勤旅客舒適、友善與便捷之軌道運輸優質服務；阿里山林業鐵路道床強度及路線（含上下邊坡）安全改善完工 7 件，有效提升邊坡穩定，降低行車風險等。經查軌道建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

(一) 前瞻第 1、2 期特別預算軌道建設整體預算實現率 72.52%，其中第 1 期特別預算尚有 18 億餘元預算待執行，補助地方計畫預算執行力仍未盡理想，允宜督促加速辦理。

前瞻第 1、2 期特別預算編列 44 項軌道建設計畫預算計 581 億 8,701 萬元，截至 109 年底止，實現數 421 億 9,748 萬餘元，實現率 72.52% (表 7)，計有 28 項計畫實現率低於 80% (交通部 26 項、農委會 2 項)，其中桃園捷運綠線延伸中壢、臺中捷運綠線延伸線、高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段、高雄捷運黃線、桃園鐵路地下化、大臺中地區山海線、臺南鐵路延伸善化、恆春觀光鐵道、花東鐵路雙軌化 9 項計畫尚無實現數(東港觀光鐵道計畫暫緩辦理)；應付保留數計 155 億 5,413 萬餘元，其中第 1 期特別預算尚有 18 億 2,026 萬餘元待執行。另前瞻第 1、2 期特別預算實際核定補助地方政府軌道建設計畫經費計 141 億 1,267 萬餘元，截至 109

表 7 前瞻第 1、2 期特別預算軌道建設計畫經費執行情形
單位：項、新臺幣千元、%

主管機關	分支計畫項數	預算數	實現數	實現率
合計	44	58,187,010	42,197,487	72.52
交通部	42	57,686,262	41,877,874	72.60
農委會	2	500,748	319,613	63.83

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別決算審核報告、108 及 109 年度總決算審核報告。

年底止，實現數 95 億 3,776 萬餘元，實現率僅 67.58%，實現率最低者為臺南市政府之 4.08%，其次為臺中市政府之 15.94%，再其次為新竹市政府之 22.21%(表 8)，補助地方計畫預算執行力仍未盡理想，經建請交通部督促加速辦理。

表 8 前瞻第 1、2 期特別預算補助地方政府軌道建設計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	受補助計畫總件數	計畫總經費	第 1、2 期特別預算補助地方政府經費金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%
合計	16	540,636,737	14,112,676	9,537,765	67.58	4,574,910	32.42
臺南市	1	269,000	112,000	4,564	4.08	107,435	95.93
臺中市	2	115,026	74,120	11,817	15.94	62,303	84.06
新竹市	2	130,280	94,200	20,920	22.21	73,279	77.79
高雄市	4	167,142,070	1,507,000	392,012	26.01	1,114,987	73.99
桃園市	2	98,407,000	4,577,000	1,376,999	30.09	3,200,000	69.92
臺北市	1	136,905,710	235,000	230,386	98.04	4,613	1.96
新北市	4	137,667,651	7,513,356	7,501,065	99.84	12,290	0.16

註：1. 本表依實現比率由低至高排序。

2. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

(二) 我國尚有多項鐵路建設持續進行規劃作業，惟迄未依鐵路法規定訂定全國鐵路網計畫，允宜檢討加速辦理，以利整體鐵道建設推動及永續發展。

交通部為期我國整體軌道系統長遠發展，指示運輸研究所（下稱運研所）於107年6月研擬「2046年我國軌道運輸發展願景」報告，分析歸納出「軌道系統間服務整合不足」、「整體永續軌道系統規劃管理機制與法令檢討有待完備」、「都會軌道路網須以永續經營為目標」等，為當前及未來我國軌道系統之重要發展課題。依鐵路法第10條第1項規定，全國鐵路網計畫，由交通部擬訂，報請行政院核定公告，分期實施。惟交通部自47年1月3日鐵路法制定迄今60餘年，仍未依該項規定擬訂全國鐵路網計畫。截至110年3月底止，全國尚有26項鐵路建設持續進行規劃（含可行性研究）作業（表9），部分計畫因無鐵路上位計畫，致可行性研究結果須釐清各計畫間競合關係重新檢討，如恆春觀光鐵道計畫；或遭外界質疑增加環境衝擊或耗費鉅資興建之必要性，如高鐵延伸宜蘭計畫等3項；或高鐵車站未與臺鐵車站共站或以軌道與臺鐵車站連接，如雲林及嘉義高鐵站尚無相關規劃；或中央與地方政府計畫評估範圍部分重疊，如鐵道局及臺中市政府刻正辦理之海線平面雙軌化與海線立體化之範圍有部分重疊；或由地方政府辦理應由中央政府負責之新闢鐵路路線評估作業，如臺中市政府辦理大臺中地區山海線計畫第二階段彩虹線（大甲新增軌道連接后里）系統型式選擇評估1項。經建請交通部加速研訂全國鐵路網計畫，以利整體鐵道建設之推動及永續發展。

表9 110年3月底各級政府規劃中之鐵路建設計畫明細

單位：新臺幣千元

項次	軌道計畫名稱	計畫期程	計畫總經費	執行階段
合計			46,927,390	
1	恆春觀光鐵道計畫（註2）	106-113	85,000	可行性研究報告修正中
2	大臺中地區山海線計畫*	106/9~114/12	80,000	可行性研究中
3	宜花東地區鐵路提速計畫可行性研究	109/9~111/12	29,700	可行性研究中
4	南迴鐵路雙軌化暨提升為快鐵可行性研究	尚未核定	22,398	可行性研究中
5	臺南鐵路延伸善化計畫*	106/9~111/12	80,000	可行性研究中
6	鶯歌鐵路立體化*	尚未核定	15,000	可行性研究中
7	臺南鐵路立體化延伸至永康計畫資料補正案*	尚未核定	2,496	可行性研究中
8	臺南市新營至柳營地區鐵路立體化*	尚未核定	4,950	可行性研究中

表 9 110 年 3 月底各級政府規劃中之鐵路建設計畫明細（續）

單位：新臺幣千元

項次	軌道計畫名稱	計畫期程	計畫總經費	執行階段
9	臺鐵縱貫線竹北地區高架化*	尚未核定	6,400	可行性研究中
10	苗栗鐵路高架化計畫*	尚未核定	6,780	可行性研究中
11	苗栗縣苑裡鐵路高架化計畫*	尚未核定	4,968	可行性研究中
12	彰化市鐵路高架化計畫*	尚未核定	8,069	可行性研究中
13	斗六市區鐵路立體化計畫*	尚未核定	8,190	可行性研究中
14	枋寮大車站平台可行性評估案	尚未核定	7,600	可行性評估中
15	花蓮火車站至吉安千城車站間原線鐵路立體化*	尚未核定	2,999	可行性研究中
16	臺鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究	110/1~111/12	14,621	可行性研究中
17	高鐵延伸屏東規畫作業	106/9~111/12	128,000	綜合規劃中
18	花東鐵路雙軌電氣化計畫規畫作業	106/5~110/4	79,935	綜合規劃中
19	花東鐵路雙軌電氣化計畫	109/4~116/12	45,670,880	綜合規劃中
20	北宜鐵路提速計畫	106/9~115/12	87,400	綜合規劃中
21	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規畫作業	106/09~109/12	15,000	綜合規劃中
22	嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業*	106/9~110/12	80,000	綜合規劃中
23	宜蘭鐵路高架化計畫綜合規劃作業*	110/1~112/12	80,000	綜合規劃中
24	雲林糖鐵評估規畫作業	106/9~107/12	8,000	完成規劃
25	嘉義糖鐵評估規畫作業	106/9~107/12	8,000	完成規劃
26	阿里山森林鐵路 42 號隧道計畫	106/7~111/12	391,000	環評通過

註：1. 標註*者，為鐵路立體化計畫。

2. 恆春觀光鐵道計畫已先行結案，視未來情勢及經濟發展狀況再適時啟動；另東港觀光鐵道計畫可行性研究已先行結案，暫緩辦理。

3. 資料來源：整理自交通部及鐵道局提供資料。

（三）多數地方政府捷運整體路網評估計畫迄未完備，且間有整體路網計畫尚未完成審議即先行辦理個別計畫可行性研究，或跨市縣計畫尚未取得共識等情事，允宜檢討研謀改善。

大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點（下稱捷運審查作業要點）第 2 點規定，地方主管機關辦理可行性研究前，應由交通部審議地方主管機關所提大眾捷運系統整體路網評估計畫（下稱捷運整體路網評估計畫），該項規定旨在避免個別捷運計畫因未能先行整合協調進行整體資源運用考量，增加工程界面協調、建設成本，以及後續營運維護成本。經查截至 110 年 3 月底止，規劃辦理捷運建設計畫之地方政府計有臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、基隆市、新竹市、彰化縣、屏東縣等 10 個市縣政府，其中僅臺北市、彰化縣等 2 市縣政府之捷運整體路網評估計畫經交通部審議通過，其餘新北市、

桃園市等 8 市縣政府尚未提報捷運整體路網評估計畫或計畫尚未完成審議（表 10），惟查交通部在臺南市、新竹市捷運整體路網評估計畫尚未審議通過前，即先行補助該 2 市府辦理臺南捷運紅線及第一期藍線延伸線、新竹捷運環線輕軌等 3 項計畫之可行性研究，致臺南捷運紅線及第一期藍線延伸線等 2 項計畫，因須配合交通部核復臺南市政府捷運整

表 10 截至 110 年 3 月底地方政府捷運整體路網評估計畫辦理情形

地方政府	第 1 次陳報審議日期	已核退次數	執行情形
高雄市	尚待提報		
基隆市	尚待提報		
新北市	109.10.22	1 次	待提報
桃園市	109.12.29	1 次	待提報
臺南市	109.12.24	1 次	待提報
屏東縣	109.1.22	3 次	待審議
臺中市	108.9.17	3 次	核備中
新竹市	108.11.22	4 次	核備中
臺北市	107.11.7	2 次	109.3.17 備查
彰化市	107.6.11	2 次	108.7.15 備查

資料來源：整理自鐵道局提供資料。

體路網評估計畫之審查意見進行調整；新竹捷運環線輕軌計畫，因待新竹縣政府確認藍線以路廊方式納入市府捷運整體路網評估計畫，及該計畫可行性研究內容與撰擬中之捷運整體路網評估計畫不符，尚待釐清等；臺中市政府規劃辦理之捷運「大平霧線」非屬該府整體捷運路網評估計畫之優先推動路線，惟交通部已核予補助經費 780 萬元，於 107 年 4 月委託廠商辦理可行性研究作業，影響各該計畫可行性研究作業進度。另臺北市政府辦理之臺北捷運民生汐止線，規劃與交通部鐵道局辦理之基隆輕軌於站外轉乘，嗣交通部於 109 年 10 月 13 日召開「北北基軌道路網政策溝通平台起始會議」決議略以：民生汐止線東湖—汐止區公所路段（汐東捷運）與升級後之基隆捷運整合。爰原民生汐止線之相關運量分析、營運計畫、財務與經濟效益等尚待妥為規劃，且新北市政府對臺北市政府所提之臺北都會區整體路網有不同看法，亦待協議；另彰化縣政府規劃辦理之捷運「員林溪湖線」，於整體路網評估計畫列為「中程路網」，且未延伸至二林鎮，惟該府逕於 109 年 1 月委外辦理「彰化縣員林—埔心—溪湖—二林大眾運輸系統發展策略暨先行公共運輸系統可行性研究」，與評估計畫之規劃內容及期程不符，涉有程序倒置情事，經建請交通部檢討研謀改善。

(四) 前瞻特別預算軌道建設新興計畫編審作業歷經 4 年執行結果，六成以上尚未核定，影響後續工程啟動時程，允宜檢討研謀改善。

按行政院自 106 年度編列特別預算推動前瞻計畫，分項計畫挑選原則包括 4 年內可執行加速完成或具成效之已核定計畫或 4 年內可啟動之新興計畫。據交通部提供資料統計，已完工或通車中之大眾捷運系統平均編審（可行性研究及綜合規劃）期程約為 10 年。經查，前瞻第 1、2 期特別預算，列有 44 項軌道建設計畫，其中新興計畫計 36 項，歷經 4 年執行結果，計畫可行性研究（評估）或綜合規劃作業尚未核定者計 24 項，比率達 66.67%，其中臺中捷運綠線延伸線、臺南捷運藍、綠、紅線計畫、恆春及東港觀光鐵道計畫等 4 項計畫，考量執行進度未如預期或已決定緩辦，已於前瞻計畫後續 4 年調減原規劃經費（501.72 億元）合計逾 490 億元。次查，軌道建設「中南部觀光鐵路」建設主軸之恆春觀光鐵道計畫可行性評估，因屏東縣境內刻正推動高鐵延伸屏東及屏東捷運整體路網等規劃，為釐清各計畫間競合關係須重新檢討；東港觀光鐵道計畫因投資效益不顯著，經可行性評估結果暫緩辦理；雲林糖鐵評估規劃作業因臺灣糖業股份有限公司財務評估結果，不具自償性，無法配合興建營運，均與上述 4 年內可啟動之納入前瞻特別預算選案原則有間，並影響該項建設推動主軸「結合跨運具整合提供便利的旅程」及「鐵道串聯社區部分與生態旅遊線，兼顧地方觀光經濟發展與生態永續」效益目標之達成；另本部相關審計單位抽查基隆捷運計畫可行性研究等 13 案辦理情形，主辦機關編審作業進度緩慢或久未核定（核退）之主要原因，包括：相關機關間協調久未獲共識、未確實釐清計畫經費或營運規劃等課題、未確實釐清運量需求及運量培養措施，及交通部審查（含籌備會議）作業時程平均逾 2 個月以上等（表 11），經建請交通部檢討研謀改善。

表 11 截至 109 年底鐵路立體化或大眾捷運系統計畫編審作業落後原因分析

辦理階段	缺失態樣	軌道計畫名稱
主辦機關規劃情形	與相關機關協調久未獲共識（如經費分擔或地上物設置等）	桃園鐵路地下化計畫綜合規劃
		嘉義市區鐵路高架化計畫綜合規劃
		基隆捷運計畫綜合規劃
	未確實釐清計畫經費或營運規劃等課題	基隆捷運計畫可行性研究
		高雄捷運黃線綜合規劃
	未確實釐清運量需求及運量培養措施	新北捷運三鶯線延伸八德可行性研究
		高雄捷運黃線可行性研究
	未確實釐清必要性、經濟與財務可行性	樹林鐵路立體化可行性研究
		高雄捷運黃線可行性研究
	未確定路線或系統型式	臺南捷運綠線可行性研究
		臺南捷運第一期藍線可行性研究
		高雄捷運黃線綜合規劃
	地方政府遲未提供所需文件（如財務計畫及臺鐵局同意函等）	桃園鐵路地下化計畫綜合規劃
	土地開發效益評估歷時冗長	嘉義市區鐵路高架化計畫綜合規劃
	報告修正時程過久，未再續陳交通部審查	苑裡鎮鐵路立體化可行性研究
		苗栗鐵路立體化可行性研究
	綜合規劃採購多次流標未確實檢討並妥擬招標策略	新竹大車站平台計畫綜合規劃
交通部審查情形	審查（含籌備會議）作業時程平均逾 2 個月以上	桃園鐵路地下化計畫綜合規劃
		基隆捷運計畫可行性研究
		高雄捷運黃線可行性研究及綜合規劃
		新北捷運三鶯線延伸八德可行性研究
		樹林鐵路立體化可行性研究
		新北五股泰山線輕軌運輸系統
		臺南鐵路延伸善化可行性研究

註：1. 調查範圍為鐵路立體化或大眾捷運系統計畫（排除交通部未曾審查案件）。

2. 資料來源：整理自審計部相關審計處室調查資料。

（五）鐵道局辦理基隆捷運規劃作業未妥適溝通協調及研商整合路廊運具競合關係，即朝臺鐵不進基隆站及獨立興建（輕軌）方案進行規劃，招致民怨質疑，後雖決定升級為中運量捷運系統並與汐東捷運整合及延伸至南港站，惟已超出行政院核定可行性研究範圍，且八堵至基隆路段興建計畫迄無具體方案，允宜妥為研謀因應對策。

鐵道局辦理基隆南港間通勤軌道建設計畫規劃作業（原計畫名稱為基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業，下稱基隆捷運計畫），計畫總經費 1 億 1,948 萬元（前瞻第 1、2 期特別預算合計編列 1 億 448 萬元），主要係辦理可行性研究、綜合規劃及環境影響評估等。嗣基隆捷運計畫可行性研究經行政院於 108 年 4 月同意以全

線四軌（即利用既有臺鐵第三軌興建獨立雙軌之輕軌系統）辦理後續綜合規劃，全線約 19 公里，沿線設南港展覽館、樟樹灣等 12 站（含延伸站），計畫期程為可行性研究核定後 9 年完成四軌化工程、總經費 103.32 億元，鐵道局並已撥付可行性研究技術服務廠商費用 2,629 萬餘元。經查，鐵道局於辦理可行性研究期間，已知多數民眾支持新建另外一條軌道運輸系統，惟未妥適與民眾溝通，並邀集相關地方政府及專家學者研商，即朝臺鐵不進基隆站方案進行規劃，致原利用臺鐵往返基隆－臺北民眾須增加通勤時間及費用，招致民怨；另臺北市政府辦理之臺北捷運民生汐止線可行性研究前於 100 年 12 月 19 日獲行政院核定，該府並於 108 年 4 月 28 日提送綜合規劃，爰鐵道局辦理可行性研究時，已知於新北市汐止區大同路段與民生汐止線規劃路線及車站二者有 1.1 公里須共用路廊（臺鐵、基隆捷運及臺北捷運民生汐止線合計 3 種軌道系統、6 股道，下稱 3 線 6 軌），產生競合與資源浪費之課題，且交通部（路政司）及新北市政府均提出「第四軌方案部分將與汐止民生線路線重疊」之審查意見，惟該局考量兩者分別使用臺鐵及大同路路廊，且因系統型式尚未決定，爰未規劃整合。次查，捷運審查作業要點第 2 點及第 3 點規定，捷運系統建設可行性研究前，應先完成捷運整體路網評估，內容包含都市整體軌道路網規劃（含系統型式、系統整合規劃等），惟鐵道局於 108 年 8 月啟動基隆捷運計畫綜合規劃作業，綜合考量運量需求、路線特性及都市景觀再造等需要，始確定與臺鐵路線不共線不過軌之原則，並建議朝輕軌捷運（軌距 1,435 公厘）系統規劃；另為解決汐止大同路平行並存之龐大量體，該局成立溝通平台，惟基隆捷運計畫迄 109 年 3 月綜合規劃期中報告備查仍未整合。嗣交通部於 109 年 10 月 13 日召開「北北基軌道路網政策溝通平台起始會議」，達成基隆輕軌（LRT）升級為具備自動列車運轉（ATO）裝置之中運量捷運系統（LRRT），並與新北市政府規劃之汐東捷運（民生汐止線東湖－汐止區公所路段）整合共軌、臺北端地下延伸至南港站等共識，惟已超出行政院核定之可行性研究範圍（含財務計畫），且

與其核定方案之適用法令、系統規劃、路線及軌距等諸多內容及相關經費、期程差異頗巨（表 12），又臺鐵八堵至基隆間路廊因須使用臺鐵路權，是否讓與基隆捷運，涉及用地拆遷或降低服務容量；八堵至北五堵段因配合基隆河谷廊帶發展，另有深入市區服務替代路線方案等，迄 110 年 4 月底止，尚須就地方發展研議屬可行性研究階段應辦之各項可行路線方案評估，計畫不確定因素並未隨進入綜合規劃階段而降低，致耗資 2,629 萬餘元辦理可行性研究之核定內容（方案）難以充分利用外，另須再編列 1,100 萬元（已成立預算，尚未議價）變更契約辦理捷運系統升級及可行路線方案等評估作業。另交通部編列補助地方政府捷運建設計畫，亦有類同基隆捷運計畫前後規劃之內容及相關經費、期程差異頗巨情形，舉如桃園市政府辦理之桃園捷運棕線，未詳實調查與兩側民房淨距及消防救災空間，導致原規劃採全高架方案棄置情形；臺中市政府辦理之臺中捷運藍線，未覈實規劃用地取得費用及釐清機廠用地設置於港務用地之可行性等（同表 12），經建請交通部妥為研謀因應對策，俾利計畫之推動執行。

表 12 截至 110 年 4 月底基隆捷運、桃園捷運棕線及臺中捷運藍線規劃作業差異情形

軌道計畫名稱	項目	可行性研究階段	綜合規劃階段（尚未核定）
基隆捷運	適用法令	改善方案依據鐵路法提出，主線段位於臺鐵範圍，爰適用鐵路法，後續兩端延伸適用大眾捷運法。	大眾捷運法
	主要研究標的	主要在臺鐵路線進行路線功能擴建與改善，屬環島鐵路網之一環（臺鐵優化第三軌及臺鐵路線四軌化），尚未考慮銜接民生汐止線之新闢路廊（含捷運）方案。	依行政院核定四軌化方案發展，並建議採用標準軌之輕軌捷運系統；109.10.13 溝通平台起始會議決議與民生汐止線整合。
	營運機關	未決定營運機關	交通部委託新北市政府代為興建及營運
	軌距	1,067 公厘	1,435 公厘
	機電系統	五堵至七堵貨場間維持臺鐵既有機電系統型式與臺鐵共線，其他路段改不同系統。	計畫路線與臺鐵不共線、不過軌。
	系統型式	建議可採傳統鐵路輕型電聯車或具雙供電系統列車（未決定）。	具備自動列車運轉（ATO）之中運量捷運系統（LRRT）。
	臺鐵八堵至基隆路段	既有路線讓給基隆輕軌使用，臺鐵列車不進入八堵及基隆等站（行政院核定可行性研究原則）。	既有部線是否讓給基隆捷運使用，尚無具體方案，刻正評估不同方案【如臺鐵捷運並存（三軌或四軌）或以捷運服務取代臺鐵，另捷運服務又分為平面及高架方案等）及其影響（拆遷、土地徵收、虧損等）】。

表 12 截至 110 年 4 月底基隆捷運、桃園捷運棕線及臺中捷運藍線規劃作業差異情形（續）

軌道計畫名稱	項目	可行性研究階段	綜合規劃階段（尚未核定）
基隆捷運	與臺北捷運民生汐止線整合	未評估整體或相容性，並解決兩線於汐止大同路平行並存之龐大量體。	與民生汐止線整合共軌，縮小結構量體。
	地方政府財務分擔	國營鐵路依鐵路法應為國有而由中央經營，爰財源來自中央，未來地方政府有延伸線需求時再分擔興建經費。	2 端延伸依地區發展需求，須依大眾捷運法規定由地方政府分擔。
	期程	可行性核定後 9 年啟用。	綜合規劃核定後 9 年啟用。
	興建成本	主線 103.32 億元，基隆端延伸 1.2 億元。	主線 250.08 億元，另延伸南港 80 億元，經費增加約 226 億元。
	延伸南港	經交通部與地方政府協調後，無延伸南港需求，終點為南港展覽館。	經 109.10.13 溝通平台起始會議決議，終點站採地下化延伸南港，且提出新增車站之需求。
	車站	南港展覽館、樟樹灣、汐科等 12 站（含延伸站）。	地方政府訴求新增南陽大橋站、廟口站及南港車站等，及八堵至北五堵深入市區服務路線。
桃園捷運棕線	方案	8 站全線高架。	5 站地下車站、3 站高架車站。
	期程	109 至 115 年	110 至 118 年
	興建成本	195.57 億元	375.27 億元，增加約 179 億元
臺中捷運藍線	方案	18 站（9 座高架、9 座地下，含 1 座高架預留站），機廠設置於梧棲區（臺中港），與綠線共用北屯機廠等。	20 站（8 座高架、12 座地下），機廠設置於龍井區（臺灣大道與國道 3 號附近）。
	期程	118 年營運	122 年營運
	興建成本	981.49 億元	1,309.03 億元，增加約 327 億元

資料來源：整理自鐵道局提供資料及審計部相關審計處室調查資料。

（六）交通部為提供民眾便捷交通設施，補助地方政府推動多項軌道建設計畫，惟因地方政府自有財源不足，須舉借高額債務籌措配合款，鑑於部分地方政府執行軌道建設計畫自償性財源實現率未如預期，在地方政府預算資源有限下，恐增加其公共債務負擔及排擠其他施政計畫，允宜研謀善策妥處，以健全地方財政，落實財政紀律。

截至 109 年底止，交通部核定補助臺北市等 7 個地方政府辦理前瞻第 1、2 期特別預算軌道建設合計有 16 項，核定計畫總經費 5,406 億餘元，中央補助款、地方自籌款為 2,135 億餘元、3,271 億餘元，分別占計畫總經費 39.50%、60.50%

(表 13)，上開受補助軌道建設計畫，地方政府須依中央核定之分攤比率自行籌措計畫經費，包括自償性經費及非自償性經費（含用地費用），其中自償性經費部分，於軌道建設興建階段，運用基金專款專用之機制先向銀行借款，用以支應興建階段之建設費用及利息，並以捷運建設場站開發、區段徵收、市地重

表 13 中央核定補助地方政府辦理前瞻第 1、2 期特別預算軌道建設情形概況

單位：項、新臺幣億元

地方政府	核定計畫項數	計畫總經費	中央補助款	地方自籌款
合計	16	5,406.36	2,135.33	3,271.02
臺北市	1	1,369.05	326.92	1,042.12
新北市	4	1,376.67	487.54	889.13
桃園市	2	984.07	397.97	586.10
臺中市	2	1.15	0.90	0.24
臺南市	1	2.69	2.25	0.43
高雄市	4	1,671.42	918.64	752.77
新竹市	2	1.30	1.08	0.21

資料來源：整理自中央主管機關提供資料。

劃、調整土地使用分區、增額容積、都市更新等運用大眾運輸導向發展（Transit-Oriented Development, TOD）之土地開發效益，及租稅增額財源（Tax Increment Financing, TIF）等外部效益，作為償還財源，併同營運階段通車後營運收益（票箱收入及附屬事業收入扣掉相對應成本）挹注基金，逐年償還借款本金與利息，降低自償性債務。經查除桃園市、臺中市、臺南市、新竹市，因軌道建設尚處規劃或初期興建階段外，其餘臺北市、新北市及高雄市之軌道建設均處於興建階段高峰期，近幾年所需興建經費擴增，截至 109 年底止，除桃園捷運綠線計畫因捷運車站周邊涉有實施增額容積之都市計畫，較規劃預估期程提前發布實施，桃園市政府收取車站周邊區域之增額容積價金較預計增加，及臺北捷運環狀線第一階段（大坪林至新北產業園區）票箱收入較預計增加外，其餘計畫之自償性財源因計畫運量預測及附屬事業收入預估過於樂觀，且受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情等因素影響，致票箱等營運收入減少，或依大眾捷運法第 6 條規定徵收之大眾捷運系統需用之土地，按大法官釋字 743 號解釋，不得聯合開發，致預期效益隨之遞延或縮減，或調整土地使用分區等大眾運輸導向發展（TOD）土地開發作業延宕，收益不如預期，致自償性財源實際達成情形較核定計畫短少（表 14）。次查臺北市等 10 個地方政府截至 109 年底止，除臺南市、新竹市、彰化縣、宜蘭縣及嘉義市因軌道建設尚在規劃或興建階段，尚無舉借相關自償性債務外，其餘 5 個地方政府軌道建設計畫累積自償性債務未償餘額，依序為新北市 503 億餘元、高

雄市 208 億餘元、臺北市 192 億餘元、桃園市 66 億元及臺中市 60 億元（表 15）。鑑於捷運建設自償性財源屬地方政府須自籌配合款，當無法產生預計自償性收益，除影響依償債計畫償還舉借之自償性債務外，若自償性財源無法實現而喪失，其自償性債務依公共債務法規定，須納入各該地方政府舉債額度計算，除有超逾地方政府現階段公共債務舉債空間財務風險外，亦因壓縮公共債務之舉債額度，而排擠其他施政計畫之財源籌措。另查地方政府須自行籌措軌道建設計畫經費—非自償性（含用地費用）部分，係透過編列公務預算支應，地方政府雖依其財務狀況調度可用預算，惟因所需經費龐鉅，多須透過舉借公共債務方式籌措經費，經統計各該地方政府規劃及興建中之軌道建設計畫，110 年度（含）以後須編列之自籌款合計 5,406.57 億餘元，其中屬非自償性經費（含用地費）計 2,703.56 億餘元，若因推動其他施政計畫致資金調度困難，而須全數舉債者，則宜蘭縣政府

表 14 100 至 109 年已核定綜合規劃報告或已完工營運軌道建設計畫案件截至 109 年底自償性財源差異概況

單位：新臺幣百萬元

地方政府	軌道建設計畫	預計數 (A)	實際數 (B)	差異數 (B-A)	票箱收入	土地開發	租稅 增額	其他 (註 1)
臺北市 政府	合計	102,966	28,268	- 74,698	- 67,185	- 4,727	—	- 2,786
	臺北捷運萬大— 中和—樹林線第 一期計畫*	1,352	—	- 1,352	—	—	—	- 1,352
	臺北捷運信義線 東延段計畫*	137	—	- 137	—	—	—	- 137
	臺北捷運土城線 延伸頂埔段（屬 板南線）	1,758	199	- 1,559	- 1,451	—	—	- 108
	臺北捷運新莊線 （屬中和新蘆 線，古亭至迴龍）	52,452	19,060	- 33,392	- 29,206	- 4,727	—	541
	臺北捷運信義線 （屬淡水信義 線，中正紀念堂 至象山）	19,683	3,500	- 16,183	- 15,547	—	—	- 636
	臺北捷運松山線 臺北捷運信義線 （屬淡水信義 線，中正紀念堂 至象山）	27,401	5,052	- 22,349	- 21,329	—	—	- 1,020
	臺北捷運環狀線 第一階段	183	457	274	348	—	—	- 74

表 14 100 至 109 年已核定綜合規劃報告或已完工營運軌道建設計畫案件截至 109 年底自償性財源差異概況（續）

單位：新臺幣百萬元

地方政府	軌道建設計畫	預計數 (A)	實際數 (B)	差異數 (B-A)				
					票箱收入	土地開發	租稅 增額	其他 (註 1)
新北市政府	合計	32,796	5,226	- 27,570	- 9,541	- 11,318	- 1,009	- 5,702
	臺北捷運環狀線第一階段	19,186	2,405	- 16,781	- 6,122	- 8,010	- 339	- 2,310
	臺北捷運系統環狀線建設（第二階段）	379	5	- 374	—	—	- 374	—
	臺北捷運萬大—中和—樹林線第一期計畫*(註 3)	6,741	835	- 5,906	- 2,681	—	- 100	- 3,125
	臺北捷運萬大—中和—樹林線第二期計畫*	178	178	—	—	—	—	—
	臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設（新蘆支線）	2,190	883	- 1,307	- 412	- 895	—	—
	新北捷運淡海輕軌計畫	3,076	260	- 2,816	- 326	- 2,413	- 5	- 72
	捷運三鶯線建設計畫	711	456	- 255	—	—	- 100	- 155
	安坑輕軌建設計畫	335	204	- 131	—	—	- 91	- 40
桃園市政府	桃園捷運綠線計畫	351	478	127	—	—	- 143	270
臺中市政府	臺中捷運綠線計畫*	—	—	—	—	—	—	—
高雄市政府	合計	3,358 (註 4)	2,805	- 552	- 1,559	- 190	—	1,198 (註 4)
	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設 BOT 案	1,123	952	- 170 (註 4)	—	—	—	- 170 (註 4)
	高雄環狀輕軌捷運建設計畫	2,199	1,853	- 345 (註 4)	- 1,559	- 155	—	1,369
	高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段計畫*	35	—	- 35	—	- 35	—	—
註：1. 其他自償性財源包括附屬事業收入、增額容積等。 2. *為計畫尚未完工通車營運。 3. 臺北捷運萬大—中和—樹林線第一期計畫原預計 107 年底完工，因民眾對捷運用地劃設範圍有疑義陳情抗議，影響都市計畫變更作業辦理時程，致使用地取得延宕約 78 個月，行政院於 107 年 11 月 29 日核定第 2 次修正計畫，修正期程至 116 年。 4. 數字差異為尾數差。 5. 資料來源：整理自地方政府提供資料。								

債務將超逾規定舉債限額，長期債務比率達舉債上限 122%，而新北市政府未償債務餘額亦將逾公共債務法規定舉債上限 90% 之債務預警標準，達到 93.55%，另

高雄市政府則達到 87.48%，瀕臨預警標準（同表 15），經建請交通部研謀善策妥處，以健全地方財政，落實財政紀律。

表 15 截至 109 年底地方政府公共債務比率與軌道建設計畫發展需求資金概況

單位：％、新臺幣億元

地方政府	1 年以上非自償性債務比率占債限乘數	累積自償性負債未償餘額	興建及規劃中軌道建設計畫地方政府 110 年度（含）及以後年度自籌款			加計非自償性自籌款全數以舉債方式支應後之債務比率
			合計	非自償性經費（含用地費）	自償性經費	
合 計			5,406.57	2,703.56	2,703.01	
新北市	56.83	503.87	1,371.33	684.76	686.57	93.55
高雄市	74.13	208.69	849.08	443.50	405.58	87.48
臺中市	57.21	60.00	647.72	250.94	396.78	72.73
桃園市	26.00	66.00	1,041.95	540.39	501.56	64.96
臺南市	39.10	—	84.41	33.95	50.46	41.10
臺北市	19.89	192.72	1,311.95	677.60	634.35	35.00
宜蘭縣	86.00	—	54.40	46.77	7.63	122.00
新竹市	59.66	—	10.45	7.50	2.95	65.33
彰化縣	57.82	—	—	—	—	
嘉義市	—	—	35.28	18.15	17.13	16.92

註：1. 彰化市鐵路高架化計畫可行性研究行政院審查中。

2. 資料來源：整理自財政部 109 年 12 月底各級政府公共債務統計表、及地方政府提供資料。

（七） 部分軌道建設計畫，地方政府未依計畫所訂分年經費需求確實撥付配合款，恐影響計畫之執行，允宜研謀因應對策，以督促地方政府確實負擔財務責任。

依據行政院 107 年 7 月 5 日核定機場捷運延伸中壢火車站計畫第一次修正計畫，計畫期程自 99 年至 118 年 7 月，總經費 138 億元，由中央負擔經費 70.255 億元，其餘 67.745 億元由桃園市政府負擔，另本計畫配合臺鐵桃園段地下化增加經費 11.12 億元，由桃園市政府負擔。截至 109 年底止，交通部（鐵道局）累計編列機場捷運延伸中壢火車站計畫預算 58 億 2,030 萬餘元，累計實現數 51 億 4,507 萬餘元，實現率 88.40%，預付數 6 億 7,195 萬餘元，合計 58 億 1,703 萬餘元；桃園市政府累計撥付配合款 0.45 億元，已全數支用，爰鐵道局辦理機場捷運延伸中壢火車站計畫可支用經費已幾乎用罄。依行政院核定之機場捷運延伸中壢火車

站計畫分年經費需求及執行情形表（表 16），截至 109 年底止，桃園市政府應撥付中央自償性經費 2.271 億元（其中 108 年度 1.441 億元及 109 年度 0.83 億元），另配合臺鐵桃園段地下化增加經費計 4.221 億元（106 及以前年度 1.1 億元、107 年度 0.504 億元、108 年度 1.666 億元及 109 年度 0.951 億元），惟截至 109 年底止，桃園市政府僅撥付鐵道局機場捷運延伸中壢火車站計畫自償性經費 0.45 億元，短撥 1.821 億元，配合臺鐵桃園段地下化經費撥付 3.2756 億元，短撥 0.9454 億元，合計短撥 2.7664 億元。經查機場捷運延伸中壢火車站計畫自核定後，鐵道局已多次函請桃園市政府依修正計畫所列分年經費需求編列 108 及 109 年度配合款，或洽該府捷運工程局研商，請桃園市政府依計畫撥付相關款項，惟截至 110 年 3 月底止，桃園市政府除未補撥前揭短撥經費 2.7664 億元外，亦未撥付 110 年度上開 2 計畫合計之配合款 1.968 億元。按鐵道局辦理機場捷運延伸中壢火車站計畫已無餘裕經費可代墊地方政府應撥付款項，且尚乏督促地方政府確實負擔財務責任及依計畫承諾撥付分擔款之因應機制，為免因地方政府未足額撥付配合款，影響計畫執行或衍生履約爭議。經建請交通部研謀因應對策，以督促地方政府確實負擔其財務責任撥付款項，俾確保計畫執行順遂。

表 16 機場捷運延伸中壢火車站計畫桃園市政府經費撥付情形（含配合臺鐵地下化增加之經費）
截至 110 年 3 月底

單位：新臺幣億元

項目 \ 年度		合計	109 以前					110
			小計	106 及以前	107	108	109	
差異數合計		- 4.7344	- 2.7664	—	0.1960	- 2.1314	- 0.8310	- 1.9680
自償性經費	應撥數	3.1330	2.2710	—	—	1.4410	0.8300	0.8620
	實撥數	0.4500	0.4500	—	—	—	0.4500	—
	差異數	- 2.6830	- 1.8210	—	—	- 1.4410	- 0.3800	- 0.8620
配合臺鐵地下化增加經費	應撥數	5.3270	4.2210	1.1000	0.5040	1.6660	0.9510	1.1060
	實撥數	3.2756	3.2756	1.1000	0.7000	0.9756	0.5000	—
	差異數	- 2.0514	- 0.9454	—	0.1960	- 0.6904	- 0.4510	- 1.1060

資料來源：整理自機場捷運延伸中壢火車站計畫及鐵道局提供資料。

(八) 前瞻基礎建設特別條例屆期後，軌道建設計畫所需經費將回歸一般公共建設預算編列，所需經費規模龐鉅，允宜妥為籌謀審慎規劃，以免影響相關計畫推動執行及財政穩健。

依前瞻計畫 110 年 4 月修正核定本所列軌道建設計畫，行政院已核定刻由交通部及所屬或補助地方政府辦理興建之軌道建設計畫工程，計有南迴鐵路電氣化等 22 項計畫，計畫總經費計 8,242 億元；可行性研究報告已核定，刻正辦理綜合規劃作業者，計有桃園捷運綠線延伸中壢等 7 項計畫，計畫總經費計 2,428.96 億元；另刻正辦理可行性研究中者，計有臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業等 7 項計畫，計畫總經費計 2,312.27 億元（未含北宜鐵路提速計畫經費）。依上開計畫規劃，截至 114 年 8 月前瞻特別預算期程屆期時，計畫仍未屆執行期程或仍待繼續編列計畫經費者，計有高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫等 20 項計畫（表 17），須由交通部公務預算編列後續年度建設經費預算計 3,485.65 億元，若再加計可行性研究報告已核定，刻正辦理綜合規劃及環評作業中，或可行性研究報告尚未核定，尚無分年計畫經費規劃之高鐵延伸屏東（預計 618.52 億元）、臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業（預計 359.93 億元）、大臺中地區山海線計畫（預計 714.02 億元）、臺中捷運綠線延伸線（預計 277.48 億元）、臺南捷運藍、綠、紅線（預計 455.02 億元）、恆春觀光鐵道（預計 241.67 億元），及北宜鐵路提速計畫（尚未估算計畫總經費）等計畫經費須由交通部負擔部分，未來辦理軌道建設計畫經費需求龐鉅。為避免前瞻計畫特別預算屆期後，相關計畫所需財源排擠其他公共建設計畫經費需求，經建請交通部妥為籌謀審慎規劃，以免影響相關計畫推動執行及財政穩健。

表 17 前瞻特別預算軌道建設分支計畫經費需求

單位：新臺幣億元

項次	分支計畫	計畫總經費	期程	106.9-114.8 特別預算	114.9 後公務 預算	備註
合 計		12,983.23		1,862.64	3,485.65	
主軸一 高鐵臺鐵連結成網		654.41		23.27	12.12	
1	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	15.25	106-109	14.75	—	
2	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	18.18	106-115	6.06	12.12	
3	高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫	2.46	106-108	2.46	—	
4	高鐵延伸屏東計畫*	618.52	106-114	...	...	可行性研究報告已核定，刻正辦理綜合規劃及環評作業招標中。
主軸二 臺鐵升級及改善東部服務		1,074.95		688.17	296	
5	南迴電氣化計畫	251.05	102-111	225.32	—	
6	花東鐵路雙軌化計畫	465.30	109-117	169.30	296	
7	臺鐵電務智慧化提升計畫	306.10	106-113	243.21	—	
8	票務系統整合再造計畫	10.74	105-109	8.58	—	
9	鐵道技術研究暨驗證中心計畫	41.76	106-113	41.76	—	
10	北宜鐵路提速計畫*	...	106-115	...	...	鐵道局刻就宜蘭端設站位置分析中。
主軸三 鐵路立體化及通勤提速		2,853.22		405.30	952.55	
11	臺南市區鐵路地下化計畫	293.60	98-115	206.20	10.60	
12	桃園鐵路地下化計畫	1,047.93	109-119	55.33	730.62	
13	嘉義市區鐵路高架化計畫	238.98	106-115	113.30	86.48	
14	嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫	133.43	111-119	2.07	105.01	可行性研究報告已核定，刻正辦理綜合規劃中。
15	新竹大車站平台計畫	65.33	110-118	28.40	19.84	可行性研究報告已核定，刻正辦理綜合規劃中。
16	臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業*	359.93	106-111	...	...	可行性研究報告修正中。
17	大臺中山海線計畫*	714.02	106-112	...	...	可行性研究報告修正中。

表 17 前瞻特別預算軌道建設分支計畫經費需求(續)

單位：新臺幣億元

項次	分支計畫	計畫總經費	期程	106.9—114.8 特別預算	114.9 後公務 預算	備註
主軸四 都市推動捷運		8,135.35		724.32	2,222.93	
18	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫	501.99	104—114	144.62	22.61	
19	淡海輕軌運輸系統	153.06	102—115	5.60	3.31	
20	安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫	166.32	104—112	34.39	—	
21	桃園捷運綠線計畫	982.64	105—119	217.05	122.03	
22	高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段計畫	30.20	105—113	14.86	—	
23	高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段計畫	272.69	108—116	77.82	85.60	
24	高雄捷運黃線計畫	1,440.79	109—119	31.31	772.68	
25	機場捷運增設 A14 站計畫	46.11	106—115	25.68	20.43	
26	桃園捷運綠線延伸中壢計畫*	328.04	111—119	2.89	119.22	可行性研究報告已核定，刻正辦理綜合規劃及環評中。
27	新竹環線輕軌計畫	461.78	111—118	10.36	217.25	可行性研究報告修正中。
28	臺中捷運藍線計畫	981.49	110—122	27.66	425.13	鐵道局辦理綜合規劃審查作業中。
29	基隆捷運計畫	104.52	110—119	10.15	94.18	可行性研究報告已核定，刻正辦理綜合規劃中。
30	臺北捷運環狀線北環及南環計畫	1,377.92	108—119	80.00	207.56	
31	臺北捷運萬大-中和-樹林線第二期計畫	555.30	107—119	41.93	132.93	
32	臺中捷運綠線延伸線計畫*	277.48	106—112	...	...	可行性研究報告修正中。
33	臺南捷運藍、綠、紅線計畫*	455.02	...	...	...	第一期藍線 197.63 億元，可行性研究已核定，辦理綜規中；綠線 257.39 億元，可行性研究修正中；第一期藍線延伸及紅線可行性研究辦理中。
主軸五 中南部觀光鐵路		265.30		21.58	2.05	
34	集集支線改善計畫	23.63	106—115	21.58	2.05	
35	恆春觀光鐵道計畫*	241.67	106—113	...	...	可行性研究報告修正中。
36	東港觀光鐵道計畫*	...	106—107	...	...	將視未來情勢及經濟發展狀況再予啟動。

註：1. 備註所列計畫辦理情形及*計畫期程及相關經費整理自交通部 110 年 4 月 28 日赴立法院第 10 屆第 3 會期交通委員會第 9 次全體委員會議，有關交通部主管前瞻計畫軌道建設執行情形【包括（一）高鐵、臺鐵連結成網；（二）臺鐵升級及改善東部服務；（三）鐵路立體化或通勤提速；（四）都市興建捷運系統；（五）中南部發展觀光鐵路】專題報告。

2. 資料來源：整理自前瞻計畫 110 年 4 月修正核定本。

(九) 機場捷運延伸線機電統包工程歷時 7 年始完成發包，且須配置 2 套號誌系統於同一列車，增加建置成本及行車安全風險，允宜研議妥適之採購策略及不同號誌系統之管控機制，強化政府採購效率，確保民眾乘車安全。

臺灣桃園國際機場聯外捷運系統於 106 年 3 月 2 日營運通車，通車區間為臺北市臺北車站至桃園市環北站，交通部為聯結臺鐵、高鐵及航空等運輸系統，形成完整便捷之交通網路，於 99 年 1 月 7 日向行政院提出機場捷運延伸中壢火車站計畫，規劃臺灣桃園國際機場聯外捷運系統自桃園市環北站經老街溪站（A22 站）後，延伸至中壢車站（A23 站），嗣經行政院於 99 年 4 月 15 日核定，計畫總經費 138 億餘元，路線長度 2.04 公里，預定於 107 年 6 月完工通車，並於通車後執行 1 年之全系統可靠度、可用度及可維修度作業，計畫期程至 108 年 6 月止，惟計畫執行過程，因土建機電工程界面複雜、招標過程多次流標等因素影響，經行政院於 107 年 7 月 5 日同意將 A22 站、A23 站通車期程分別展延至 111 年 7 月、117 年 7 月，計畫期程展延至 118 年 7 月。經查鐵道局執行上開計畫情形，核有：1. 未覈實評估機場捷運延伸線機電統包工程招標方式，僅重複辦理公開招標作業；復於多次公開招標均無廠商投標後，未適時檢討並採取有效之招標策略，仍持續採用相同方式辦理招標，致歷時 7 年餘始決標，嚴重延宕機電統包工程進場施作及整體通車時程；2. 第三航廈站（A14 站）號誌系統與既有路線相同，惟未於決標及設計階段促請廠商依該模式辦理機場捷運延伸線，致須配置 2 套系統於同一列車，大幅增加建置成本；機場捷運延伸線通車後由司機員以手動方式進行系統切換，惟未研擬不同號誌系統之適當管控機制，增加行車安全風險，經函請交通部查明妥處。

(十) 林務局為提升阿里山林業鐵路沿線行車安全及服務品質，辦理鐵路設施設備安全及 42 號隧道改善計畫，已完成沿線設施安全檢測及易崩塌致災區域

判釋，惟未按設施劣化程度排定優先改善順序及時程，亦未規劃自動監測預警系統，不利致災風險之控管。

阿里山林業鐵路全線地處阿里山區，軌道易因颱風豪雨影響而損壞，造成部分路段無法通車，且地處偏僻山區不利養護人員進出，僅能以人力巡檢及維修，潛存營運意外風險，農委會林務局（下稱林務局）為提升林業鐵路沿線行車安全性及服務品質，規劃辦理「阿里山森林鐵路 42 號隧道計畫」（行政院於 106 年 7 月 11 日核定，期程自 107 至 109 年度，嗣經修正期程至 111 年度，經費 3.91 億元）及「阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫」（行政院於 107 年 9 月 27 日核定，期程自 108 至 112 年度，經費 20.71 億元），由林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（下稱林鐵處）執行。經查執行情形，核有：1. 林鐵處已判釋林業鐵路沿線易崩塌致災潛勢區影響範圍（表 18），惟尚未有進一步自動監測預警規劃，不利致災風險之控管；2. 林鐵處已完成林業鐵路沿線橋梁及隧道安全檢測，惟尚未就劣化程度較高之結構設施，排定優先改善順序及時程；3. 林鐵處未全線規劃林業鐵路布建光纖，僅布設二萬平至祝山車站光纖設施約 10 公里，未能達成即時監控全線行車安全之計畫目標；4. 林業鐵路設施設備有關車輛購置分項採購進度落後；5. 阿里山森林鐵路 42 號隧道工程已開工 10 個月餘仍未擇定隧道工程開挖方式等情事，經函請林務局檢討改善。據復：1. 已完成二萬平車站雨量及邊坡即時監測，其餘潛勢區待林鐵處確認易致災區域破壞機制與滑動塊體深度後，將持續辦理自動化監測工作；2. 經林鐵處全線普查後，因工程經費與執行量能無法一次到位，已依各項設施劣化、影響路線範圍及營運程度等因素分階段改善；3. 因提升光纖設施規格導致經費不足，現階段

表 18 受易崩塌致災潛勢區影響鐵路區域範圍

項次	林業鐵路路線	受易崩塌致災潛勢區影響鐵路區域
1	主線	21K+900~22K+440
2		29K+440~29K+460
3		35K+610~35K+670
4		37K+385~37K+630
5		37K+970~38K+225
6		41K+320~41K+510
7		41K+600~41K+790
8		44K+310~44K+860
9		50K+040~50K+480
10		59K+050~59K+140
11		59K+224~59K+960
12		62K+100~62K+320
13		62K+550~63K+190
14	支線 (眠月線)	眠 3K+875~眠 4K+260
15		眠 4K+260~眠 4K+582
16		眠 4K+730~眠 4K+885

註：1. 資料截止日：109 年 12 月 31 日。

2. 資料來源：整理自林鐵處提供資料。

先布設二萬平至祝山車站區段，後續再另爭取經費辦理其他路段光纖布設；4. 執行期間因原物料成本提高、產業結構變化及車輛品質與性能提升等因素，致經費不足，刻正研擬計畫修正，預計 110 年完成計畫修正及車輛採購發包作業；5. 已擇定橫坑進洞開挖方式，並重新修正施工網圖及趕趕計畫，預計開挖進洞後 13 個月完成主隧道貫通，並於 112 年底前完工。

三、水環境建設

政府為因應氣候變遷，建立遠離水患安全宜居的環境；持續穩定供水，維持重要水庫有效容量及智慧水管理；辦理結合生態保育、水質改善及周邊地景之改善計畫，以恢復河川生命力及親水永續水環境。自 106 年度起於前瞻基礎建設計畫，將水環境建設類別納於其中，實施期程自 106 至 114 年度，共計 8 個年度。前瞻第 1、2 期特別預算水環境建設計畫共計編列預算 832 億 7,377 萬元（第 1 期 251 億 1,800 萬元；第 2 期 581 億 5,576 萬餘元），推動辦理水與發展、水與安全及水與環境等 3 大主軸共 18 項建設計畫（第 2 期 18 項，其中 12 項為第 1 期之延續性計畫），分由經濟部、內政部、交通部、農業委員會、環境保護署等主管機關執行。截至 109 年底止，已完成石門水庫、曾文水庫等 47 座水庫集水區控制土砂量 556.8 萬立方公尺、增加縣市管河川及區域排水保護面積 25.32 平方公里、完成水環境亮點 75 處等（表 19）。經查水環境建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

表 19 水環境建設執行成果概況

水與發展	水與安全
◎控制石門水庫、曾文水庫等 47 座水庫集水區控制土砂量 556.8 萬立方公尺 ◎整治崩塌地面積 249.2 公頃 ◎整治野溪長度 66.18 公里 ◎自來水改善工程 239 件，增加用水戶數 2.67 萬戶，全國自來水普及率提升至 94.5% ◎桃園、新竹及臺中防災緊急備援水 37 口，增供緊急備援水量每日 9.82 萬噸 ◎臺中及屏東常態備援水井 41 口，增供常態備援水量每日 11.29 萬噸 ◎貫通烏溪烏嘴潭人工湖輸水隧道全線 297 公尺	◎增加縣市管河川及區域排水保護面積 25.32 平方公里 ◎改善施設堤防護岸及排水路 35.01 公里 ◎改善下水道 14.02 公里、增加都市滯洪量 7.93 萬立方公尺 ◎改善農田排水渠道 53.52 公里 ◎改善農田構造物 35 座
	水與環境
	◎完成水環境亮點 75 處 ◎營造親水空間 178.80 公頃


資料來源：整理自前瞻計畫 109 年度總績效檢討報告。

(一) 水利署核定地方政府水環境改善計畫，亟待統整資源，規劃整體水環境建設藍圖，作為後續跨域分工合作及提案依循；又未研擬水環境亮點績效指標評鑑制度，未能完整呈現計畫補助成果，亟待妥為研擬及落實辦理，俾提升計畫補助效益。

經濟部水利署（下稱水利署）為達「與水共生、共存、共榮」願景及營造魅力水岸目標，研擬全國水環境改善計畫，經行政院於 106 年 7 月核定實施，辦理期程自 106 年 9 月至 110 年 8 月止，計畫總經費 280 億元，分為 3 期執行，由水利署依行政院授權綜理本計畫訂定及核定相關補助作業規定、核定各地方政府依程序審核後之擬辦案件等，分由交通部等部會及地方政府執行（圖 1）。截至 109 年底止，共核定 4 批次相關部會補助水環境改善計畫計 351 件，已完工者 125 件，取消辦理者 19 件。經查水利署第十河川局補助新北市政府之第 2 批案件，按整體計畫工作計畫書審查及評分會議紀錄列載委員意見略以，淡水河系計畫書內各項工程雖以淡水河系為主軸，但各項計畫內容連接性不足，建議可以連貫既有設施與改善水質環境配合其他計畫為本計畫主題；另新北市政府以往已在大漢溪下游操作高灘地營造濕地淨化水質之經驗，未在本案中持續延伸該項成果頗為可惜；自行車道工程請避免

影響通洪，並請與基隆市及臺北市協調銜接方式；工作項目過多不易聚焦等。又第 3 批整體計畫工作計畫書審查及評分會議紀錄列載委員意見略以：碧潭堰上游至烏

圖 1 全國水環境改善計畫分工概況

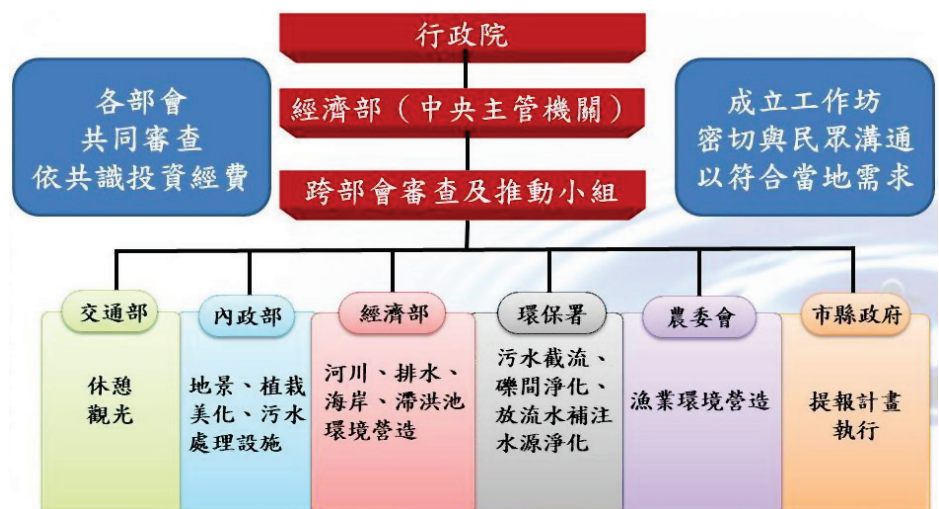

資料來源：整理自水利署提供資料。

來沿線亮點營造工程（第2標延伸段）、淡水河系整治及水環境營造部分，全國水環境改善計畫係以辦理水岸環境改善，輔以必要之周邊水岸廊道串聯以達其目的，非以辦理自行車系統完善發展為主。由上開新北市政府提案審查意見顯示，各地方政府提案尚未著重各河系發展考量，亦未串聯各河系作整體規劃，據以排列推動順序，僅由地方政府自行依照府內機制排列優先順序後，提報水利署轄管河川局審查，且後續規劃設計亦由各地方政府自行審查，各提案間缺乏連續性、關聯性，易流於重景觀遊憩設施之營造而輕忽整體水環境改善，對於水環境之整體推動恐有未盡周延之虞。又河系、車道可能跨市縣，若無法透過事先專責審查再整合跨資源，易流於浮濫，亟待盤點核定水環境案件，通盤檢討現有資源，並結合其他資源，規劃整體水環境建設藍圖，作為後續跨域分工合作及提案依循，達到資源整合最大效益。另查水利署於106年8月23日、108年5月17日分期核定補助各地方政府成立水環境改善輔導顧問團（補助上限分別為400萬元、600萬元），協助推動辦理公民參與、資料收集、評比、生態調查、生態檢核等作業，並於工程設計及施工階段，指導及監督，確保以擾動最小、衝擊最低工法施作，儘量降低生態影響。又水利署為鼓勵優秀執行團隊，並宣導全國水環境改善計畫推動成效及優質水環境案件，分別於108及109年度辦理全國水環境大賞，規劃水漾生活獎（108年度原名水漾景觀獎）、樂活生態獎、有氧淨化獎及公私協力夥伴獎等4類獎項，由各地方政府自由參賽。108年度計有9個地方政府參加共18件，經評選5件優質案件；109年度計有11個地方政府參加共計21件，經評選7件優質案件，並彙編成果，記錄臺灣優質水環境蛻變過程及經驗分享與傳承，惟受補助之地方政府共計21個，僅13個市縣參賽，且獲獎者以直轄市政府為主。又水環境亮點係本計畫績效指標項目之一，由各地方政府自受補助案件中擇選已完工之亮點案件，提報水利署彙總，截至109年底止，18個地方政府計提報水環境亮點70處，尚有3個受補助地方政府未提報，未達計畫預期之績效為營造1縣市至少1親水亮點之目標，復查尚無水環境亮點之具體規範，作為評核準據，不易衡


量計畫預期效益達成情形，經函請水利署研謀建立水環境亮點評核機制及督導各市縣踴躍參與，並藉此互為觀摩學習及交流，俾提升計畫補助效益。據復：將盤點縣市整體性水環境問題與統整資源，凝聚目標共識後提出地區水環境改善願景及策略方案，並完備水環境改善整體空間藍圖，作為後續水環境改善個案計畫提報依據，達到資源整合最大效益；又對未提報水環境改善亮點之地方政府，將於前瞻計畫第2階段(110-114年)之相關訪查行程及執行檢討會議，持續加強控管，俾利於114年底前完成計畫預期營造1縣市至少1親水亮點之績效目標；另為強化水環境亮點評核機制，後續將檢討研議相關檢核方式，俾供作為水環境亮點評核準據。

(二) 水利署為防治地層下陷已納入烏嘴潭人工湖計畫，惟計畫工程執行進度及土石方標售未如預期，亟待檢討改善。

水利署辦理之烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫，為雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫項下防治地層下陷措施之一，計畫引取烏溪水源至人工湖(圖2)進行蓄豐濟枯運用，以提供穩定之地面水量作為減抽地下水之替代水源。原計畫期程自104年4月

至113年4月，
總經費199億元，嗣於106年7月納入前瞻計畫水環境建設項下辦理，預計提前至111年度完成，後因配合特別預算期程延至

圖2 烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫位置示意

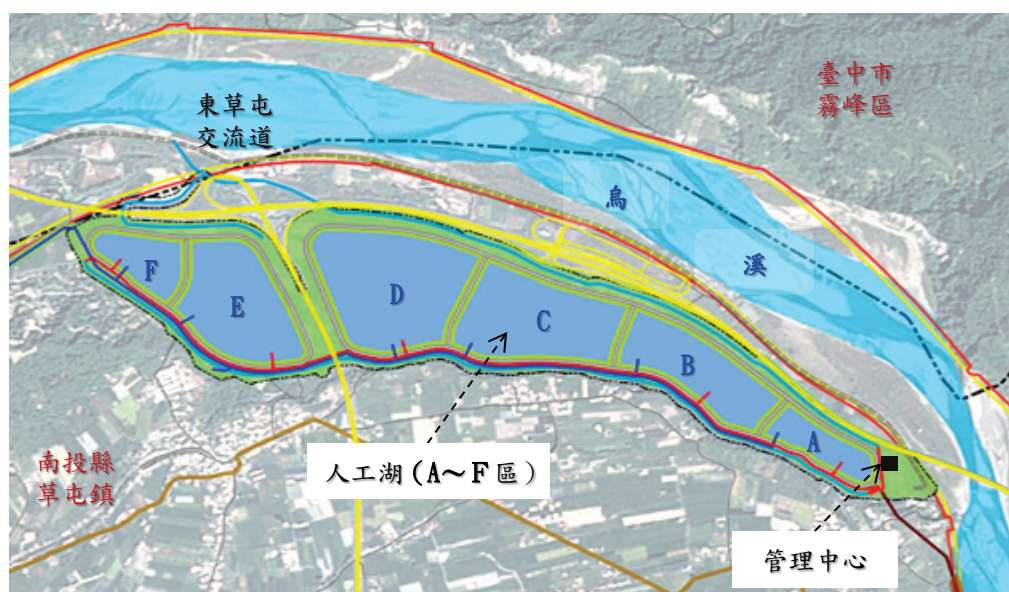

資料來源：整理自水利署提供資料。


114 年度，於 109 年 9 月辦理計畫修正，期程調整至 112 年度，並新增地面以上堆置之舊垃圾及每日新增垃圾緊急移除清運工程 1 項工作事項，修正後總經費為 202 億元。截至 109 年底止，累計預定支用數 109 億 1,811 萬餘元，累計實際支用數 108 億 4,373 萬餘元，支用率 99.32%。經查計畫執行情形，核有：1. 烏溪烏嘴潭人工湖管理中心工程因 3 次流標，於 109 年 8 月修正招標文件，9 月進行第 4 次招標，始完成決標。按契約預計工程完工日為 111 年 4 月 22 日，較第 1 階段供水目標期程 110 年 10 月，延後 6 個月餘；2. 截至 110 年 1 月底止，烏溪烏嘴潭人工湖工程待標售土石方計 130 萬餘立方公尺，惟僅標售 35 萬立方公尺，占 26.83%，且南投縣政府暫置區亦已堆滿，載運作業已暫停，影響後續工程進度；3. 湖區截水牆工程 109 年預定目標為完成 2,000 公尺，因地層大粒徑卵石影響施作，截至 109 年底止，截水牆工項完成 351 公尺，僅達原目標之 17.55% 等情事，經函請水利署針對問題癥結研謀妥處及加速執行，以達成計畫進程目標。據復：1. 烏溪烏嘴潭人工湖管理中心工程外牆設計為圓弧形大面牆清水模構造，施工難度高，影響廠商投標意願，致流廢標 3 次，現正積極督促施工廠商趕辦，以利及早完工發揮管理中心功能；2. 為加速土石方出料速度，於影響湖區工程最小情況下，另於 E、F 湖區內設置暫置區，由中區水資源局辦理剩餘土石方標售採購，截至 110 年 2 月 22 日已完成標售 70 萬立方公尺，且自 3 月起每日約可出料 1 萬立方公尺，將持續滾動檢討趕辦，以如期如質達計畫目標；3. 為解決地質問題，施工廠商進口採購削岩機以加速功率，惟因受國外疫情未能如期進場，影響截水牆工進，上開機具已進場到位，並配合 110 年度增加開挖回填等相關機具，預計可順利完成 109 至 110 年度目標 3,300 公尺。

（三）水利署為改善偏鄉民眾飲用水安全及生活品質，持續辦理無自來水地區供水改善計畫，惟第 3 期計畫執行進度及用水情形未如預期，亟待檢討改善。

水利署為解決無自來水地區供水問題，改善民眾飲用水品質及配合政府照顧弱勢政策，辦理無自來水地區供水改善計畫第3期（下稱第3期計畫），經行政院於105年8月31日核定，期程自106至109年度止，總經費34億5,000萬元，預計供水改善3萬戶。嗣為加速改善民眾用水環境，提升偏鄉民眾之用水安全與生活品質，提報修正計畫經行政院於106年7月11日核定，修正後期程至110年8月底止，總經費增至85億4,600萬元，包括補助自來水用戶外線設備、自來水延管工程及簡易自來水工程暨系統營運等，預計供水改善6.3萬戶。截至109年底止，累計編列預算數69億8,600萬元，累計實現數54億9,431萬餘元，應付保留數7億1,514萬餘元，主要係配合工程實際執行狀況，須採跨年度辦理所致，賸餘7億7,653萬餘元。經查計畫執行情形，核有：1. 108及109年度核定補助臺中市等12個市縣簡易自來水工程案104件，目標改善戶數10,564戶。截至110年5月19日止，已完成者83件，改善6,598戶；尚未完成者21件，包括108年度1件及109年度20件，亟待督導地方政府加速趕辦，以利改善偏遠地區民眾用水環境，提升民眾之用水安全與生活品質；2. 據台灣自來水公司提供資料，107至109年度接水前申請補助案件計14,842戶，經查截至110年4月底止，上揭受補助用戶完成接水後尚未使用自來水者（即自來水錶度數為零）計有7,091戶，占總申請戶數之47.78%。按年度分析，受補助用戶完成接水後尚未使用自來水者，以109年度之5,933戶最多（占83.67%），其次依序為108年度之1,118戶（占15.77%）、107年度之40戶（占0.56%），顯示尚未使用自來水戶數逐年呈現大幅增加情事。另按市縣別分析，近3年受補助用戶完成接水後尚未使用自來水者，以屏東縣6,783戶最多，占比高達95.66%（圖3）。又以109年度資料分析，受補助用戶完成接水後尚未使用自來水者占申請戶數之比率高於20%之市縣，有花蓮縣（75.00%）、臺東縣（67.74%）、屏東縣（58.12%）、宜蘭縣（39.45%）及新竹縣（20.63%），顯示部分市縣用戶用水習慣仍未改變或尚無急迫性需求，亟待研謀檢討補助機制，發揮推動計畫最大效益；3. 據水利署提供資料，109年度補

助新北市等 18 個市縣政府辦理自來水用戶設備外線補助計畫，截至 109 年底止已核銷 5,375 戶，金額 8,605 萬餘元，其中水利署負擔 6,099 萬餘元，市縣政府負擔 2,505 萬餘元。經運用財政部全國營業（稅籍）登記資料集及 Google 地圖，查詢比對各市縣政府之自來水用戶設備外線補助計畫核銷清冊用戶資料結果，計有 222 筆申請用戶地址係登錄為一般營業商號、民宿或農場等，疑為商業用建築物；另有同 1 用戶接受 2 次補助、同一裝置地點接受 2 次以上補助等情事，經函請水利署檢討改善。據復：1. 已邀集市縣政府召開簡易自來水工程執行進度管控會議，並持續督導及協助排除工程延宕因素，全力加速趕辦，以達到改善偏遠地區用水安全與提升居民生活品質；2. 將檢討補助機制，評估於核定各市縣補助經費時，納入「受補助用戶自來水使用率」為市縣政府執行率之參據，及督導加強宣導，並將會同市縣政府及台灣自來水公司研議納入提升受補助用戶使用自來水比率之誘因及手段；3. 自來水用戶設備外線補助計畫之「非商業用」建築物之認定，係由各市縣政府依建照、房屋稅及現況等資料審認，水利署已辦理自來水用戶設備外線補助計畫考核作業，針對市縣政府之審核機制辦理抽查，並加強法規宣導，促請市縣政府針對商業用建築物及同一人重複補助落實抽查機制，俾保障民眾權益與改善民眾無自來水現況，落實政府照顧民眾基本用水需求之政策目標。

圖 3 107 至 109 年度受補助用戶使用自來水概況

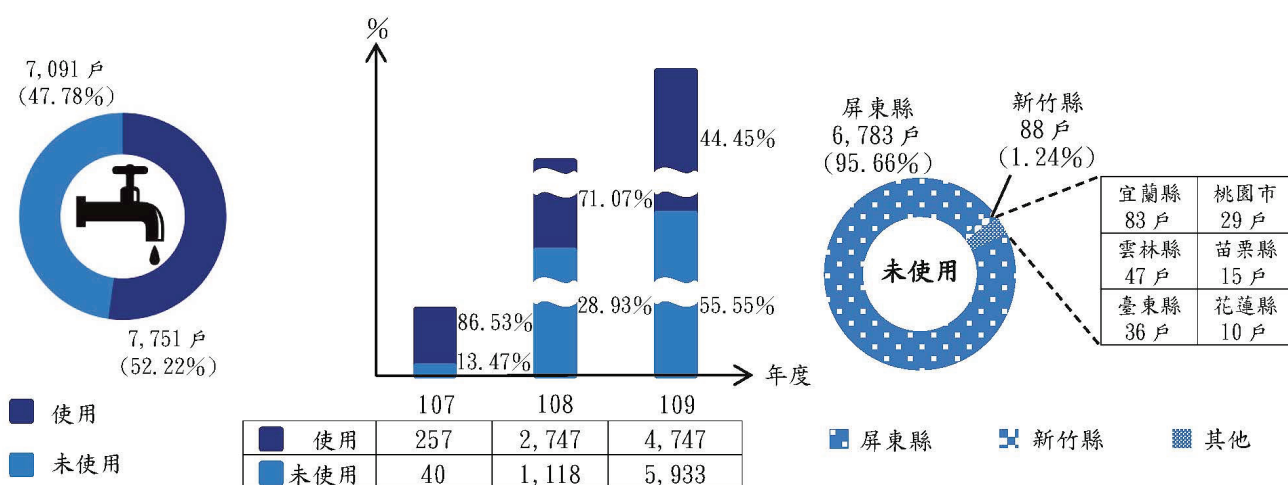


資料來源：整理自台灣自來水公司提供資料。

(四) 水利署辦理深層海水取水工程計畫，因受水下文化資產審查作業及海象不佳等因素影響，調整工序優先趕辦陸域段及機電儀控工程，復因計畫規劃未臻周妥，部分項目經費大幅調整，又涉及開發申請項目未確實掌握，影響計畫期程，亟待檢討改善。

經濟部為推動臺灣深層海水產業發展，於 104 年間召開深層海水創新研發中心深層海水用水需求研商會議，並規劃辦理深層海水取水工程計畫，經行政院於 106 年 7 月 10 日核定，短期先以恢復及滿足東部深層海水創新研發中心試驗用水需求為目標，預計由水利署辦理取水深度 350 公尺，每日平均取水量 1,000 噸之深層海水試驗管工程（圖 4），期程自 106 年 9 月至 110 年 8 月底止，計畫總經費 4 億元，以前瞻特別預算支應。嗣於 108 年 11 月辦理第 1 次修正計畫，總預算經費不變，期限展延至 111 年 10 月底。截至 109 年底止，累計分配數 1 億 4,954 萬元，執行數 1 億 3,847 萬餘元，執行率 92.60%。經查計畫執行情形，核有：1. 深層海水取水統包工程原規劃於 108 年 12 月完成取水工程，惟因統包工程連續流標，又為符合水下文化資產保存法及海岸管理法等相關規定，須先行提報水下文化資產調查計畫、海岸管理利

用說明書等施工前置文件，因該等文件至 109 年上半年始經主管機關陸續核定，至 109 年 6、7 月欲施行取水工程時，因海象不佳已無法施作，嗣決議調整工序，優先趕辦陸域段及機電儀控工程。然陸域送水管路原預計於取水

圖 4 深層海水取水工程示意

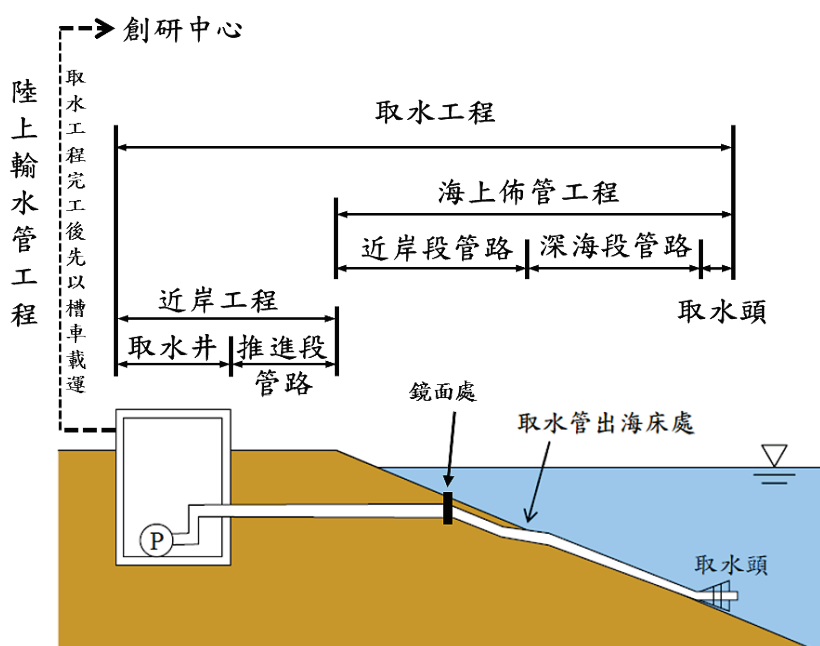

資料來源：整理自水利署提供資料。

工程驗收合格後方進行施工，避免海管取水失敗徒留無供水功能之陸管，為使後續計畫順利推展，亟待善盡保全工作，維護焊接完成之海管、陸域管線及機電工程，並積極辦理海上取水工程相關作業，俾如期達成取水之計畫目標；2. 深層海水取水工程計畫因受限於發包時程、水下文化資產審查作業及海象不佳等因素，影響計畫期程 14 個月，經濟部遂於 108 年 11 月提報第 1 次修正計畫。經查計畫調整總經費維持 4 億元不變，統包工程經費則由原 2 億 3,000 萬元，上修至 3 億 2,000 萬元，並調整其他經費以為支應，其中調整幅度較大者，包括原用地取得及拆遷補償費 5,100 萬元，調降至 210 萬元，降幅達 95.88%；間接工程費原編列 6,110 萬元，調降至 2,669 萬元，降幅達 56.32%，顯示原計畫經費規劃與實際執行存有落差。另配合水下文化資產保存法及海岸管理法等法規須提報相關文件送審，然海域用地區位許可、簡易水土保持申報書、國土保安用地容許使用申請等書表皆未列於統包工程原規劃當中，嗣後發現須提送始規劃辦理，影響計畫期程。經函請水利署檢討改善及強化法令知能，並加強掌控期程與經費，俾利計畫如期如質完成。據復：1. 陸域送水管路部分已施作深埋地下 1.25 公尺，不受日曬及地面擾動等影響。海域布管作業部分除每月召開工程控管會議外，自 109 年 10 月起由南區水資源局定期召開施工檢討會議，追蹤布管船機動員及各項整備情形，並持續趕辦陸域段推進作業，以督促工進；2. 因傳統水資源工程大部分位於山區、河川中上游等有利水資源蓄集利用之上游環境，為配合新興水資源開發，後續將加強對於海岸利用、近岸海域開發等相關管制法令教育，俾利各項海岸地區、近岸海域水資源開發之計畫遂行。

（五）水利署為降低缺水風險，辦理防災及備援水井建置計畫，惟間有先期評估作業未臻確實，大幅下修備援目標水量，或維護管理作業未臻周妥等情事，允宜檢討改善，以利旱災災害防救整備。


水利署考量地下水具有水量穩定之優勢，國際上多以地下水作為重要備援水源，為提高枯旱或緊急事件之應變能力，爰層報行政院於 106 年 7 月 10 日核定防

災及備援水井建置計畫，以減少移用農業用水及連續枯早期不進入第三階段限水為目標，計畫期程自 106 年 9 月至 109 年 12 月止，總經費 34 億元。前開計畫工作項目包括防災緊急備援井網及常態備援水井建置等 2 項，其中水利署負責辦理防災緊急備援井網，預計於桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄及屏東等地區建置地下水防災緊急備援井網（定位為抗旱救急使用），納入自來水供水系統，啟動時機為實施第一階段限水時；台灣自來水公司負責辦理常態備援水井建置，於臺中、屏東等地區移用台灣糖業公司既有深井水源或尋覓適當地點增鑿深井，作為常態

備援井，啟動時機主要為原水濁度高、供水管網水壓不足或尖峰用水時。經查執行情形，核有：1. 水利署辦理防災緊急備援井網，原訂於 109 年底完成，可提供桃園、新竹及臺中地區地下水緊急備援供水量合計 15 萬噸／日，並確保嘉義、臺南、高雄及屏東地區不進入第三階段限水（備援水井供水量 9.89 萬噸／日），惟因計畫先期評估作業未臻確實，分別於第 1 次及第 2 次修正計畫，將桃園、新竹及臺中地區備援目標水量下修為 8 萬噸／日，及停辦嘉義、臺南、高雄及屏東地區備援水井（圖 5），合計減少備援水量 16.89 萬噸／日，修正後之備援水量未及計畫原定目標量之 4 成，又減量開發後之因應替代水源多非屬地下水，該等水源於枯旱時期存有缺水風險，該署未妥適考量緊急備援水井於乾旱缺水時期之關鍵作用，規劃另覓優良合適場址增設抗旱水井，大幅降低計畫執行效益；2. 水利署未就備援水井施作完成後移交營運管理與維護費用分擔等問題，積極與台灣自來水公司協調妥處，費時 2 年 10 個月餘，始由經濟部於 109 年 3 月 30 日召開研商

圖 5 備援水井供水量修正情形

單位：萬噸／日

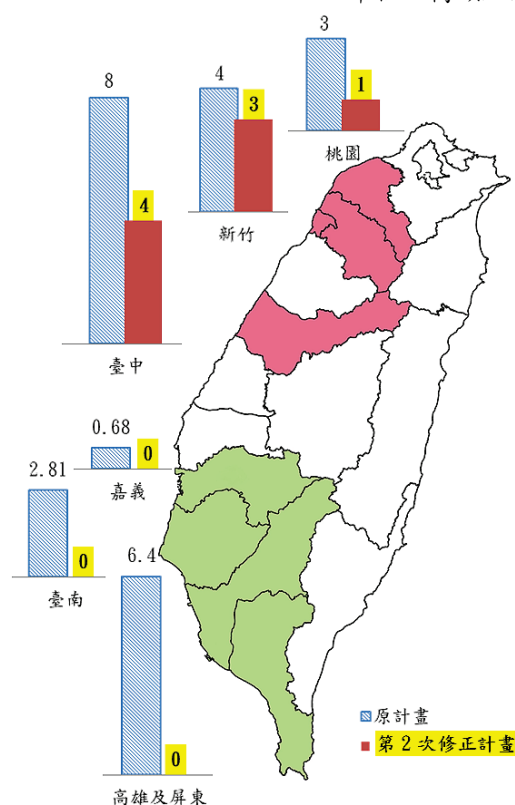

資料來源：整理自水利署提供資料。

會議，方就維護管理事宜達成共識，不利水井之維護管理與後續使用；又桃園地區已開鑿之 7 口水井，未完成水井機電工程，且未落實井體維護及抽水作業，恐造成井體腐蝕或井管積垢，影響其正常使用等情事，經函請經濟部查明妥適處理。據復：1. 水利署因 109 年下半年旱災嚴峻，水情持續惡化，為緊急開發抗旱水源，層報行政院於 110 年 1 月 12 日核定第 3 次修正計畫，將桃園、新竹及臺中地區備援目標水量由 8 萬噸／日調高為 10 萬噸／日，增加新北、苗栗、彰化、南投及雲林地區辦理地下水備援，並配合經濟部旱災應變作業及實際需求調整因應；2. 水利署與台灣自來水公司對於防災備援井網後續移交、營運管理與經費部分已達成共識，桃園地區防災緊急備援井機電設施工程於 109 年 6 月 26 日開工，工程施作期間已進行抽水試驗，促使地下水流動，以達維護目的，另於 110 年中將與台灣自來水公司簽訂代管契約後移交，以確保備援井網功能及預期效益。

(六) 環境保護署補助地方政府興設現地處理水質淨化設施，惟工程進度未如預期，且部分已完工設施處理量未達預期目標，或出流水質仍呈中度及嚴重污染，有待妥為檢討，以發揮水質改善綜效。

環境保護署配合經濟部全國水環境改善計畫，由經濟部統合各部會資源量能，共同推動水域環境營造、水質淨化及污水處理設施，107 至 109 年間於前瞻第 1、2 期特別預算陸續核定補助地方政府辦理各項污水截流、人工濕地、礫間淨化暨接觸曝氣氧化等現地處理水質淨化工程計 74 案(表 20)，核定補助金額計 60 億 6,863 萬餘元。據該署統計，截至 109 年底止，完工件數計 35 案，占 47.30%，餘 39 案據說明係因合約期程跨年度，尚在執行中。惟截至 110 年 4 月 15 日止，完工件數 35 案中扣除尚未完成驗收，或未正式運轉之 24 案後，經檢視其餘 11 案實際運作情形，

二仁溪水環境改善計畫一萬代橋水淨場功能提升及改善工程等 5 案，實際進流量僅占原設計量之 29.81% 至 78.36% 間，均未達原設計處理量 8 成

表 20 全國水環境改善計畫核定件數及完工件數

單位：案

核定年度	核定件數(註 1)	已完工			
		合計	107	108	109
107	74	32	2	15	15
108-109		3	—	—	3

註：1. 原核定 87 案，取消補助 13 案，計 74 案。

2. 資料來源：整理自環境保護署提供資料。

(表 21)；另二仁溪水環境改善計畫—萬代橋水淨場功能提升及改善工程等 3 案，出流水氨氮值不僅未達預期目標(表 21)，且仍屬嚴重污染，鹽水區月津港水環境改善計畫—臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流(土庫路)1 案，生化需氧量

表 21 109 年度現地處理設施運作情形

單位：CMD、mg/L

序號	計畫名稱	處理水量			出流水氨氮值		出流水 BOD 值	
		設計量	實際量	%	設計值	實際值	設計值	實際值
1	桃園市老街溪上游水環境改善計畫—四方林排水水質淨化	2,500	2,594.90	103.80	6	0.39	12	8.28
2	鹿港溪再現計畫—水質淨化改善工程	6,000	6,000.00	100.00	2.3	0.9	7	0.93
3	南投縣貓羅溪水環境改善計畫	400	—	(註 1)	2.5	0.03	12.8	0.21
4	雲林縣荊桐礫間淨化工程	1,300	1,460.43	112.34	<12	0.46	<12	3.68
5	二仁溪水環境改善計畫—萬代橋水淨場功能提升及改善工程	13,500	4,024.72	29.81	7.5	11.33	7.5	4.4
6	安順排水水淨場擴建及功能提升	4,000	8,563.21	214.08	6	6.31	7.5	5.25
7	鹽水區月津港水環境改善計畫—臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流(土庫路)	730	572.00	78.36	11.5	11.58	8.7	12.13
8	鹽水區月津港水環境改善計畫—臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流(信義路)	50	21.00	42.00	10.7	7.58	10	7.41
9	鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫—鳳山圳滯洪池水質淨化場	3,500	2,062.81	58.94	3.75	1.09	9	2.34
10	東港流域整體環境改善計畫—龍頸溪、萬巒排水排水水質淨化施作及監造作業	3,500	3,087.14	88.20	2.5	0.82	4.5	2.89
11	屏東縣東港流域整體環境改善計畫—興化廊排水水質淨化工程	10,000	3,366.40	33.66	4.45	2.92	9.4	7.3

註：1. 本案係採用沉水馬達抽水控制進流量、放流採重力流排至景觀池，進出流無設置流量計。

2. 資料來源：整理自環境保護署提供資料。

(Biochemical oxygen demand, BOD) 不僅未達預期效益，甚仍屬中度污染程度。按環境保護署雖定期辦理現地設施操作維護督導作業，惟未就現地處理設施運作成效未符預期目標部分，妥為督促檢討改進，致現地處理設施未能發揮預期效益，為強化河川水質淨化成效，經函請環境保護署積極檢討改進，並研謀具體改善措施，以發揮水質改善綜效。據復：為提升補助案件執行進度，將每月定期召開計畫執行情形與預算管理討論會議，並請執行單位專案報告說明辦理情形、落後原因及改善對策，同時安排現場勘查，督促地方政府加速辦理完成；另近年陸續完成家戶納管、進流量降低及機具維修等因素，致部分現地處理設施或有操作處理水量不足及水質處理未如預期等情，已積極協助地方政府辦理規劃設計審核作業，將督導地方政府應將家戶納管情形及期程暨可能減少污水量等納入考量，避

免產生過量設計情形，同時將函請地方政府針對缺失原因研提改善對策，以妥為操作維護現地處理設施，達成水質改善綜效。

（七） 漁業署補助地方政府辦理漁業環境營造，惟部分案件內容與營造海岸原始風貌兼顧親水思維之計畫原則未盡契合，又執行生態檢核、公民參與及資訊公開等管控機制未臻落實，有待檢討辦理。

農業委員會漁業署（下稱漁業署）配合經濟部推動水環境建設之全國水環境改善計畫－水岸環境營造改善，於前瞻第 1、2 期特別預算合計編列歲出預算數 17 億 1,900 萬元，補助地方政府辦理漁業環境營造，改善漁港、養殖環境及海岸景觀暨美化，強化漁業休閒觀光，打造民眾親水休憩空間等。執行結果，實現數 13 億 9,322 萬餘元，實現率 81.05%，應付保留數 1 億 8,332 萬餘元，完成水環境亮點數 23 處，營造水環境亮點親水空間 20 公頃。經查執行情形，核有：1. 依全國水環境改善計畫（106 年 7 月核定本）略以，水岸環境改善，以營造河川、排水及海岸原始風貌為原則，兼顧治水、淨水與親水之思維；評核重點包括具生態復育及生態棲地營造功能者、水質良好或計畫改善者、「民眾認同度」、「是否減少人工鋪面之採用」等。漁業署補助地方政府辦理水岸環境營造改善之分項案件計 46 件，部分案件如：龜吼漁港親海環境營造工程、淡水第一漁港水環境營造改善工程及國土保安林綠美化工程等，辦理漁具倉庫與魚市場之外牆彩繪、遮掩水管之木柵欄、人行道地磚與招牌、碼頭路面鋪面改善等事項，與營造海岸原始風貌，兼顧親水思維之計畫原則及減少人工鋪面之採用等評核重點未盡契合，有待檢討落實補助計畫原則及評核重點；2. 地方政府執行水岸環境營造改善分項案件，應依全國水環境改善計畫執行作業注意事項（下稱注意事項）第 14 點規定，於提案及工程生命週期各階段落實辦理生態檢核、公民參與及資訊公開。漁業署補助 46 件分項案件中，經地方政府認定毋須實施生態保育措施者計 28 件，惟其中 14 件無提案階段及核定階段之生態檢核評估資料，漁業署亦未依注意事項規定，請地方政

府於申請撥款時檢附生態檢核成果資料；又未依規定定期追蹤地方政府回應公民參與所提意見辦理情形，另截至 109 年 9 月底止，尚有 32 件分項案件之全部或部分資訊，地方政府未依規定於所屬全球資訊網辦理資訊公開等項，有待檢討改善；3. 漁業署補助 46 件分項案件（工程案 40 件及勞務案 6 件），截至 109 年底止，已完工（成）31 件、施工（辦理）中 14 件及取消補助 1 件（表 22），其中工程進度落後逾 10% 者計有 3 件，主要係基於施工安全考量，部分柱體重新灌漿、辦理變更設計及要徑工項材料取得問題未及時克服等所致，有待賡續督導地方政府加速辦理，經函請漁業署檢討改善。據復：1. 後續於地方政府提案階段配合經濟部水利署之評核重點嚴格審查，以使補助項目契合評核重點與計畫原則；2. 定期召開工程檢討（督導）會議，列管追蹤各地方政府辦理生態檢核、公民參與及資訊公開情形，並配合工程訪視或工程督導時予以檢視確認；3. 定期召開工程進度檢討會議，督促及協助地方政府提升工程進度，並將各機關執行計畫成效，納入下期提報案件綜合評核考量。

表 22 截至 109 年底漁業署補助地方政府辦理水岸環境營造改善分項案件執行情形

單位：件

項目	合計	工程案				勞務案		
		小計	已完工	施工中	已取消	小計	已完成	辦理中
合計	46	40	29	10	1	6	2	4
前瞻第 1 期	21	20	19	1	—	1	1	—
前瞻第 2 期	25	20	10	9	1	5	1	4

註：1. 前瞻第 1 期工程案中，計有 6 件跨前瞻第 2 期。

2. 資料來源：整理自漁業署提供資料。

四、綠能建設

政府考量全球正處於能源轉型關鍵時代，綠色能源為未來驅動經濟發展之新引擎，已規劃 114 年度再生能源配比達 20%，以達成非核家園目標，為創新綠能經濟，促進環境永續發展，自 106 年度起編列特別預算推動前瞻基礎建設計畫，將綠能建設納於其中，以補足未來綠能發展所需之基礎建設、技術驗證等缺口，期建構能源內需市場，帶動國內相關綠能產業發展，打造臺灣成為亞洲綠能產業

發展之重要據點，實施期程自 106 至 113 年度，共計 8 個年度。前瞻第 1、2 期特別預算綠能建設計畫共計編列預算 194 億 3,949 萬餘元（第 1 期 80 億 3,444 萬餘元；第 2 期 114 億 504 萬餘元），推動綠能技術及建設完備、加速綠能科學城建置、前瞻技術試驗及健全綠色金融機制等 3 大主軸共 14 項建設計畫（第 1 期 11 項；第 2 期 13 項，其中 10 項為第 1 期之延續性計畫），分由中央研究院、經濟部、科技部、交通部等 4 個主管機關執行。截至 109 年底止，部分計畫已完成，包括：臺中港離岸風電產業專區，臺中港 #106 號碼頭於 109 年 4 月 17 日竣工，#5A、#5B 號碼頭於 109 年 6 月 10 日竣工；再生能源投（融）資第三方檢測驗證中心計畫，完成離岸風場專案、太陽光電系統檢測、地熱發電系統檢測等認（驗）證能量建置；建置太陽光電技術平臺 2 年推動計畫，完成太陽光電系統、模組、表面鈍化及銅電鍍電極等 4 項技術平臺建立；綠能科技聯合研發計畫，吸引 83 家企業參與研發，共計促成與學界或產業團體合作研究 121 件，企業投資總金額達 1.27 億元等。經查綠能建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一） 經濟部辦理高雄海洋科技產業創新專區計畫，推動海洋工程技術自主化與產業化，惟對三中心及深水池規劃未盡周妥，又未積極辦理相關項目委外事宜，致修正 3 次計畫，延宕計畫執行期程，亟待督促檢討妥處，儘速完成建置，俾達計畫目標。

經濟部為配合行政院打造臺灣科學技術研究發展創新體系之施政原則與風力發電 4 年推動計畫需求，推動海洋工程技術自主化與產業化，以及活化興達港之目的，辦理高雄海洋科技產業創新專區計畫，主責執行單位為能源局，規劃建置海洋工程區（36.56 公頃），暨培訓與研發三個中心（6.72 公頃），包括海洋科技工程人才培訓及認證中心、海洋科技產業創新研發中心、海洋科技工程材料創新研發及驗證中心，即所謂一區三中心，計畫執行期程自 106 年 9 月至 109 年 12 月，計畫總經費 55 億元，並納入前瞻計畫綠能建設項目執行。惟執行過程中，因海洋

工程區碼頭整建方式，由原規劃經濟部遴選廠商負責碼頭整建，修正為經濟部遴選承租廠商自籌經費整建；又因應風場開發商需求，並與國際接軌，調整與擴充三中心主建物及設備；以及配合專區整體施工進度等，於 107 年 2 月、107 年 11 月及 109 年 1 月修正計畫 3 次，計畫總經費調整為 42 億 6,285 萬餘元（前瞻第 1 期特別預算 21 億 2,200 萬元、第 2 期特別預算 21 億 4,085 萬餘元），執行期程展延至 110 年 8 月。截至 109 年底止，該專區累計編列預算數 42 億 6,285 萬餘元，執行結果，累計實現數 17 億 3,318 萬餘元，已實現比率 40.66%，主要係三中心與深水池興建工程進度落後及委託高雄市政府代辦之興達漁港港池疏浚工程遭漁民抗爭而影響執行進度等所致。其中三中心（含深水池）累計編列預算 37 億 9,035 萬餘元，累計實現數為 16 億 9,865 萬餘元，已實現比率僅 44.82%；保留數 17 億 6,649 萬餘元，保留比率高達 46.61%（表 23）。經查三中

表 23 高雄海洋科技產業創新專區之三中心（含深水池）經費執行情形

單位：新臺幣千元

項目	預算數	實現數		保留數	
		金額	%	金額	%
合計	3,790,358	1,698,652	44.82	1,766,499	46.61
第一期	1,889,500	1,231,811	65.19	527,069	27.89
第二期	1,900,858	466,841	24.56	1,239,430	65.20

資料來源：整理自能源局提供資料。

心及深水池建置情形，核有：
1. 該計畫規劃設置三中心，以推動海洋工程技術自主化與產業化，惟計畫核定後，能源

局未積極規劃及辦理相關採購案件委外事宜，且對三中心建築物空間規劃有欠周延，延宕計畫執行期程，無法如預期於 108 年底前完成三中心建置及 109 年 1 月起試營運目標，除未能如預期獲致實驗室等相關收入外，並額外租用移動式訓練設施 1,716 萬餘元；2. 該專區之海洋科技產業創新研發中心深水池工程，用以提供國內廠商進行深水域之產品認證作業及深水域工作訓練之模擬實境，惟能源局未衡酌其為國內首次建置，工程困難度高，履約期間須與國際研究機構合作，非屬前瞻計畫推動原則可立即加速進行之基礎建設，另深水池尺寸歷時 1 年 8 個月始定案，亦未督促設計監造廠商確實按需求辦理設計，又未審慎估算深水池工程


預算金額及辦理採購發包事宜，致須調整工程費及修正計畫展延期程 8 個月。經函請經濟部督促檢討癥結原因，並研謀具體改善措施，俾法人及產業儘早進駐專區，培訓離岸風電人才及促進風電技術自主化，達成支援我國離岸風電工程與水下技術發展之計畫目標。

（二） 經濟部因應再生能源發展目標，已辦理區域性儲能設備技術示範驗證計畫，惟我國儲能產業技術尚待強化，又儲能設備技術驗證成果未如預期，亟待督促檢討妥處，儘速完成驗證與測試作業，帶動儲能產業升級。

經濟部為因應我國提升再生能源目標，期藉儲能技術發展提高電網穩定度，辦理區域性儲能設備技術示範驗證計畫（下稱儲能計畫），計畫期程為 106 年 9 月至 109 年 12 月，計畫總經費為 9 億 4,000 萬元，其中由能源局辦理部分為 7 億 4,000 萬元，分別於前瞻第 1、2 期特別預算編列 3 億元、4 億 4,000 萬元支應，並委由財團法人工業技術研究院（下稱工研院）辦理。截至 109 年底止，累計執行數 6 億 8,180 萬餘元，執行率 92.14%。經查執行情形，核有：1. 按工研院於 109 年 12 月出具之 109 年度執行報告之評估國內儲能系統能力結果，其中電池（電池芯、電池組）產業面，存有部分業者之產品性能與品質一致性未達國際水準，且未達經濟規模，致價格偏高、性價比偏低，亦缺乏大型化電池模組開發經驗；電源轉換系統產業面，存有內需市場不足影響廠商投入高電壓產品之意願、僅部分業者具備 MW（電量單位，為百萬瓦）等級產品供貨能力，且相較國外業者尚不具競爭力；儲能系統整合產業面，存有技術能力、維運經驗、廠商規模與風險承受能力不足等；另能源局為發展多元儲能電池，109 年度儲能計畫預計於彰濱儲能示範場域安裝一套鈳液流電池系統，惟因國內廠商對於鈳液流電池特性掌握度尚未成熟，且將鈳液流電池系統應用於電網級儲能系統之整合亦無實績，致工研院於 109 年 5 月 21 日、6 月 3 日辦理 2 次招標，均無廠商符合資格而廢標，爰變更計畫改以建置汰役電池與車用電池系統，顯示我國發展多元電池尚受限於技術能力與實作經驗，儲能產業發展仍待強化；2. 能源局為降低再生能源不穩定性特性可能造

成電力品質不穩定或調度問題等風險，於儲能計畫規劃與台灣電力公司合作在區域變電站或再生能源發電端，建立累積裝置容量 7MW/7MWh(百萬瓦/百萬瓦小時)之儲能系統示範驗證場域，測試電力系統變化及儲能設備之功能

圖 6 儲能系統運作模型

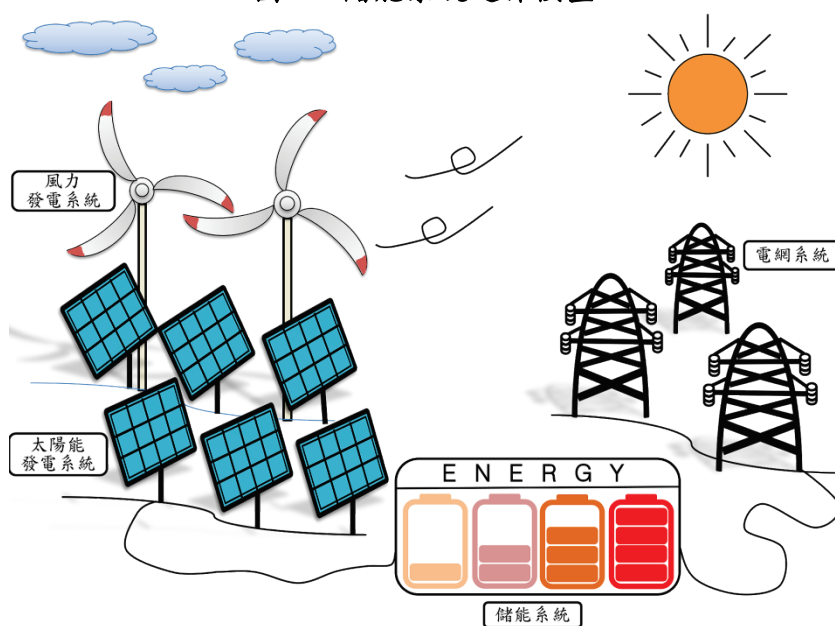

(圖 6)。截至 109 年底止， 資料來源：依據儲能計畫書繪製。

已分別於高雄永安、臺中龍井及彰化彰濱等地建置 7 座儲能示範系統，累計裝置容量 7.270MW/7.745MWh，已達成儲能計畫 7MW/7MWh 之建置量目標。惟能源局於 109 年度儲能計畫書訂定各該儲能系統須於 109 年底完成參與台灣電力公司系統輔助服務測試，以測試與驗證儲能系統併網功能，截至 109 年底止，僅高雄永安案場參與台灣電力公司非傳統機組輔助服務，其餘 6 座儲能示範系統因部分設備運行不穩定影響性能，仍持續請廠商改善中，或因完工驗收期程未如預期，致尚未與台灣電力公司合作測試儲能設備對電網之影響，顯示儲能設備技術驗證成果尚有不足等情事，經函請經濟部督促針對問題癥結檢討妥處，逐步引導國內產業進行關鍵技術研發，並儘速完成驗證與測試作業，以帶動我國儲能及電力系統整合相關產業升級。據復：1. 經濟部已建立電網級儲能平臺，以國內廠商優先參與系統驗證，引導電池、電力零組件及系統業者整合累積儲能場域建置經驗及提升產業能量；另台灣電力公司已啟動自建儲能或採購輔助服務，將於 110 年開放試行交易平臺，後續業者可建置儲能系統參與電力市場競價，期可帶動國內儲能相關產業發展與國際市場競爭力。2. 彰濱場域(5 座)考量與台灣電力公司資料交換需求，已備有通訊協定轉換器，將能直接與該公司進行資料交換，並持續配合台灣

電力公司參與相關測試，至於龍井場域廠商進行系統維護改善，後續將儘速安排測試作業。

(三) 科技部建置綠能科技聯合研究中心，已完成第一期工程，惟因進駐對象變更，先期招商計畫終止，另第二期工程尚未完成規劃設計，又辦理綠能科技聯合研發計畫，技術成熟度及製造成熟度與國外相較仍有進步空間，亟待檢討改善，以提升產業競爭力，引領產業轉型。

行政院為兼顧能源安全、環境永續及綠色經濟均衡發展，於 105 年 10 月 27 日第 3520 次院會通過「綠能科技產業推動方案－建構沙崙綠能科學城、創新綠色產業生態系」，正式宣布推動沙崙綠能科學城（107 年更名為沙崙智慧綠能科學城）之建置，其中科技部配合綠能科技產業創新方案，辦理科學城公共建設計畫－科技部（即綠能科技聯合研究中心）、綠能科技聯合研發計畫、科學城低碳智慧環境基礎建置等，106 至 109 年度編列前瞻第 1、2 期特別預算 40 億 1,630 萬餘元，截至 109 年底止，累計實現數 38 億 7,931 萬餘元，已實現比率 96.59%。經查執行情形，核有下列事項：

1. 綠能科技聯合研究中心第一期工程已完工驗收，因進駐對象變更，致先期招商計畫終止，又第二期工程規劃設計尚未完成，亟待檢討改善，加速招商與辦理第二期工程，如期發揮群聚效益：科技部為建置綠能科技聯合研究中心（下稱聯合研究中心），報經行政院於 106 年 1 月 26 日同意推動科學城公共建設計畫－科技部，規劃分 3 期興建研究中心大樓及創新育成中心等建物，執行期程為 106 至 115 年度，總經費為 78 億 8,914 萬餘元，嗣因第三期用地改為戶外試驗場域，及行政院於 108 年 11 月 20 日召開沙崙智慧綠能科學城規劃及招商研商會議結論，科學城招商方向不侷限於綠能產業，同時提供智慧科技、新興及新創相關產業進駐等，為縮短建設期程，加快智慧科技研發步伐，經科技部提報科學城公共建設計畫－科技部修正計畫書，執行期程由 10 年縮短為 6 年（106 至 111 年

度)，總經費減為 58 億 4,178 萬餘元，經行政院於 109 年 4 月 15 日核定。依據修正後計畫書第 5 章 5.1 列載，聯合研究中心第一期之研究大樓於 109 年 3 月完工，109 年第三季驗收及進駐，第二期（預計期程 109 至 111 年度）之創新育成大樓預計於 109 年第四季動工。經查聯合研究中心第一期工程係委託南部科學園區管理局辦理，於 109 年 5 月完工，惟歷經 4 次消防安全設備圖說審查及竣工複檢作業等，於同年 12 月 9 日始取得使用執照，截至 110 年 4 月 16 日止，歷時 4 個月，尚無廠商進駐，執行進度未如預期；第二期工程則委託財團法人國家實驗研究院（下稱國研院）辦理，因受基本設計外觀變更影響，截至 110 年 4 月底止，仍辦理細部設計作業中，工程尚未發包。另查自行政院 108 年 11 月 20 日召開會議決議由新創產業進駐後，科技部及經濟部中小企業處（下稱中企處）即以聯合研究中心 3、4 樓場域建置沙崙新創園及招商為營運目標，109 年度由中企處於國際創業聚落示範計畫增加經費 150 萬元，辦理南臺灣國際新創聚落規劃設計，及相關簡報、影片製作，暨辦理招商活動；行政院國家科學技術發展基金（下稱科發基金）補助中企處及由科技部委託中企處辦理南臺灣國際新創聚落發展先期招商計畫（前瞻計畫經費 1 億 3,550 萬餘元、科發基金經費 3,500 萬元），嗣於 110 年 1 月行政院科技會報辦公室召開南部新創園區預算協調會議決議，經濟部改主責高雄亞灣新創園，科技部主責臺南沙崙新創園，中企處爰於同年 3 月 15 日以政策變更，繼續辦理不符公共利益為由，終止契約，實支金額 2,040 萬餘元（前瞻計畫經費 414 萬餘元、科發基金經費 1,626 萬餘元），已執行項目包括新創聚落研析、聚落場域規劃設計、新創聚落招商、辦理行銷推廣、招商媒合及取得進駐意向書等。截至 110 年 4 月底止，相關研究成果尚未移交科技部，經函請科技部檢討妥處，積極招商及辦理第二期工程，俾如期發揮計畫群聚效益。據復：聯合研究中心已更名為資安暨智慧科技研發大樓，並於 110 年 4 月 24 日開幕，將由該部臺灣新創基地（TTA 臺南）、國研院之資安、智慧、智駕研發共創基地及經濟部工業局工控資安場域陸續規劃進駐；另第二期大樓已完成細部設計、都市計畫變更，並

進行環境影響評估變更等作業，預計 110 年第三季發包，於 112 年第一季竣工。

2. 綠能科技聯合研發計畫部分受補助計畫技術成熟度及製造成熟度與國外相較仍有進步空間，亟待檢討改善：科技部為配合沙崙智慧綠能科學城建設，推動綠能創新技術開發及綠能應用技術合作，藉由綠能產業示範推廣、綠能科技產學研跨領域合作等，以提升科技研發成效與產業發展之互動關係，全力達成發展再生能源高占比、提高能源自主比例、帶動新興綠能產業發展及提升產業科研競爭力，進而引領產業轉型，辦理綠能科技聯合研發計畫，執行期間為 108 至 109 年度，由前瞻第 2 期特別預算編列預算數 12 億 2,148 萬餘元，執行結果，實現數 11 億 5 萬餘元，已實現比率 90.06%。經查科技部辦理綠能科技聯合研發計畫，109 年度計補助 66 件整合型專案研究計畫，透過產學研合作研究，吸引 83 家企業共同參與研發，促成 31 項技術移轉、獲得 101 件專利申請等。據科技部統計，109 年度於創能（太陽光電、離岸風力）、節能、儲能（先進二次電池、先進氫能）及系統整合等四大領域，計產出 90 項技術，惟技術成熟度(TRL)與製造成熟度(MRL)與國外相較落後者，分別有 34 項及 31 項，約占 3 成餘（表 24），且其中儲能領域之先進二次電池技術成熟度及製造成熟度位階不高（均介於 TRL1 至 TRL3 間、MRL1 至 MRL3 間），尚待進一步研發，以趕

上國際技術能力，經函請科技部檢討改善，以提升產業競爭力，引領產業轉型。據復：已調整精進 110 年度計畫徵求重點，包含

表 24 細部計畫研發技術之國內外技術成熟度與製造成熟度概況

單位：項

研發領域	技術 項數	技術成熟度（TRL）			製造成熟度（MRL）		
		與國際 相當	領先 國際	落後國 際項數	與國際 相當	領先 國際	落後國 際項數
合 計	90	41	15	34	47	12	31
一、創能領域							
（一）太陽光電	9	7	—	2	6	—	3
（二）離岸風力	9	3	4	2	6	3	—
二、節能領域	7	3	1	3	4	—	3
三、儲能領域							
（一）先進二次電池	26	14	9	3	16	8	2
（二）先進氫能	34	14	1	19	14	1	19
四、系統整合領域	5	—	—	5	1	—	4

註：1. 表內係依 109 年度技術發展與國際相較情形。

2. 資料來源：整理自科技部提供資料。

要求研究團隊與國內業界合作共同執行計畫，及計畫須提出預計達到之國際相關技術指標等重點查核項目，以強化產學合作效益與落實產業應用，並以超越國際技術標竿為目標，協助提升國內綠能產業競爭力；另 110 年度計畫徵求已增加儲能領域先進二次電池，完成高功率、能量密度適用於電動車載具之固態電池原型預定目標，以期協助提升先進二次電池技術成熟度及製造成熟度位階。

（四） 中央研究院推動南部院區鋰電池儲能系統開發與新世代全固態電池材料研發計畫，有助提升國內儲能電池開發技術，惟相關儲能系統安全性測試暨其與再生能源發電系統之搭配作業均待進行，又大型儲能系統設計製造進度安排未達目標，亟待研謀善策妥處，俾達成計畫目標。

中央研究院鑑於行政院 105 年度著手推動之綠能科技產業推動方案，係以創能、節能、儲能及系統整合為四大推動主軸，其中儲能主軸包含提升鋰電池工作效能，以及開發大型儲能系統等。該院為配合政府推動綠能產業發展政策，爰提出中研院南部院區鋰電池儲能系統開發與新世代全固態電池材料研發計畫，報經行政院於 107 年 8 月 30 日核定，計畫期程為 108 至 109 年度，預計於前瞻計畫中，投入預算經費 1 億 2,800 萬元。前瞻第 2 期特別預算實際編列該計畫 108 至 109 年度之預算額度，分別為 6,400 萬元、6,100 萬元，合計 1 億 2,500 萬元，增撥及補助中央研究院科學研究基金。該計畫在電池儲能系統應用方面，預計於 108 年度開發 40Ah（安培小時）電池芯規格及完成產品製作，截至 109 年 10 月底止，雖已確定電池芯規格，惟因尚待進行電池芯之安全性測試，以確認是否符合國家標準所定安全規範，致未能達到 109 年底前完成電池芯材料技術可行性驗證及實際可量產規模之期末目標。另該計畫預計於 108 年度完成 13.5KWh（千瓦小時）之家用儲能系統設計並於該院展示，截至 109 年 10 月底止，雖已完成該家用儲能系統設計及組裝，惟該系統尚待針對使用壽命進行設計改良，並與再生能源發電系統進行搭配測試，致該家用儲能系統僅置於中央研究院物理研究所 7 樓機房，並未

開放對外展示及進行研發產品之應用推廣作業。又該計畫預計於109年度完成1MWh（百萬瓦小時）之大型儲能系統設計與製造進度安排，惟截至109年10月底止，僅完成大型儲能系統設計，至於該系統之製造進度安排，則尚待確定，影響計畫目標之達成，經函請中央研究院積極研擬具體因應措施，以有效協助達成建立國內儲能電池開發自有技術，開創新型能源產業之計畫目標。據復：研究團隊前期進度主要先以正極材料量產化為首要研究目標，方能有利後續大電芯發展，因而影響到電芯安全測試的進度，在安全的部分相對把關嚴謹，相關符合國家標準所定安全規範已列為110年計畫之執行目標；成果展示及主要推廣對象以產學界為主，產學研界來訪，皆帶領其參觀並推廣介紹，以研發電芯為主體設置於該院物理所7樓之儲能系統，也積極參與公共活動，例如2020台灣創新技術博覽會，將儲能相關訊息及知識以科普方式呈現於大眾；1MWh系統之製造進度安排已明列於109年度期末報告中，並由110年度新計畫持續進行，預定於111年度完成建置。有關電芯製作及其安規測試、電芯模組設計製作及其安規測試、電芯模組與系統控制的介面整合、1MWh系統之完成等，已於110及111年度設定目標及排程，嗣後將每季進行院內自主檢討，以確認計畫進度是否落後等。

五、數位建設

數位科技日新月異，政府為積極推動數位經濟，並讓國人能夠不受教育、所得、區域、身心等因素限制，透過多元管道享有優質數位服務，依據數位國家・創新經濟發展方案之架構，規劃數位建設納入前瞻基礎建設計畫推動，期能達成實現超寬頻網路社會生活、營造智慧國土國際典範、成為全球數位科技標竿國家之願景。數位建設跳脫傳統偏重硬體之公共建設思維，著重網路安全、數位文創、智慧城鄉、智慧學習及科研設施等基礎建設，實施期程自106至113年度，共計8個年度。前瞻第1、2期特別預算數位建設計畫共計編列預算431億2,546萬餘元（第1期158億9,452萬餘元；第2期272億3,093萬餘元），辦理「推動資安基

礎建設，提供網路安心服務」、「完備數位包容，保障寬頻人權」、「發展數位文創，普及高畫質服務」、「建構開放政府及智慧城鄉服務」及「建設下世代科研與智慧學習環境」等 5 大主軸共 19 項建設計畫，分由內政部等 15 個主管機關執行。截至 109 年底止，部分計畫已完成，包括：完成公務體系資安 A 級雲端資料中心 9 座；整併機房 207 座、實體主機降減 1,685 臺，降減比率 29.26%；建設 Gbps 等級固網寬頻網路到鄉，擴展 100Mbps 等級固網寬頻電路到村（里）主要聚落；建置國家文化記憶庫入口網站，整合博物館藏品及在地記憶素材逾 270 萬筆；促成 294 家業者發展智慧應用 223 項，帶動廠商投資 301 億元；輔導推動民生公共物聯網資料應用 14 案，取得國內外訂單 6 億元，帶動投資 3 億元；建構 AI 雲端平台（Taiwan Computing Cloud），服務逾 1,700 萬運算小時等。經查數位建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一） 內政部辦理強化政府基層機關資安防護及區域聯防一戶役政機關計畫，未及早辦理軟體相容性測試，或調整硬體購置時程，致因軟體測試及修改作業進度延遲，硬體交貨後閒置數月至年餘始上線使用等情事，均待研謀改善。

內政部為提升各市縣政府戶役政資訊系統之關鍵基礎設施及降低機關用戶端遭入侵之風險，經配合行政院前瞻計畫數位建設強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫規劃辦理強化政府基層機關資安防護及區域聯防一戶役政機關計畫，補助地方政府戶役政單位汰換使用逾 7 年之電腦主機及資安防護設備，藉此配合行政院資安防護政策，並導入資安管制軟體及控管機制，提升資安管理及防護強度。該計畫經行政院於 106 年 7 月核定，計畫期程為 107 至 109 年度，共計編列前瞻特別預算 4 億 4,765 萬元（第 1 期 3 億 4,965 萬元；第 2 期 9,800 萬元），累計實現數 4 億 2,986 萬餘元。經查執行情形，核有：1. 補助市縣政府戶役政機關汰換電腦工作站及資安防護設備，未及早辦理軟體相容性測試及後續程式修正作業，或調整硬體購置時程，致因軟體測試及修改作業進度延遲，硬體採購交貨驗

收逾年未能上線使用，影響使用效益；2. 各市縣政府採購之端末及便民服務工作站相關資訊設備，自驗收完成後閒置數月至1年餘始正式上線啟用（表25），除未能達成汰換老舊設備強化戶役政機關資安防護、提升便民服務效能之計畫目標，並徒增新品折舊耗損、未安裝期間之保管風險及保固期之浪費，暨推遲資安防護機制提升時程等情

事，經函請行政院督促檢討改進。據復：1. 內政部嗣後辦理戶役政系統相關計畫標案當落實先軟體後硬體原則，並將作業系統更換之相容性、相關應用軟體測試、軟硬體開發等納為契約之工作項目；2. 內政部爾後辦理相關計畫將提早進行系統及相關軟硬體整體測試，於測試完竣後，再進行設備採購；

表 25 各市縣政府戶政作業單位電腦設備安裝及上線期間情形

市 縣 別	驗收合格日期	保固期起算日	安 裝 期 間	上 線 期 間
臺北市	107.11.26	107.12.26	108.3.4~7.13	108.12.30~109.1.21
新北市	107.12.26		108.7.8~9.7	108.12.30~109.2.14
桃園市	107.11.09		108.6.14~11.22	109.1.1~2.20
臺中市	107.11.12		108.12.3~109.1.21	108.12.27~109.1.21
臺南市	107.11.19		108.6.3~8.16	109.1.3~2.18
高雄市	107.11.07		108.10.28~12.31	109.2.10
基隆市	107.10.31		108.8.28	109.1.20
宜蘭縣	107.11.15		108.4.12~7.29	109.1.8~2.14
新竹縣	107.11.12		108.8.30	109.1.2~1.14
新竹市	107.11.13		108.6.12~7.25	108.12.30~109.1.3
苗栗縣	107.11.14		108.7.6~8.29	108.12.30
彰化縣	107.11.10		108.8.30	109.1.22
南投縣	107.11.14		108.9.6	109.2.14
雲林縣	107.11.19		108.8.1	109.1.2~3.6
嘉義縣	107.11.30		108.8.1	108.1.3~2.27
嘉義市	107.10.29		108.8.29	109.1.11~2.8
屏東縣	107.11.26		108.8.29	109.1.3~2.27
花蓮縣	107.11.14		108.8.27	109.1.15~2.17
臺東縣	107.11.19		108.8.30	109.1.6~2.6
澎湖縣	107.11.14		108.12.31	108.12.31~109.2.25
金門縣	107.10.29		108.7.10~8.7	108.12.31~109.1.10
連江縣	107.11.26		108.7.9~7.29	109.1.10~1.21

資料來源：整理自各市縣政府提供資料及工作站安裝紀錄單。

將於招標文件及契約中，明訂以設備全部完成安裝上線日起算保固，設備安裝上線前由廠商保管或與市縣政府協調保管方式，以避免設備折舊耗損及降低保管風險。

（二）國家通訊傳播委員會為加速改善偏鄉地區、災害潛勢區及山林區域通訊品質，擴大數位服務涵蓋範圍，補助電信業者建置相關基礎設施，惟計畫執行間有未盡周妥情事，允宜檢討改善。

國家通訊傳播委員會（下稱通傳會）為達成數位包容及偏鄉弱勢通傳權益保障之施政主軸，於前瞻計畫數位建設項下規劃辦理普及偏鄉寬頻接取環境、強化防救災行動通訊基礎建置及改善山區行動通訊品質等計畫，以期保障國民通訊傳播權益，建構多元與普及的通傳近用環境。經查相關計畫執行情形，核有下列事項：

1. 為改善行動通訊信號涵蓋範圍，鼓勵業者於災害潛勢地區及山林區域建置通訊基礎設施，惟尚有部分村里未建置防救災通訊設施，補助業者建置之山區通信設施亦須加強後續維護管理機制，以維山區通訊品質：通傳會為確保災害發生時災區民眾之對外通訊，補助電信業者辦理強化防救災行動通訊基礎建置計畫，計畫期程自 106 年 9 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止，總經費計 3 億 8,678 萬餘元，以提供通訊基礎設施之抗災及備援能力。經查該會參考內政部消防署資訊及地方政府建議需求後，設定之災害潛勢區共計 349 個村里，截至 109 年底止，尚未建置防救災行動通訊設施或未於可涵蓋訊號範圍之村里，約有 250 個；另為配合行政院山林開放政策，除於 109 年度支用 9,245 萬餘元補助電信業者完成 5 處山屋及 63 處山區地點行動通信網路基礎設施外，亦規劃於 110 至 112 年度賡續辦理改善山區行動通訊品質計畫，暫估需再投入 2 億 4,800 萬元，以提升山域急難救助時之通訊能力，由於山區行動通信電子設施易受天候地形因素影響而損壞，該等設施建置完成後能否有效維持山區通訊品質，胥賴後續維護管理，允宜建立補助設施完成後維運監督機制，以達成補助目標，經函請通傳會檢討改善。據復：建置定點式防救災行動通訊平臺須考量建置地點之安全性，並須具備足夠空間配置備用電源，且因預算有限，僅能盡可能尋覓合適建置地點，滾動評估調整需優先建置之區域，又針對未建置或訊號未涵蓋地區，除以補助建置機動式防救災行動通訊平臺因應外，將規劃於 110 至 113 年度辦理延續性計畫，賡續以有限經費，秉持救災效能最佳化等原則，參酌地方需求擇定建置區域，以完善整體防救災行動通訊基礎建置；至於補助業者建置之山區行動通信網路設施，於完成後將由業

者定期巡檢、維運，並透過遠端監控該等基地臺運作情形，如發生故障即聯繫廠商前往修復，倘民眾於可通訊點無法使用行動通信服務時，亦可向該會申訴，且該會得不定期實施行政檢查督導，透過上述措施將能有效維持山區行動通訊品質。

2. 為縮短城鄉數位落差，推動普及偏鄉寬頻接取環境計畫，惟部分偏鄉之高速基地臺電波人口涵蓋率尚待提升：通傳會為加速偏遠地區數據通信接取服務普及，以因應不經濟地區需求，辦理普及偏鄉寬頻接取環境計畫，計畫期程自 106 年 9 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止，總經費 6 億 9,621 萬餘元。據該會統計，106 至 109 年度全國各偏遠鄉（鎮、市、區）高速基地臺人口涵蓋率，平均值分別為 96.86%、98.63%、99.05%、99.10%，呈逐年上升趨勢，惟截至 109 年底止，偏鄉地區高速基地臺電波人口涵蓋率低於 90% 者，尚有金門縣烏坵鄉（0%）、屏東縣牡丹鄉（81.18%）、宜蘭縣南澳鄉（85.65%）、花蓮縣萬榮鄉（87.09%）、臺東縣蘭嶼鄉（88.16%）、連江縣北竿鄉（88.20%）等 6 個鄉，經函請通傳會檢討改進。據復：將持續藉由頻率使用費折扣誘因，暨賡續辦理強化偏鄉地區 5G 寬頻服務與涵蓋等補助計畫，以逐步提升偏鄉行動寬頻基地臺人口涵蓋率。

（三） 內政部移民署辦理保障新住民寬頻上網計畫，間有耗費採購之電腦設備長期閒置，或移作一般公務使用；平板電腦借用率偏低且未能確實服務於弱勢新住民；交流平臺瀏覽量偏低且缺乏交流管道等情事，均待研謀改善。

內政部移民署（下稱移民署）為建置新住民數位據點、新住民交流平臺，及辦理免費平板電腦借用，辦理前瞻計畫數位建設保障新住民寬頻上網計畫。經查執行情形，核有：1. 移民署規劃於所屬服務站建置新住民數位機會據點，提供新住民數位上網環境，惟事前未審慎衡酌各服務站場所環境條件之限制，妥適研謀適切方案，部分服務站未能成立專屬數位機會據點空間，提供新住民數位近用場所與資訊設備，肇致耗費鉅資購置之資訊設備，或使用率偏低，或長期閒置，或移作一般公務使用，且未追蹤考核實際運用情形，以督導各服務站研謀改善，未

能發揮建置新住民數位機會據點以縮短數位落差之計畫效益；2. 移民署為改善弱勢新住民之資訊環境及增進新住民與國人交流機會，實施免費平板電腦借用服務與建置新住民交流平臺，惟計畫未能適時修正調整，致計畫內容偏離新住民實際需求，平板電腦借用率低且未能確實服務於弱勢新住民；交流平臺瀏覽量偏低且缺乏交流管道，未能達成提升弱勢新住民數位能力及促進新住民與國人交流等情事，經函請內政部督促檢討改進。據復：1. 移民署爾後提報類案計畫將確實衡酌執行條件及能力，審慎評估辦理；針對電腦設備及無線網路等使用不佳情形，該署已於110年4月27日函請各事務大隊加強督導所屬各服務站，利用服務場域積極運用相關設備，宣導民眾踴躍使用，及重新調查各據點實際需求，妥適調撥相關設備，避免閒置，並將按季追蹤各據點設備使用狀況，針對使用率偏低之據點將加強督導；部分設備移作一般公務使用一節，該署將檢討改進，避免爾後發生類似情事；2. 將賡續主動電訪或簡訊告知弱勢新住民家庭免費平板電腦借用服務之相關資訊，及設計專屬推廣方案，提升借用意願，並將持續運用實體與網路文宣、社群管道與推廣活動等，提高服務之擴散性與傳播力；將加強運用臉書粉絲團提供留言互動，並透過多元宣導方式積極推廣，以提升新住民交流平臺網站瀏覽量。

（四） 原住民族委員會建置愛部落免費公用無線網路完成後，109 年度超過 6 成部落之使用人次未達目標值，成效未如預期；愛部落免費公用無線網路自 103 年開始建置，迄 109 年度近 9 成之無線存取點平均每日使用人數低於 10 人，亦待檢討現行設置地點實際使用情形，適時調整設置 AP 位址。

原住民族委員會為配合行政院加速行動寬頻服務及產業發展方案政策，103 至 106 年度運用行政院國家科學技術發展基金經費 2 億 4,635 萬餘元，辦理建構原住民族地區無線寬頻環境計畫完成全國 145 個部落之愛部落免費公用無線網路建置。嗣為協助介接無線寬頻應用服務，強化原鄉部落資訊基礎建設，改善原住民

族部落數位落差，並配合原住民部落營造，以部落文化健康站為核心，建置寬頻網路，讓文化健康站據點成為提供原住民老人長照、幼兒托育、數位學習及文化聚會場所之重心等，107 至 108 年度運用前瞻第 1、2 期特別預算等經費 2 億 3,715 萬餘元，補助花蓮縣政府辦理縮短城鄉數位落差部落公共網路服務計畫及臺東縣政府辦理部落無線上網寬頻服務計畫，完成 231 個部落之愛部落免費公用無線網路建置。截至 108 年底止，累計完成 376 個部落愛部落免費公用無線網路。經查使用情形，核有下列事項：

1. 愛部落免費公用無線網路建置完成後，109 年度超過 6 成部落，其使用人次未達 5,500 人次之目標值，計畫執行成效未如預期：依 106 年 7 月行政院核定之普及偏鄉寬頻接取環境計畫貳、預期效益、主要績效指標及目標值所列，原住民族委員會參考以前各期每月每部落平均使用人次，配合推廣設定緩步增加之目標，設定愛部落免費公用無線網路建置完成後，109 年度每部落平均每月目標為 5,500 人次上網。經分析 107 及 108 年度原住民族委員會於 231 個部落建置愛部落免費公用無線網路，於 109 年度之使用統計資料結果，計有 150 個部落(64.94%) 平均每月未達 5,500 人次上網之預期目標。又其中花蓮縣光復鄉、吉安鄉、花蓮市、鳳林鎮、豐濱鄉，屏東縣滿州鄉、桃園市復興區、臺東縣池上鄉、東河鄉、金峰鄉、海端鄉等 11 個鄉鎮市區，於轄區範圍內 46 個部落建置無線網路，全部皆未達目標值；臺東縣長濱鄉等 22 個鄉鎮市區於轄區範圍內 121 個部落建置無線網路，超過半數之部落未達目標值，建置後使用成效不彰。經函請原住民族委員會檢討設置地點之合理性及對於民眾之實用性，並加強宣導以提升民眾使用意願，達到介接無線寬頻應用服務，強化原鄉部落資訊基礎建設，改善原住民族部落數位落差等預期效益。據復：愛部落無線寬頻網路為改善原住民族地區部落數位落差之基礎建設，將加強宣導以提升民眾使用意願等。

2. 愛部落免費公用無線網路自 103 年度開始建置，迄 109 年度仍有近 9

成之無線存取點平均每日使用人數低於 10 人，允宜檢討現行設置地點之實際使用情形，適時調整設置 AP 位址，以妥善運用資源：原住民族委員會自 103 年開始自行或補助縣政府建置愛部落免費公用無線網路，各年度原住民族部落戶外無線寬頻服務勞務採購案服務建議書，對於無線存取點（Access Point, AP）設置原則地點均設有相關規範，舉如，108 年臺東縣原住民族部落戶外無線寬頻服務勞務採購案服務建議書徵求說明貳、服務需求說明、一、委託工作事項：「2. 得標廠商需滿足以下（1）或（2）其中任一項條件，（1）各原民部落須提供至少 6 個（含）以上無線 WiFi AP，無線信號需涵蓋各原民部落住宅區及公共區域之 50%（含）以上範圍，且須與當地鄉鎮市區公所共同會勘確認需求及建議設置地點。（2）若建置部落無線信號涵蓋公共活動區域及主要住宅區已達 80% 者，或信號涵蓋區域無實質效益，可依實際情形調整 AP 數至其他範圍較大之部落或新增建置部落。……（5）建置 WiFi AP 地點需與地方政府及當地部落村（里）長、部落長老頭目或民間團體幹部場勘及協商部落需求後建置，必要時得開協調會議並作成紀錄。……（7）得標廠商於場勘後提出所有無線網路環境系統、設備佈建與建置位置之規劃（含圖示），將每一 WiFi AP 逐一說明戶外涵蓋之部落人口住宅區域、公共區域範圍、設置地點照片，做成電子檔形式之文件報告……。」經查，原住民族委員會 103 至 108 年度於各部落、文化健康站及區公所建置愛部落免費公用無線網路計 2,274 個無線存取點，109 年度各 AP 連線使用人數結果，平均每日使用人數低於 1 人者（即年總使用人數低於 366 人），計有 530 個（占 23.31%）；平均每日使用人數低於 10 人者（即年總使用人數低於 3,651 人），計有 2,034 個（占 89.45%），換言之，僅約 10% 之 AP，每日超過 10 人利用，顯示民眾使用愛部落免費公用無線網路情形欠佳。經函請原住民族委員會賡續宣導推廣使用，及檢討調整現行 AP 設置地點，儘速依使用情形妥擬 AP 位址之設置機制，並持續分析實際使用情形，俾利滾動調整，以達成建構無線寬頻網路環境，介接無線寬頻應用與服務等計畫目標。據復：後續辦理愛部落免費公用無線網路維護營運案時，將定期統計低流量 AP 進行點位調整改善，並持續觀察調整後之使用情形等。

(五) 文化部為推動電視、流行音樂及 ACG 產業升級與轉型，辦理新媒體跨平臺內容產製計畫，惟間有跨業開發製作補助案件量能仍待提升，及開放資料上傳運用情形未臻落實，且獲補助案件辦理計畫變更或期程展延頻仍等情事，均待研謀改善。

文化部為推動電視、流行音樂及動畫、漫畫與遊戲（Anime、Comics、Games，下稱 ACG）產業升級與轉型，加速國際市場發展並帶動民間投資，輔導業者跨域發展，促進內容智慧財產權一源多用，發揮長尾效益，經行政院於 106 年 7 月核定新媒體跨平台內容產製計畫（107 至 109 年），總經費 11 億 7,872 萬元，由前瞻第 1、2 期特別預算分別編列 3 億 9,700 萬元及 7 億 8,172 萬元支應，累計實現數 8 億 6,053 萬餘元，實現率 73.01%，主要工作項目包括辦理新媒體跨平臺創意影音節目製作、流行音樂新媒體應用節目製播、原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷等補助，輔導業者產製多元創意影音內容、促進 ACG 跨域合作等。經查執行情形，核有：1.107 至 109 年度辦理原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷補助計畫，核定補助 315 案，金額 3 億 3,378 萬餘元，其中補助案件集中於非屬跨域應用之原創漫畫創作及出版發行之「漫畫輔導金」類別，計有 236 案，占 74.92%；而補助屬原創漫畫內容延伸跨域應用之「漫畫跨業開發製作」類別，計有 57 案，占 18.10%（表 26），顯示跨業開發製作類別補助案件量能尚有提升空間，有待研謀善策，加強促進原創漫畫跨

域多元應用補助，以達擴大應用價值之計畫目的；2.107 至 109 年度核定補助案件，截至 109 年 10 月底止，辦理計畫變更者

表 26 原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷補助計畫補助情形

單位：案

年度	核定補助件數	補助類別							
		漫畫跨業開發製作		漫畫輔導金		交流推廣		人才培育	
		件數	%	件數	%	件數	%	件數	%
合計	315	57	18.10	236	74.92	14	4.44	8	2.54
107	118	18	15.25	94	79.66	4	3.39	2	1.69
108	116	17	14.66	88	75.86	7	6.03	4	3.45
109	81	22	27.16	54	66.67	3	3.70	2	2.47

資料來源：整理自文化部提供資料。

計有 204 案，占核定總件數之 64.76%，已結案者僅 86 案，仍有未結案件 197 案（表 27），占 62.54%，主要係獲補助單位因素材調查、蒐集資料等前置作業時

表 27 原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷補助案件執行情形
單位：案、新臺幣千元

年度	核定補助		已結案 件數	未結案 件數	已撤案	
	件數	金額			件數	金額
合計	315	333,785	86	197	32	15,746
107	118	155,928	52	47	19	7,149
108	116	107,837	29	75	12	8,157
109	81	70,020	5	75	1	440

資料來源：整理自文化部提供資料（截至 109 年 10 月底）。

間較長、執行後發現自籌經費不足等，須辦理計畫變更或履約期程展延，其中又以申請履約期限展延者 145 案最多（占申請計畫變更件數之 71.08%），影響計畫整體執行成效，亟待加強輔導並提供必要之協助，以利計畫如期如質完成；3. 截至 109 年 10 月底止，受補助者因重複申請或認為核定補助金額難以執行，或無法依原規劃期程完成等，而申請撤銷補助者，計有 32 案（同表 27），顯示事前審查作業未盡覈實；4. 已結案之 86 案補助計畫，迄至 109 年 11 月 13 日止，尚未將補助案件詮釋資料上傳服務網供民眾下載使用，難以達到推廣漫畫及活化政府資料應用之目的等，經函請文化部檢討改善。據復：1. 將與文化內容策進院分工合作，協力豐沛產製能量，並運用該院資源與媒合機制，協助媒合跨產業合作與投融资資金，以滿足跨域開發及製作所需資金與資源；2. 已加強辦理補助案件實地訪視，提供獲補助者必要之協助，並積極督促與追蹤各案執行進度及預算執行情形，俾使計畫如期如質完成；3. 已要求申請者須檢附未重複獲補助切結書，及於審查時確實比對，並於核銷經費時，運用民間團體補（捐）助系統（CGSS）再次核對，以避免發生重複補助情事，另將透過輔導團隊提供必要陪伴及協助，以期促成計畫如期如質完成；4. 已將結案之獎補助案計畫書及成果報告之詮釋資料介接至文化資料開放服務網。

（六）民生公共物聯網計畫已開發地震速報產品及建置示範場域，惟興建主站遠超過規劃數量，前置規劃作業未臻周延，又場域驗證及產品應用仍待推廣優化，亟待檢討改善，以利地震速報產業發展。

科技部辦理建構民生公共物聯網計畫，於前瞻特別預算項下，補助財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心(下稱國震中心)辦理複合式地震速報服務分項計畫，以地震速報產業發展為目標，辦理現地型地震速報主站建置、地震速

表 28 已開發複合式地震速報服務產品及應用場域情形

產品	參與廠商	實際應用場域
地震聲光警示器	瑞○感○科技(股)公司、麥○電○企業(股)公司	辦公場域、住宅、公共場域
避難掩蔽位置指示燈	瑞○感○科技(股)公司、中○防○科技(股)公司	辦公場域、住宅
地震警示燈		醫院
電子看板		辦公、公共場域
瓦斯自動遮斷		住宅
電梯地震停梯	瑞○感○科技(股)公司	住宅、辦公室

資料來源：整理自國震中心提供資料。

報平臺開發與維運、速報應用示範產品開發、應用示範例建置、商業營運模式建置、防災產業推廣與海外輸出等，106 至 109 年度總經費 4 億 5,629 萬餘元。經查執行情形，核有：1. 截至 109 年底止，已完成興建 76 座現地型地震速報主站，加計原有之 21 座主站，合計 97 座，遠超過規劃之 44 座，據說明主要係設站費用下降，考量地震速報產業應用需較高之精細度，及備用主站以支援定期維護之關機空窗，故擴增建置 32 座主站，增幅 72.73%，與原規劃 44 座主站即可提供高品質之地震速報資訊差異甚大，前置規劃作業顯欠周延；2. 本計畫已完成地震聲光警示器、瓦斯自動遮斷等 6 項產品（裝置、系統、服務）開發（表 28），另於辦公場域、住宅及醫院等建置 18 個示範場域，以協助產業進行後續產品與服務之複製與擴散應用，惟截至本部查核日（110 年 4 月 16 日）止，僅地震速報聲光警示器成功販售至 1 家醫院，且據國震中心問卷調查場域服務體驗情形，有過半數體驗者表示於體驗結束後不願意續約，顯示民眾多不願意付費使用地震速報服務；3. 地震中心於 109 年 7 月採購已於場域驗證過之複合式地震速報應用產品（預估經費 1,138 萬餘元，實際決標金額 600 萬元），作為國內外推廣之用，並於同年 11 月 27 日完成驗收，惟截至本部查核日止，尚未對外推廣應用，產品全數置於國震中心等情事，經函請科技部督促研謀妥處。據復：1. 未來相關計畫之前期規劃作業，

將精確分析相關成本與效益；2. 試驗期間較少發生四級以上地震，體驗者體驗地震警報與相關防災連動服務之機會少，導致續約意願較低，復因計畫執行期間，交通部中央氣象局開始提供免費之國家級警報服務，間接導致付費使用地震速報服務之意願下降，嗣後於規劃相關體驗計畫時，將安排適當示範區域與較長之體驗期間，以強化體驗經驗；另將與政府相關單位協商，規劃免費與付費型地震速報服務之差異，以利後續防災產業之推廣；3. 原訂 110 年上半年與嘉義縣政府、臺南市政府執行應用推廣，惟受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響無法赴現場展示、教學，僅能線上溝通，預計疫情趨緩後，將逐步開展相關應用。

（七） 教育部推動國民中小學校園數位建設，建構智慧教學及學習環境，惟部分市縣國中小校園智慧網路及智慧教室建置進度落後，資訊科技融入教學未臻理想，允宜檢討改善。

教育部為因應雲端及智慧化學習，改善高級中等以下學校校園整體網路建設，確保有線、無線頻寬順暢，支援教師進行資訊科技輔助教學，並提供師生學習新興科技空間，完善科技領域教室與資訊設施，以達成建構下世代的智慧學習環境之願景，於前瞻第 1、2 期特別預算之數位建設—建設下世代科研與智慧學習環境項下，規劃辦理建置校園智慧網路計畫及強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫，並就國民中學及國民小學（下稱國中小）部分，擬定前瞻基礎建設國民中小學校園數位建設實施計畫。截至 109 年底止，前瞻第 1 期特別預算編列預算數 22 億 2,256 萬餘元，已執行完竣；前瞻第 2 期特別預算編列預算數 40 億 7,248 萬餘元，執行數 39 億 2,634 萬餘元，執行率 96.41%。經查執行情形，核有下列事項：

1. 推動國民中小學校園數位建設，建構智慧教學及學習環境，惟部分市縣國中小校園智慧網路及智慧教室建置進度落後，有待積極督導各市縣政府加強控管執行進度，以完善校園智慧學習環境：依前瞻基礎建設國民中小學校園數位建設實施計畫之工作重點，包括建置校園智慧網路（下稱智慧網路）及強化數

位教學暨學習資訊應用環境（含建置智慧學習教室及資訊科技教室，下稱智慧教室），並由教育部就各市縣各年度預計完成建置智慧網路及智慧教室之校數，以市縣為單位追蹤控管經費、智慧網路或智慧教室採購案（下稱校園數位建設採購案）執行情形。經查該部 106 及 107 年度於前瞻第 1 期特別預算核定補助臺北市等 22 市縣執行上開實施計畫，金額計 21 億 5,349 萬餘元，截至 109 年底止，前瞻第 1 期特別預算執行期滿已屆 2 年，其中新北市及屏東縣等 2 市縣各有 1 件校園數位建設採購案尚未完成驗收付款（表 29）。又第 2 期特別預算補助臺北市等 22 市縣執行上開實施計畫，金額計 39 億 2,821 萬餘元，截至 109 年底止，各市縣校園數位建設採購案尚未依預計進度

表 29 截至 109 年底各市縣校園數位建設採購案尚未完成驗收付款件數

單位：件

序號	市縣別	第 1 期 特別預算	第 2 期 特別預算
合計		2	31
1	臺北市	—	—
2	新北市	1	3
3	桃園市	—	3
4	臺中市	—	2
5	臺南市	—	1
6	高雄市	—	3
7	基隆市	—	—
8	宜蘭縣	—	—
9	新竹縣	—	3
10	新竹市	—	2
11	苗栗縣	—	—
12	彰化縣	—	4
13	南投縣	—	1
14	雲林縣	—	2
15	嘉義縣	—	1
16	嘉義市	—	—
17	屏東縣	1	1
18	花蓮縣	—	—
19	臺東縣	—	4
20	澎湖縣	—	—
21	金門縣	—	1
22	連江縣	—	—

資料來源：整理自教育部提供資料。

完成驗收付款者，計有新北市等 14 市縣計 31 件（同表 29），國中小校園智慧網路及智慧教室建置進度仍有落後情事，經函請教育部檢討並積極督導各市縣政府加強控管執行進度，以完善國中小校園智慧學習環境。據復：前瞻第 1 期特別預算部分，新北市已完成驗收付款，屏東縣預計 110 年 6 月完成。前瞻第 2 期特別預算部分，桃園市、高雄市及屏東縣等 3 市縣，預計 110 年 7 月完成；嘉義縣預計 110 年 9 月完成，其餘市縣均已執行完竣，將積極督促進度落後市縣儘速完成相關作業。

2. 建置校園智慧網路以提升校園資訊網路環境，惟部分績效指標實際值未達預計目標，且建置情形未臻理想，有待積極督導各市縣政府，加強控管執行進度，俾利達成計畫目標：依建置校園智慧網路計畫 109 年度績效檢討報告略

以，建置校園智慧網路子計畫國中小部分於 109 年度預計達成國中小教室具有支援 Gigabit 頻寬傳輸能力之比率達 100%、國中小校舍間主幹網路環境光纖化或支援 Gigabit 能力之學校

表 30 109 年度建置國中小校園智慧網路子計畫績效指標達成情形
單位：%

序號	指標項目	目標值	實際值
1	國中小教室具有支援 Gigabit 頻寬傳輸能力之比率	100.00	98.87
2	國中小校舍間主幹網路環境光纖化或支援 Gigabit 能力之學校比率	100.00	96.90
3	國中小校園可支援基礎邊際運算資料存取環境之市縣比率	100.00	87.95
4	國中小校園教室具備接取高頻寬無線網路環境之比率	100.00	100.00
5	國中小無線網路納入校園無線漫遊服務機制範圍之比率	80.00	100.00
6	國中小校園網路具備網路管理功能之比率	100.00	98.10
7	偏鄉學校建置校園智慧網路之比率	100.00	100.00
8	國中小校園網路架構文件化之比率	100.00	98.05

資料來源：整理自教育部提供資料。

比率達 100% 等 8 項績效指標（表 30）。本部前查核建置國中小校園智慧網路子計畫 108 年度辦理情形，核有國中小校舍間主幹網路環境光纖化或支援 Gigabit 能力之學校比率、國中小校園可支援基礎邊際運算資料存取環境之市縣比率、國中小校園網路具備網路管理功能之比率及偏鄉學校建置校園智慧網路之比率等 4 項績效指標未達預計目標，經函請教育部檢討。據復業追蹤各市縣績效指標達成情形，並由計畫辦公室及輔導團隊提供輔導與協助，預計 109 年底達成相關績效指標目標值。經追蹤覆核 109 年度實際執行情形，國中小教室具有支援 Gigabit 頻寬傳輸能力之比率（98.87%）、國中小校舍間主幹網路環境光纖化或支援 Gigabit 能力之學校比率（96.90%）、國中小校園可支援基礎邊際運算資料存取環境之市縣比率（87.95%）、國中小校園網路具備網路管理功能之比率（98.10%）及國中小校園網路架構文件化之比率（98.05%）等 5 項績效指標仍未達預計目標（同表 30），校園智慧網路建置進度持續落後，影響數位學習資源使用及教學成效，經函請教育部檢討並積極督導各市縣政府加強控管執行進度，以提升計畫執行成效。據復：國中小教室具有支援 Gigabit 頻寬傳輸能力之比率、國中小校園網路架構文件化之比率等 2 項指標，截至 110 年 4 月 28 日已達預計目標，其餘 3 項指標將積極督促儘速達成預計目標。

3. 學校已運用建置之教室設備進行教學，有助國中小師生體驗及學習新興科技，惟部分國中小使用資訊科技融入教學情形未臻理想，尚待加強輔導強化運用資訊科技教學，以營造智慧學習環境：依強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫 109 年度績效檢討報告略以，

增設科技領域教室子計畫國中小部分於 109 年度預計達成以下 2 項績效指標：(1) 科技領域教室資訊設備，符合科技領域課綱校數之比率 100%（下稱符合科技領域課綱比率）；(2) 科技教案件數占市縣校數

表 31 109 年度強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫績效指標達成情形

單位：%

序號	指標項目	目標值	實際值
增設科技領域教室子計畫			
1	符合科技領域課綱比率	100.00	100.00
2	科技教案比率	50.00	89.30
營造智慧學習教室子計畫			
1	輔助教學受惠比率	100.00	100.00
2	互動教學受惠比率	50.00	78.30
3	進階教學受惠比率	15.00	56.80

資料來源：整理自教育部提供資料。

之比率（下稱科技教案比率）50%。另營造智慧學習教室子計畫國中小部分於 109 年度預計達成以下 3 項績效指標：(1) 針對資訊科技輔助教學，師生受惠於更新後之數位學習環境累計比率（下稱輔助教學受惠比率）100%；(2) 針對資訊科技互動教學，師生受惠於更新後之數位學習環境累計比率（下稱互動教學受惠比率）50%；(3) 針對資訊科技進階教學，師生受惠於更新後之數位學習環境累計比率（下稱進階教學受惠比率）15%。經查 109 年度實際執行情形，上開 5 項績效指標皆已達成預計目標值（表 31），惟分析各市縣情形，科技教案比率未達預計目標者，計有彰化縣（6.50%）、花蓮縣（32.00%）及金門縣（25.00%）等 3 縣；輔助教學受惠比率未達預計目標為彰化縣（92.70%），經函請教育部檢討加強輔導上開縣政府，強化運用資訊科技融入教學，以營造智慧學習環境。據復：將持續辦理數位教學教師增能課程，以利教師運用數位學習平臺進行新型態適性教學，增進教師數位教學能力。

（八）教育部國民及學前教育署補助高級中等學校建構智慧學習環境，有助推動數位與行動學習，惟學校無線網路部分開放學生使用、連外網路實測速率偏低及運用資訊科技教學成效不明等情，允宜研謀改善。

教育部國民及學前教育署（下稱國教署）為建構下世代的智慧學習環境，於

106 至 109 年度運用前瞻第 1、2 期特別預算數位建設經費合計 17 億 2,492 萬餘元，補助公立高級中等學校辦理建置校園智慧網路計畫、高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫及強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫，期能提供校園順暢無礙的數位、行動學習網路環境，結合高品質資訊科技融入教學，達成數位校園、智慧學習等目標。經查執行情形，核有：1. 國教署推動建置校園智慧網路計畫，補助公立高級中等學校改善行動學習所需之高頻寬無線網路環境，截至 109 年底止，公立高級中等學校教室能順暢接取無線網路之校數比率為 97%，已趨近預計目標值（100%）。又十二年國民基本教育課程綱要以自發、互動及共好為理念，強調培養學生成為自發主動的學習者，依課程綱要總綱，「彈性學習時間」可依學生需求與學校條件，安排學生自主學習；學生可依據實施規範，自訂主題、目標，系統規劃自主學習計畫，而雲端數位學習資源可打破教室藩籬之限制，有助拓展學生學習領域。據國教署統計，145 所國立高級中等學校中，計有 36 校「開放」、109 校「部分開放」學生使用學校無線網路，為妥善運用特別預算建置之無線網路環境，便利學生接取學習資源，並避免學生用於與學習無關之活動，允宜研議合理開放學生使用學校無線網路之管理機制；2. 國教署推動高中職學術聯網全面優化頻寬提升計畫，補助公立高級中等學校提升校園網路對外連網頻寬，預計於 109 年底完成光纖到校且連外頻寬至少 100Mbps 之校數比率達 100%，期使教師順暢接取數位化、雲端化教學工具，並提供學生運用行動載具接取學習資源所需之頻寬。據國教署調查，145 所國立高級中等學校實測平均連外網路速率，計有國立華僑高級中等學校等 58 校（占

表 32 國立高級中等學校連外網路實測平均速率

單位：校

傳輸速率	上傳速率		下載速率		上傳及下載速率	
	校數	%	校數	%	校數	%
合計	145	100.00	145	100.00		
100Mbps 以上	83	57.24	86	59.31	82	56.55
未及 100Mbps	62	42.76	59	40.69	58	40.00
未及 50Mbps	19	13.10	16	11.03	13	8.97

註：1. 實測時間點：110 年 2 月。

2. 資料來源：整理自國教署提供資料。

40.00%)上傳及下載速率均未及 100Mbps，甚有國立北門高級農工職業學校等 13 校（8.97%）上傳及下載速率均未及 50Mbps（表 32），允宜檢討持續

優化數位學習環境；3. 國教署推動強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫，補助公立高級中等學校充實一般教室、資訊科技教室及生活科技教室資訊設備，以利教師運用數位科技於各領域教學，其中營造智慧學習教室子計畫之績效指標，除統計「更新學校教室資訊設備」數量外，並冀由改善教學現場資訊環境，提升師生使用資訊科技「輔助教學」、「互動教學」、「進階（創新）教學」之人數達一定比率。據國教署統計，截至 109 年底止，上開指標均已達預計目標值，惟其係以補助校數占公立高級中等學校總校數之比率計算，而非師生實際使用資訊科技進行教學之人數比率，與原定評估方法未合，未能具體呈現師生運用資訊設備教學情形，反映計畫效應或影響等情事，經函請國教署檢討改善。據復：1. 督導學校，邀集教師、家長、學生代表共同討論，建立無線網路使用管理機制，經校務會議通過後公告，俾利學生在合理的規範下進行網路學習；2. 學校連外網路實測平均速率可能受到不同網路應用服務、用戶終端設備等級及防毒軟體等因素影響，致無法達到申裝速率 100Mbps，將邀請學者專家協助學校提升校園網路頻寬達目標值；3. 透過前瞻第 3 期特別預算之高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫，測試學生使用資訊科技自主學習，深入了解教學現場使用資訊科技實際受惠情形，並透過數位教材與數位課程之推廣、研習及輔導等，提升教師應用資訊科技教學之能力。

六、城鄉建設

政府為優化民眾生活環境與品質，促進城鄉均衡發展，於前瞻第 1、2 期特別預算編列 1,070 億 1,010 萬餘元執行城鄉建設計畫（第 1 期 350 億 3,491 萬餘元、第 2 期 719 億 7,519 萬元），補助地方政府辦理提升道路品質、開發在地型產業園區、公有危險建築物補強重建、改善停車問題、文化生活圈建設、城鎮之心工程、校園社區化改造、整建長照衛福據點、營造休閒運動環境、客家浪漫臺三線、原民部落營造等 11 項分支計畫，以打造多元文化、寧適優質之城鄉環境，分由內政部、交通部、經濟部、教育部、衛生福利部、文化部、客家委員會、原住民族委

員會等 8 個主管機關執行。截至 109 年底止，總計已核定各市縣 7,080 件補助計畫（工程）。經查城鄉建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一）內政部等 8 個部會執行城鄉建設計畫，預期可優化民眾生活環境品質，惟補助計畫管考機制未臻周延，間有未符共同性補助辦法規定，及未落實管考機制，亟待檢討改善，以提升計畫執行成效。

內政部等 8 個部會分別執行前瞻第 1、2 期特別預算城鄉建設類計 11 項分支計畫，為利補助地方政府辦理各項計畫之審查、核定、管制及考核作業，有一致性之遵循依據，各中央主管機關均已訂定個別計畫之管考規定，包含城鎮之心工程計畫補助執行要點等 26 項規範。經查補助計畫管考機制執行情形，核有：1. 上開 26 項管考規範之內容，部分事項核與中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第 15 條第 1 項規定未符，舉如未明訂補助計畫之辦理期程及完成期限（內政部等 6 部會）、未明訂計畫執行之查核點及管考週期（內政部等 6 部會）；未明訂查核之項目（內政部等 8 部會）；查核項目未包含受補助地方政府內部控管機制、執行完竣後使用之效益等（內政部、教育部）（表 33）。2. 據各部會依前瞻基礎建設特別條例第 9 條規定向立法院提出 109 年度之執行進度及績效報告所載，截至 109 年底止，城鄉建設類計 11 項分支計畫之量化效益指標項目，總計 58 項，其中教育部辦理營造休閒

運動環境計畫之「維持我國規律運動人口比率」及「自行車運動遊憩人口數」等 2 項效益指標，未

表 33 城鄉建設主管部會補助管考規範缺失態樣

項次	缺失態樣	中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法	部會別
1	未明訂補助計畫之辦理期程及完成期限	第 15 條第 1 項第 1 款	內政部、交通部、衛生福利部、教育部、文化部、客家委員會
2	未明訂計畫執行之查核點及管考週期	第 15 條第 1 項第 2 款	內政部、經濟部、衛生福利部、教育部、文化部、客家委員會
3	未明訂查核之項目	第 15 條第 1 項第 3 款	內政部、交通部、經濟部、衛生福利部、教育部、文化部、客家委員會、原住民族委員會
4	查核項目未包含受補助之地方政府內部控管機制、及執行完竣後使用之效益等	第 15 條第 1 項第 3 款	內政部、教育部

資料來源：整理自相關部會提供截至 110 年 3 月底資料。

達原訂目標值；其餘 56 項效益指標尚達成計畫目標。惟查該等效益指標執行成果均係由各地方政府自行查填於各部會管考系統彙總，中央補助機關並未落實管考機制，逐項查核勾稽地方政府執行成果及資料正確性，考核成效尚待商榷等情事，經函請行政院督促相關部會強化計畫管考機制。

（二） 內政部營建署補助地方政府辦理提升道路品質計畫，以改善都市計畫區街道環境品質，惟補助計畫及工程設計審查未臻周延、執行結果之績效指標未達原訂目標等，計畫審查機制與績效管考作業尚待檢討強化，以提升計畫執行效益。

內政部營建署（下稱營建署）為提升臺灣都市與城鄉區域道路及人行街道環境，達成道路多功能規劃及公共通行無障礙空間等目標，經提報行政院於 106 年 6 月 7 日核定提升道路品質計畫，辦理期程自 106 年 9 月至 110 年 8 月止，計畫總經費 212 億元，係透過補助地方政府方式辦理，營建署並訂定 106 至 109 年提升道路品質計畫（內政部）補助執行要點，作為審查地方政府計畫、執行進度管考及績效評核等依據。截至 109 年底止，總計已核定各市縣 1,322 件補助計畫。經查執行情形，核有下列事項：

1. 營建署審核地方政府申請補助案件，間有地方政府提報補助計畫非屬補助範疇、未先行取得工程用地等未符補助規定情事，致核定補助後又予撤案：營建署補助內容包含既有道路養護整建、建置自行車路網、都市無障礙系統等項目，由地方申請單位提送申請計畫，經市縣政府初審並擬具審查意見後報營建署，由營建署邀請專家學者成立評審委員會審查各申請補助機關之補助計畫，採競爭型補助機制。截至 109 年底止，總計 16 件經市縣政府申請撤銷補助，總金額計 11 億 7,401 萬餘元，經分析其撤案原因，包括提報施作項目（公路系統路段）非屬補助範疇、與其他計畫重複申請補助、工程用地無法取得、或地方政府未編列自

籌款等（表 34），顯示地方政府於提報補助計畫，未衡酌計畫可行性，而營建署亦未落實依上開補助執行要點辦理，致迭有計畫因無法執行而須撤案等情事，經函請營建署檢討改善。據復：將於執行進度檢討會議中，加強宣導地方政府於提案階段審慎評估計畫之可行性、整體性及機關執行量能，以避免撤案情形，並落實審查機制。

表 34 提升道路品質計畫補助案件撤案情形

單位：新臺幣千元

項次	市縣別	計畫項目	計畫總經費	撤案原因
合計			1,174,012	
1	屏東縣	(108)屏東縣牡丹鄉茄芝、高士路等路段改善工程	17,400	屬公路系統之路段，非屬本計畫補助範疇。
2	宜蘭縣	蘇澳鎮海山東路及忠孝路等道路改善工程	33,600	與其他計畫重複申請補助。
3	嘉義縣	嘉義縣水上鄉大崙村大崙國小通學步道改善工程	5,000	工程用地無法取得。
4	花蓮縣	富里鄉東竹國小通學步道工程	16,700	未完成自籌款預算編列作業。
5	桃園市	延平路三段（新光合纖至台 66）人行道鋪面改善工程	16,940	執行進度落後或採購作業遲無法完成，未能於規定期限發生權責。
6	雲林縣	雲林縣北港鎮都市計畫內道路及村里聯絡道路工程	58,333	
7	臺東縣	金峰鄉壠坵村環境改善規劃設計	50,000	補助計畫核定後，市縣政府變更需求與執行內容。
8	臺北市	西區門戶周邊人行環境優化整合計畫	857,143	
9	南投縣	南投縣鹿谷鄉興產路共同管溝道路改善工程	10,714	
10	嘉義縣	嘉義縣民雄鄉昇平路、中樂路、民生路等道路品質提升改善工程	45,000	
11	嘉義縣	義竹後鎮鎮安宮廟埕廣場及村里文化步道改善計畫	1,200	
12	嘉義縣	嘉義縣鹿草鄉下麻村部落廟埕及週邊村里步道改善計畫	1,200	
13	嘉義縣	東石海埔庄鄉村道路改善計畫	1,200	
14	嘉義縣	六腳鄉六美國小通學步道暨景觀風貌改善計畫	6,542	
15	花蓮縣	花蓮市中央路 4 段道路品質改善工程	34,320	
16	臺東縣	106 年度卑南鄉溫泉特定區四號道路型塑城鄉人文地景街道計畫（第二階段）	18,720	

資料來源：整理自營建署提供截至 109 年底資料。

2. 營建署審查地方政府工程規劃設計作業未臻周延，且執行結果之績效指標未達原訂目標：經抽查部分地方政府辦理之工程案件，營建署顯未落實依

106 至 109 年提升道路品質計畫（內政部）補助執行要點規定，辦理工程設計審議作業，舉如：新竹縣政府辦理新竹縣竹北市縣府周邊人行環境改善工程及新竹縣竹北市縣華停車場周邊及光明六路人行

表 35 提升道路品質計畫完工後效益未達目標情形

效益指標	單位	「1」		「2」		「3」		「4」	
		原訂目標	完工效益	原訂目標	完工效益	原訂目標	完工效益	原訂目標	完工效益
無障礙空間每年連續串接改善長度	公尺	—	—	558	512.5	—	—	1,790	1,775
綠化面積	平方公尺	—	—	—	—	—	—	1,350	1,161
改善道路品質長度	公尺	—	—	—	—	2,435	—	1,790	1,775
公共通行路障排除改善	處	—	—	—	—	3	—	—	—
綠化面積	平方公尺	564	562	—	—	—	—	—	—
管溝 2 管線以上	公尺	2,656	2,216	—	—	—	—	—	—

註：1. 代號「1」-新北市淡海輕軌綠山線人行自行車道整合串聯工程第三標（濱海路一、二段周遭人行環境改善）工程。「2」-新竹縣高鐵七路樹穴及人行空間鋪面改善工程。「3」-新竹縣竹北市縣府周邊人行環境改善工程。「4」-新竹縣竹北市縣華停車場周邊及光明六路人行環境改善工程。
2. 資料來源：整理自營建署提供截至 110 年 3 月底資料。

環境改善工程等 2 件工程，營建署將該 2 工程規劃設計之審查意見後續修正情形，逕交新竹縣政府自行審定，核與上開補助執行要點第 7 點第 2 款規定不符；且部分地方政府執行結果，亦核有部分補助計畫之績效指標未達原訂目標等情事（表 35），營建署亦未落實考核其完工後效益達成情形並督促檢討改善等，仍審核同意結案，經函請營建署檢討改善。據復：本項屬全國性補助計畫，該署辦理工程設計審議作業負荷量超出預期，已於前瞻第 3 期特別預算「提升道路品質計畫（內政部）2.0 補助執行要點」，新增授權地方機關審定之機制。另市縣政府未來辦理結案時，若竣工後工程效益未達原規劃 70%，將要求檢討說明原因並辦理修正計畫。至新竹縣政府查填部分工程執行結果之績效指標未臻確實，已洽該府至「工程管理資訊整合系統」補登，後續將加強查核系統填報數據之正確性。


（三）經濟部工業局為促進地方就業與產業在地發展，辦理開發在地型產業園區計畫，部分案件執行進度欠佳或甚有撤案，復有結案報告未列載輔導措施執行內容或無未登記工廠進駐案例，或未於招標前完成用地取得，亟待研謀改善。

工業局為促進既有產業用地利用效率及增加產業用地供給，協助產業升級，提供在地就業，並解決部分農地違規工廠問題，辦理開發在地型產業園區計畫項下之 2 項分支計畫，包括強化地方工業區公共設施（下稱強化公設）補助方案及設置平價產業園區（下稱平價園區）補助方案，計畫經費合計 165 億 4,409 萬元，期程為 106 年 9 月至 114 年 8 月，經費以前瞻特別預算支應。截至 109 年底止，已編列前瞻第 1、2 期特別預算 91 億 6,909 萬餘元，執行結果，累計實現數 72 億 2,427 萬餘元（78.79%）、應付保留數 4 億 7,871 萬餘元（5.22%），賸餘數 14 億 6,610 萬餘元（15.99%）。經查執行情形，核有下列事項：

1. 補助地方政府辦理在地型產業園區建置與整修，部分案件執行進度欠佳或撤案，影響產業用地供給及輔導未登記工廠遷廠進駐合法經營之效益，亟待研謀改善，發揮加速推動重要建設效益：依行政院 107 年 7 月核定「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設開發在地型產業園區計畫」列載，全國產業用地總量管制內容研析推估，110 年各市縣產業用地需求面積約 2,211 公頃，截至 109 年底止，各市縣已陸續編定工業區 571.79 公頃，尚不足 1,639.22 公頃。按市縣別分析，產業用地不足者，以新北市 476.39 公頃最多，其次依序為桃園市 375.09 公頃、彰化縣 129.35 公頃（圖 7）。工業局為協助地方政府改善在地工業區公共設施服務水準

圖 7 各市縣預估 110 年產業用地不足面積概況

單位：公頃

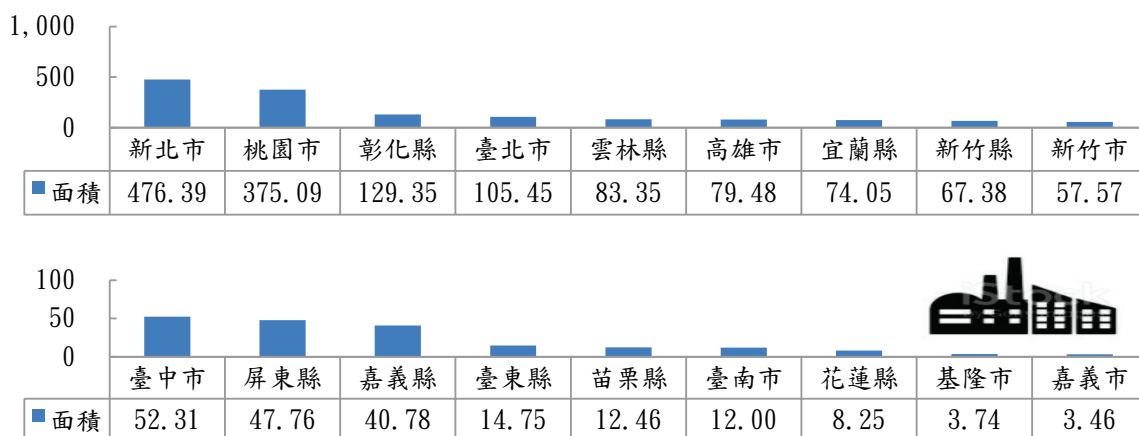


資料來源：整理自工業局提供資料。

及加速規劃設置平價園區，以提供產業用地及吸引廠商投資設廠，並輔導未登記工廠遷廠進駐合法經營等，已於 106 年 12 月訂頒補助地方政府強化地方工業區公共設施及設置平價產業園區作業要點（下稱補助作業要點），據以補助地方政府辦理在地型產業園區建置與整修，以滿足產業用地需求及強化公共服務設施。工業局自 107 年度起受理地方政府申請相關補助案件，截至 109 年底止，已核定補助強化公設案件 82 件、平價園區案件 35 件，共計 117 件。至 110 年 4 月底，已完成 72 件（強化公設案件 71 件、平價園區案件 1 件），尚未完成者 35 件（強化公設案件 9 件、平價園區案件 26 件），主要係開發計畫、農地變更或環境影響評估說明書尚未通過，或用地取得等問題所致；撤案者 10 件（強化公設案件 2 件、平價園區案件 8 件；圖 8），主要係用地無法取得等因素所致。其中設置平價園區補助案件，歷經 3 年，僅完成 1 件，其餘均未完成，甚有 8 件撤案，按撤案市縣別分析，以新北市 3 件最多，預計開發面積 330.55 公頃；其次為彰化縣 2 件，預計開發面積 12.88 公頃，除徒耗相關審查等行政作業外，復嚴重影響產業用地供給及輔導未登記工廠遷廠進駐合法經營之效益，如彰化交流道附近特定區產業園區開發示範計畫撤案，影響後續輔導轄內未登記工廠 765 家期程，經函請工業局督導研謀改善。據復：為使補助經費有效運用，將透過競爭型評選機制篩選出優先補助及候補名單，其中純屬道路闢鋪、無法提出具體土地取得策略及經評估無法於補助期限執行完畢者，逕列入候補，並督導受補助地方政府先行辦理規劃設計、研訂招標與分標策略，降低因採購影響執行。另修正以個案預警管考之方式，

圖8 截至110年4月底工業局開發在地型產業園區計畫核定補助案件執行概況

單位：件

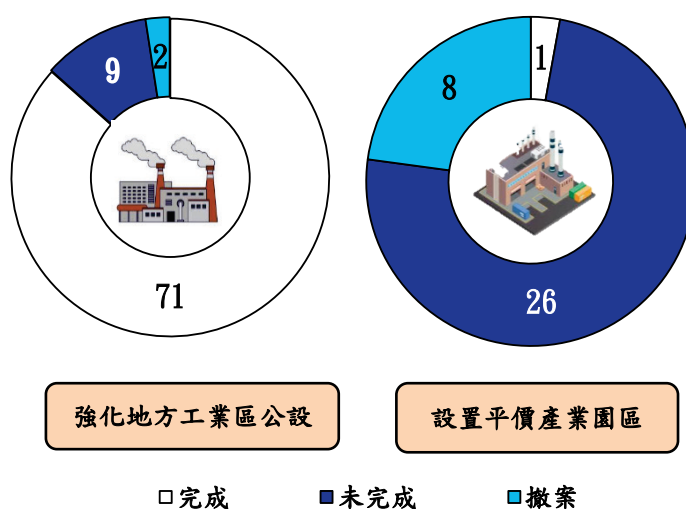

資料來源：整理自工業局提供資料。

滾動檢討調整核配次年度經費需求，並強化補助案件全生命週期（招標階段、園區申請設置階段、工程設計及施工階段）之管考頻度，地方政府如確有困難無法執行，得刪減未能於補助期間內執行完竣之工項經費，由候補名單依序遞補，俾利預期效益及目的達成。

2. 地方政府申請補助計畫涵蓋輔導未登記工廠進駐策略措施，結案報告未列載輔導措施執行內容，又尚無未登記工廠進駐案例，亟待強化管控及督導落實輔導未登記工廠措施：依補助作業要點第 18 點第 5 款規定，為確保計畫執行成效，經核定之設置平價產業園區補助方案，受補助之市縣政府應於補助契約期限完畢後 3 年內，分別於每年 6 月 30 日前及 12 月 31 日前將使用情形、廠商進駐、整體營運情形等函報工業局。經查強化公設補助方案及平價園區補助方案均含輔導未登記工廠遷廠進駐，惟補助作業要點僅規定平價園區補助方案之執行成效控管機制。又截至 110 年 4 月底止，強化公設補助方案，已結案者 71 件，辦理結算作業中 4 件，其中已結案之林口工四工業區公共設施改善工程計畫等 13 件，未於結案報告列載輔導未登記工廠措施執行情形。另辦理結算作業中之大潭濱海特定工業區計畫（污水處理廠案），尚未

辦理未登記工廠輔導措施(表 36)；另查各地方政府申請補助計畫之輔導未登記工廠進駐策略措施，包括召開說明會、提供低廉租金政策、規劃違規工廠進駐區域、媒合閒置土地、提升工業區公設品質及交通便利性，以提升廠商遷廠進駐意願等，據工業局提供資料，截至 110 年 4 月底止，尚無未登記工廠進駐

之案例，經函請工業局加強管控及強化輔導未登記工廠進駐措施。據復：為落實輔導未登記工廠措施，將持續依作業要點及控管機制，督促地方政府辦理各該申

表 36 截至 110 年 4 月底強化公設補助方案未列輔導措施或未執行案件

案件名稱
(一) 已結案案件
1. 桃園市微米科技園區位於中山北路 268 巷等公共設施補助計畫
2. 林口工四工業區公共設施改善工程計畫
3. 桃園市龜山區工四工業區增設滯洪設施計畫
4. 桃園市蘆竹區坑口海湖工業區海山中街道路改善工程計畫
5. 龍潭烏樹林工業區道路改善工程計畫
6. 龜山工業區公共設施改善工程計畫
7. 華亞科技園區公共設施改善工程
8. 楊梅幼獅工業區道路品質改善工程計畫
9. 平鎮工業區公共設施改善工程計畫
10. 中壢工業區公共設施改善工程計畫
11. 林口工三工業區公共設施改善工程計畫
12. 桃園市蘆竹區坑口海湖工業區中圳街道路改善工程計畫
13. 桃園科技工業園區計畫（污水處理廠增設水肥投入案）
(二) 結算中案件
大潭濱海特定工業區計畫（污水處理廠案）

資料來源：整理自工業局提供資料。

請補助計畫中提升廠商遷廠進駐意願之措施，並要求於結案報告列載輔導措施執行內容，以確保計畫如實達成預期效益。

3. 強化公設補助方案部分工程未於招標前完成用地取得，存有衍生履約爭議、終止或解除契約風險，亟待強化審查及管控措施，並督導改善，確保計畫如期如質完成，提升既有園區服務效能：依據行政院公共工程委員會（下稱工程會）95年9月25日工程企字第09500342190號函說明二列載，為避免得標廠商於履約期間因機關無預算支付工程款或尚未取得工程所需用地，致使工程進度延宕或無法進行，並衍生日後履約爭議、契約終止或解除之情形，建議各機關辦理公共工程招標前，應先確定預算來源及施工用地已取得。又依工程採購契約第21條第10款第3目規定：「暫停執行期間累計逾__個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為6個月）者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。因可歸責於機關之情形無法開工者，亦同」。經查嘉義縣政府辦理馬稠後產業園區縣道167道路拓寬工程(鹿草段)，於108年12月18日決標，決標金額2億5,777萬元，履約期限至111年4月底止，執行結果，截至110年4月底止，預定進度42.89%，實際進度36.86%，主要係部分用地未取得，僅就取得用地部分施工；又臺中市政府辦理太平產業園區第二聯絡道路—德明路拓寬改善工程，於108年12月2日決標，決標金額1,283萬元，履約期限為開工日起210日曆天，執行結果，已於109年6月30日開工，但因用地未取得，自109年9月30日停工，至110年4月底，預定進度100%，實際進度19.80%（表37），已停工210天尚未復工，工程進度嚴重落後，已達工程採購契約規定停工逾6個月得終止或解除契約之要件。上開案件均未依工程會函釋於招標前完成用地取得，除造成工程進度延宕外，亦有衍生日後履約爭議、終止或解除契約之風險，經函請工業局督導改善，並強化審查

表 37 強化公設補助方案工程未於招標前完成用地取得案件概況

嘉義馬稠後 產業園區案件	臺中太平 產業園區案件
	
預定進度	
42.89%	100.00%
實際進度	
36.86%	19.80%

資料來源：整理自工業局提供截至110年4月底資料。

及管控措施，確保計畫提升既有園區服務效能。據復：已持續督導嘉義縣及臺中市政府加速取得相關用地，並將持續加強管控。另已針對因工程延宕致有須解除契約之情事，建立退場機制，暨協助後續解約作業，並由候補名單依序遞補，俾確保效益及目的達成。

(四) 經濟部中小企業處補助地方政府發展城鄉特色產業，建立區域產業生態鏈，惟整體補助經費執行率偏低，且逾 6 成補助案件執行進度落後，亟待檢討妥處，俾達計畫目標。

經濟部中小企業處為發展城鄉特色產業，於前瞻特別預算城鄉建設項下之開發在地型產業園區計畫，辦理推動城鄉特色產業園區發展分項計畫，透過補助地方政府建置特色園區與創新場域，以建立區域產業生態鏈，帶動產業升級，計畫執行期間為 107 至 109 年度，匡列預算 17 億 5,594 萬餘元（第 1 期 3 億 987 萬餘元，第 2 期 14 億 4,606 萬餘元）。截至 109 年底止，計核定補助 17 市縣辦理 23 項、補助金額 17 億 5,343 萬餘元，其中特色園區 5 項（7 億 1,695 萬餘元）、創新場域 18 項（10 億 3,648 萬元）。經查截至 109 年底止，23 案補助計畫累計實支數 9 億 9,705 萬餘元，占核定補助經費 17 億 5,343 萬餘元之 56.86%，其中特色園區、創新場域經費執行率分別僅 33.88% 及 72.76%（表 38）；又核定補助 23 項中，實際執行進度未達預定進度者，高雄市及嘉義縣等 2 市縣政府各 2 項，桃園市、臺南市、基隆市、宜蘭縣、新竹市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等 10 市縣政府各 1 項，共計 14 項，約占 60.87%，甚至金門

表 38 截至 109 年底城鄉特色產業園區補助計畫執行情形

單位：項、新臺幣千元

類型	核定計畫項數	補助經費	累計實支數	%
合計	23	1,753,439	997,057	56.86
特色園區	5	716,959	242,913	33.88
創新場域	18	1,036,480	754,144	72.76

資料來源：整理自中小企業處提供資料。

縣產遊博覽園區計畫、嘉義縣水產精品加值產業園區、馬祖城鄉特色產業園區等 3 案預計進度均為 100%，實際進度分別僅 27.89%、39.46%、39.94%，落後比率分別高達 72.11 個百分點、60.54 個百分點、60.06 個百分點。揆各該補助計畫經費執行率偏低及進度落後原因，主要係工程設計延宕、或辦理計畫變更、或工程

標案預算編列偏低，無廠商投標致流標等，影響執行進度所致，經函請經濟部中小企業處檢討妥處。據復：將加強輔導諮詢措施、專案檢討會議及增加辦理工程督導現勘，及時協助受補助地方政府排除計畫執行障礙，協助計畫如期結案，以達計畫目標，活絡城鄉經濟。

（五） 公路總局辦理改善停車問題計畫補助地方政府興建停車場，部分已完工停車場計畫停車率低於閒置公共設施活化基準，或實際停車率未達計畫目標，允宜檢討研謀改善。

交通部為協助地方政府改善停車空間不足問題，滿足轉乘及觀光等停車需求，由公路總局辦理改善停車問題計畫，補助地方政府興建停車場，截至 109 年底止，已編列預算數 45 億 5,000 萬元，實現數 38 億 2,936 萬餘元，已完工營運之停車場計有新北三重商工地下、新竹漁人碼頭及臺中西區大益等 11 處，其中新北市三重商工地下停車場 108 年 9 月開始營運，109 年度每月尖峰停車率皆超過 9 成，平均停車率皆超過 8 成，有效改善當地停車問題（表 39），惟亦有高雄五甲社區公有、新竹漁人碼頭、高雄微笑公有、復興二路及民族一路公 1 等 5 處停車場，其計畫停車率平日為 17%至 37%，假日停車率為 18%至 50%，臺中市西區大益及豐原育英路多目標立體停車場計畫停車率尖峰時間（上午 07:00~09:00 及下午 17:00~19:00）為 60%，離峰時間為 20%，該 7 處停車場之計畫停車率均低於工程會所訂閒置公共設施之活化基準〔停車場所在村（里）人口數逾 3,000 人者：「1 個月內平均小時停車率 40%以上」或「尖峰小時停車率 70%以上」；停車場所在村（里）人口數 3,000 人以下者：「1 個月內平均小時停車率 30%以上」或「尖峰小時停車率 70%以上」〕，另金門山外公車站停車場尖峰實際停車率僅 3.50%至 7.00%，平均停車率僅 1.70%至 5.00%，遠低於其計畫停車率 30%；新竹漁人碼頭停車場實際平均停車率 9.10%至 27.89%，低於其計畫停車率（平日：25%、假日：50%），經函請交通部督促檢討改善。據復：公路總局未來召開審議協調小組會議，將提醒地方政府申請案件應參考閒置公共設施活化基準訂定合理目標年

停車率，本計畫補助地方興建之停車場完工營運後，亦將由該部交通事業管理小組及公路總局落實檢視及督導其實際停車率，倘營運期間有閒置或低度使用之情形，將依閒置公共設施提報列管及活化作業要點暨活化閒置公共設施年度績效與補助型計畫補助處理原則規定，提報列管及作為補助地方政府申請公共建設補助案優先順序之參考，並依公路總局改善停車問題計畫補助審查執行要點第 4 點第 12 款第 9 目規定，追回相關補助款項。

表 39 改善停車問題計畫已完工營運停車場計畫及實際停車率

單位：%

地方政府	停車場	完工日期	營運日期	計畫停車率	109 年度實際停車率
高雄市	高雄五甲社區公有停車場	107.06.11	108.07.19	平日：26 假日：20	尖峰：77.06~99.41 平均：49.84~70.51
臺中市	臺中市西區大益停車場	107.11.19	108.01.01	尖峰：60 離峰：20	尖峰：81.45~89.14 平均：63.66~70.68
新竹市	新竹漁人碼頭停車場	107.11.19	108.11.19	平日：25 假日：50	尖峰：37.37~94.05 平均：9.10~27.89
高雄市	高雄微笑公有停車場（註 1）	108.04.10	108.01.31	平日：18 假日：24	尖峰：57.00~89.00 平均：46.00~65.22 (109 年 10 月至 110 年 4 月)
金門縣	金門航空站停車場（註 2）	108.04.17	108.12.01	50	尖峰：23.00~72.00 平均：20.00~69.00 (109 年 7 至 12 月)
新北市	三重商工地下停車場	108.06.30	108.09.01	61	尖峰：95.00~100.00 平均：80.00~87.00
臺中市	豐原育英路多目標立體停車場（註 3）	108.07.29	108.12.02	尖峰：60 離峰：20	尖峰：44.63~51.30 平均：41.58~45.45 (109 年 3 至 12 月)
高雄市	復興二路停車場	108.12.11	109.04.21	平日：37 假日：18	尖峰：55.00~61.00 平均：37.00~56.71 (109 年 5 至 12 月)
金門縣	山外公車站停車場（註 2）	108.09.25	108.12.01	汽車：30	尖峰：3.50~7.00 平均：1.70~5.00 (109 年 7 月至 110 年 5 月)
高雄市	十全立體公有停車場（註 5）	109.05.20	109.01.21	平日：47 假日：27	尖峰：71.17~95.93 平均：62.19~95.64 (109 年 2 至 12 月)
高雄市	民族一路公 1 停車場（註 4）	109.01.17	109.02.10	平日：17 假日：26	尖峰：48.76~70.22 平均：47.00~63.86 (109 年 10 月至 110 年 4 月)

註：1. 高雄微笑公有停車場開場後為高雄市交通局自營開單，僅有平均停車率，自 109 年 10 月 1 日委外經營管理，本表 109 年度實際停車率揭露期間自 109 年 10 月至 110 年 4 月；營運日期早於完工日期係因部分不影響停車場整體運作之細部工程於營運日後完工。

2. 金門航空站停車場及山外公車站停車場因停管設備主機故障，108 年 12 月至 109 年 6 月之停車率資料遺失。

3. 豐原育英路多目標立體停車場於 108 年 12 月核准營運，109 年 3 月正式對外營運。

4. 民族一路公 1 停車場開場後為高雄市交通局自營開單，僅有平均停車率，自 109 年 10 月 1 日委外經營管理，本表 109 年度實際停車率揭露期間自 109 年 10 月至 110 年 4 月。

5. 十全立體公有停車場營運日期早於完工日期係因部分不影響停車場整體運作之細部工程於營運日後完工。

6. 資料來源：整理自交通部及公路總局提供資料。

(六) 文化部辦理文化生活圈建設計畫，期能落實文化在地扎根及文化平權，惟補助私有老建築保存再生案件之撤案率及未簽約率逾 2 成，規劃設置臺灣美術文獻檔案保存研究中心尚未完成等，亟待檢討改善。

文化部推動文化生活圈係為建構共同歷史記憶與集體行動，尊重與強化在地特色文化，進而文化治理帶動城鄉發展，以落實文化在地扎根及文化平權，報經行政院核定前瞻基礎建設—城鄉建設—文化生活圈建設計畫，總經費 265 億元，執行期程為 106 年 9 月至 114 年 12 月，主要工作項目計有文化保存、重建臺灣藝術史等子計畫。截至 109 年底止，累計編列預算數 155 億 79 萬元，累計執行數 150 億 4,902 萬餘元，執行率 97.09%。經查執行情形，核有下列事項：

1. 補助私有老建築保存再生案件之撤案率及未簽約率均逾 2 成，允宜檢討積極辦理，以提升計畫執行績效：文化部為引入民間自發性文化治理力量，保存具潛在文化資產之私有老建築，提升國人文化保存意識，以保存城鄉特色發展紋理，辦理文化保存—具文資潛力之老建築保存與再生計畫，自 106 年 9 月至 109 年底止，累計編列預算數 5 億 7,666 萬元，累計執行數 5 億 4,254 萬餘元，執行率 94.08%。經查執行情形，核有：(1) 107 至 109 年度補助建物整修類案件計 176 件，截至 109 年 8 月底止，已撤案 46 件，比率 26.14%；已核定未簽約件數 47 件，比率 26.70% (表 40)，主要係部分私有老建築產權複雜、民眾須自籌部分款項，及老建築之調查研究、規劃設計與徵求專業技術人員等費時所致；(2) 109 年度計有臺北市、新北市、

表 40 107 至 109 年度文化部核定補助私有老建築保存再生案件執行情形

單位：件、%

補助類別	核定件數	計畫案件執行情形 (註 1)					
		已簽約數	已完工數	未簽約數	未簽約率	撤案數	撤案率
合計	221	113	4	55	24.89	49	22.17
建物整修	176	79	4	47	26.70	46	26.14
修復技術及再生推廣	6	2	—	2	33.33	2	33.33
文化經營	39	32	—	6	15.38	1	2.56

註：1. 計畫案件執行情形係統計至 109 年 8 月底。

2. 資料來源：整理自文化部提供資料。

桃園市、新竹縣及澎湖縣等 5 個市縣政府之私有老建築保存再生計畫補助作業由文化部專案受理申請 (包括初審、複審、書圖審查、撥款等作業)，未由各該地方

政府訂定優先輔導保存及推廣策略，不利在地文化之保存及推廣；(3) 部分受補助辦理私有老建築整修案件已完工結案，惟未落實標示公益性回饋內容，不利民眾參觀利用等情事，經函請文化部檢討改善。據復：(1) 將進行撤案原因分析，研擬解決對策；將請各市縣政府加強輔導民眾依審查委員意見修正計畫書及補正文件，以提升簽約效率；(2) 將函請未代辦市縣政府強化宣傳老建築修繕成果，俾帶動引導未代辦之市縣加入該計畫，積極促進地方與中央分級合作；(3) 規劃於期末成果報告書增加公益性標示之佐證照片，並請市縣政府明確標示已完工建物之公益性，以利民眾參觀利用。

2. 規劃建置臺灣美術文獻檔案保存研究中心尚未完成，藏品取得作業規範未盡完善等，允宜檢討改善：文化部為收藏、搶救、梳理臺灣重要藝術資產，建構臺灣藝術史發展脈絡，聯結地方藝術文史記憶，辦理重建臺灣藝術史計畫，自 106 年 9 月至 109 年底止，累計編列預算數 15 億 6,177 萬餘元，累計執行數 14 億 5,383 萬餘元，執行率 93.09%。其中由國立臺灣美術館（下稱國美館）執行之分項計畫，及國立臺灣工藝研究發展中心（下稱工藝中心）執行之重建臺灣工藝史完備計畫，經查執行情形，核有：(1) 國美館規劃建置臺灣美術文獻檔案保存研究中心，惟因文化部對設置地點之決策反覆，致尚未完成建置；(2) 工藝中心辦理重建臺灣工藝史完備計畫，蒐集並購藏重要工藝作品，惟藏品取得作業規範未盡完善，且未建立作品價格訪視及鑑價程序；(3) 國美館採購 4K 高畫質雷射劇院機 4 臺（每臺單價 58 萬元）及高畫質劇院機 12 臺（每臺單價 9 萬餘元），已分別於 108 年 10 月 30 日及 108 年 9 月 20 日驗收，惟截至本部查核日（109 年 11 月 4 日）止，已逾 1 年期間均未曾使用等情事，經函請文化部檢討及督促改善。據復：

(1) 將督請國美館另行評估臺灣美術文獻檔案保存研究中心設置地點，以達成政策目標；(2) 將檢討修訂相關作業流程與藏品取得作業等規範，俾益業務順利推動；(3) 將統整協調各檔期所需之影音器材設備，並以現有設備優先充分運用。

(七) 內政部營建署補助地方政府辦理城鎮之心工程計畫，以促進城鄉均衡健康之發展，惟補助計畫管考機制未臻周延，允宜檢討研修並落實執行，以提升補助計畫效能。

內政部營建署（下稱營建署）為改善老舊市區公共服務、公共設施品質，促進城鄉均衡健康之發展，於前瞻基礎建設計畫城鄉建設中研擬城鎮之心工程計畫，經行政院於 106 年 7 月核定，營建署於前瞻第 1、2 期特別預算總計編列 83 億餘元支應，規劃藉由補助地方政府方式投入舊市區再生工程與核心城鎮之重點投資，改善鄉鎮生活水準，以達成區域均衡與健康之發展，並於 106 年 8 月 29 日發布城鎮之心工程計畫補助執行要點，作為計畫範圍內之城鄉建設經費補助依據；另營建署為考核各市縣補助計畫執行成效，於 108 年 4 月 19 日發布內政部補助地方政府城鎮之心工程計畫考核評鑑作業要點。經查補助計畫管考機制執行情形，核有：營建署訂定城鎮之心工程計畫補助執行要點、內政部補助地方政府城鎮之心工程計畫考核評鑑作業要點等，間有未依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法明訂補助計畫之辦理期程及完成期限、計畫執行之查核點及管考週期與查核之項目等；又據 108 年度城鎮之心工程計畫執行績效評鑑暨工程督導考核工作執行計畫書所載，共分 2 階段辦理評鑑，第 1 階段評鑑項目包含執行管考（質化評鑑）等 9 項，第 2 階段評鑑項目包含進度及工期掌握等 12 項，總計 21 項，惟該查核評鑑項目均未依上開補助辦法規定包含受補助地方政府內部控管機制、執行完竣後使用效益等情事（表 41），經函請營建署檢討改善。

據復：將於新訂或修正計畫補助執行要點規定時，依中央對直

表 41 城鎮之心工程計畫查核評鑑項目未符補助辦法規定情形

中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法	108 年度城鎮之心工程計畫執行績效評鑑暨工程督導考核工作執行計畫書	
第15條第1項第3款查核項目	評核項目	未包含補助辦法查核項目
1. 計畫執行進度 2. 整體經費與補助款支用情形 3. 受補助之直轄市、縣（市）政府內部控管機制 4. 計畫執行效益 5. 計畫執行完竣後使用效益	第1階段： 執行管考（質化評鑑）等 9 項 第2階段： 進度及工期掌握等 12 項	1. 受補助之直轄市、縣（市）政府內部控管機制 2. 計畫執行完竣後使用效益

資料來源：整理自中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法及營建署提供資料。

轄市及縣（市）政府補助辦法第 15 條規定，增訂計畫之辦理期程及完成期限、補助計畫執行之查核點及管考週期等事項。另將於修正城鎮之心工程計畫執行績效評鑑暨工程督導考核工作執行計畫書時，納入內部控制機制及計畫執行效益等查核項目。

（八） 衛生福利部推動整建長照衛福據點計畫，有助加速布建社區式服務資源，惟經費執行率持續欠佳，且部分案件完成整建後遲未能開辦長照據點服務，亟待研謀改善，以提升計畫執行成效。

衛生福利部（下稱衛福部）為落實長照十年照顧計畫 2.0，加速布建社區照顧資源，建構以社區為基礎之長照服務體系，以前瞻特別預算辦理「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—公共服務據點整備—整建長照衛福據點計畫」（下稱整建長照衛福據點計畫），規劃結合該部所屬機構及各市縣公有空間，整建設置各類長照服務據點及長期照顧管理中心分站，計畫總經費需求 107 億餘元，計分 5 期辦理，其中第 1 期、第 2 期經費需求合計 72 億餘元，執行期間自 106 年 9 月至 109 年度。經查執行情形，核有下列事項：

1. 計畫經費執行率持續欠佳，連年經國家發展委員會評列為高風險計畫，亟待積極研謀改善，以提升執行成效：依行政院於 109 年 9 月 10 日（第 3 次）核定修正之整建長照衛福據點計畫，該計畫第 1 期、第 2 期工作項目包括整建長照 ABC 據點、照顧管理中心照管分站及長照創新整合型服務場館等 3 項，係補助衛福部所屬機構及地方政府運用公有空間，設置長照據點及照管分站之新建、增建、改建或修（建）繕等所需費用。經查衛福部及所屬辦理整建長照衛福據點計畫第 1 期、第 2 期合計編列預算 72 億 6,682 萬餘元，執行期間自 106 年 9 月至 109 年度（第 1 期為 106 年 9 月至 107 年度；第 2 期為 108 至 109 年度）。執行結果，前瞻第 1 期特別預算編列預算數 26 億 7,218 萬餘元，經行政院核定（第 2 次）保留至 109 年度執行數 12 億 1,611 萬餘元，實現數 5 億 1,765 萬餘元，僅占保留數

之 42.57%，須續予保留 6 億 8,794 萬餘元至 110 年度執行（表 42）；前瞻第 2 期特別預算編列預算數 45 億 9,463 萬餘元，實現數 10 億 7,259 萬餘元，僅占預算數之 23.35%，須保留 33 億 9,452 萬餘元至 110 年度執行（表 43），顯示計畫各期經費執行率均偏低，預算保留金額龐鉅，據該部說明，主要係多數補助案件規劃設計時程較長、工程招標歷經多次流標、工程履約期限跨年度、地方政府辦理撤案等所致。另查國

表 42 整建長照衛福據點計畫 109 年度第 1 期特別預算執行情形

單位：新臺幣千元、%

工作項目	第 1 期 法定預算數	109 年度執行情形			
		109 年度第 1 期保留數	實現數	實現率	保留至 110 年度執行數
合計	2,672,184	1,216,116	517,655	42.57	687,947
整建長照 ABC 據點	2,546,546	1,187,553	494,697	41.66	682,697
照顧管理 中心照管 分站	125,638	28,563	22,958	80.38	5,249

資料來源：整理自衛福部提供資料。

表 43 整建長照衛福據點計畫第 2 期特別預算執行情形

單位：新臺幣千元、%

工作項目	第 2 期 法定預算數	實現數	實現率	保留至 110 年 度執行數
合計	4,594,639	1,072,597	23.35	3,394,520
整建長照 ABC 據點	3,891,015	1,050,207	26.99	2,407,757
照顧管理中心 照管分站	16,500	22,389	135.69 (註 1)	—
長照創新整合 型服務場館	687,124	—	—	986,763 (註 1)

註：1. 照顧管理中心照管分站補助經費已實現比率超過 100%，及長照創新整合型服務場館補助經費保留至 110 年度執行數超過法定預算數，係流用其他工作項目經費支應所致。

2. 資料來源：整理自衛福部提供資料。

家發展委員會業依行政院函頒公共建設計畫審議、預警及退場機制，於 107 至 109 年度連續 3 年將整建長照衛福據點計畫評列為高風險（紅燈）預警計畫，並針對該計畫經費執行嚴重落後情形，建議衛福部研謀提前辦理案件審議及經費核撥作業、將備案機制常態化、調查管制各據點年度預定完成經費及進度、每年檢視各縣市物價指數以滾動調整補助標準等因應對策。鑑於整建長照衛福據點計畫於前瞻第 1、2 期特別預算尚有 40 億餘元保留至 110 年度繼續執行，預算保留金額龐鉅，且於前瞻第 3 期特別預算再編列預算數 13 億元持續執行，經函請衛福部針對該計畫過往執行遭遇之問題，積極輔導地方政府研謀改善，並妥謀增進經費執行效率之策略，以提升計畫執行成效。據復：已每月召開工程個案執行進度檢討會

議，持續控管第 1 期、第 2 期落後案件辦理情形，並參採國家發展委員會建議，提前辦理補助案件相關審查、核定作業，及請各地方政府於第 3 期申請計畫書敘明區域長照需求、布建地點之土地與建管相關法規適法性、工程可行性評估等事項，督促地方政府強化計畫前置評估作業，並於計畫期程管制表填列規劃設計、工程預定進度與預估經費，以利適當分配及撥付補助經費。

2. 部分案件完成空間整建後遲未能開辦長照據點服務，損及設施補助成效，允宜檢討改善，以避免發生設施低度使用情形：按行政院於 108 年 12 月 3 日（第 2 次）核定修正之整建長照衛福據點計畫，該計畫第 1 期、第 2 期規劃於 106 年 9 月至 109 年度結合公有空間整建設置 604 處長照 ABC 據點、5 處長照創新整合型服務場館，並就整建長照 ABC 據點及長照創新整合型服務場館項目列有預計受益人數合計 13 萬餘人。經查衛福部辦理整建長照衛福據點計畫第 1 期整建長照 ABC 據點項目核定執行案件共 445 件，執行結果，截至 110 年 3 月底止，除未竣工 29 件、竣工尚未完成驗收 24 件，暨已開辦長照據點服務 338 件外，前開案件於竣工完成驗收後，尚未開辦長照據點服務計有 54 件，其中 16 件自竣工完成驗收後，已逾 2 年迄未依原規劃承作之長照據點類型開辦相關服務；另該計畫第 2 期整建長照 ABC 據點及長照創新整合型服務場館項目核定執行案件共 332 件，執行結果，截至 110 年 3 月底止，除未竣工 127 件、竣工尚未完成驗收 25 件，暨已開辦長照據點服務 109 件外，前開案件於竣工完成驗收後，尚未開辦長照據點服務亦有 71 件，其中 20 件自竣工完成驗收後，已逾 1 年尚未依原規劃承作之長照據點類型開辦相關服務。上開各期補助案件於竣工完成驗收後迄未開辦長照據點服務，據各受補助單位說明，主要係刻正辦理前置行政準備工作、輔導團體籌設中、志工人力不足、社區人事異動或缺乏辦理意願、建物尚有其他工程施作等所致。鑑於部分受補助案件完成空間整建後，遲未能開辦長照據點服務，其中不乏歷時甚久者，損及設施補助成效，亦不利達成該計畫預期受益人數之目標，經函請衛福部研謀改善，並研議針對已完成空間整建後遲未開辦據點服務者，增訂相

關督導考核機制，以避免發生設施低度使用甚或閒置情形。據復：已每季盤點竣工案件之長照服務開辦情形及未開辦原因，針對已竣工卻未依核定計畫書開辦長照服務之案件，業請地方政府積極輔導及媒合專業服務單位儘速開辦，經輔導後遲未開辦長照服務者，依公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫補助及評選作業要點相關規定，該部得撤銷補助經費，受補助單位應依規定返還補助款。

（九） 原住民族委員會補助高雄市、屏東縣、宜蘭縣及臺東縣等 4 個市縣政府以新建或整修方式建置部落之心示範點，截至 109 年底已屆計畫期程，因未完成興辦事業計畫或採購作業多次流標等，迄未完成建置，尚難達成整合長者照護、學童課後照顧、幼兒族語托育、數位運用機會等服務之預期目標。

原住民族委員會依部落之心示範點建置補助計畫，於 107 年 1 月 29 日核定高雄市、屏東縣、宜蘭縣及臺東縣等 4 個市縣政府辦理部落之心示範點計畫，以新建或整修方式建置具原住民族傳統建築特色及文化意涵之綜合服務中心，總核定經費 2 億 4,320 萬元，截至 109 年底止，實際執行數 1 億 5,027 萬餘元，執行率 61.79%。經查執行情形，核有下列事項：

1. 未依規定確實審查臺東縣政府申請補助計畫，致計畫用地取得及編定變更等應備程序未完成，遲未能取得建造執照而無法施作工程，計畫執行進度延宕而撤銷補助：依部落之心示範點建置補助計畫柒、提案方式、四規定：「本案如涉及用地使用、建物取得、都市計畫、用地編定變更、建物結構安全證明或其他興辦應備程序，應先洽各該主管機關辦理完竣，檢附主管機關等相關證明文件。」捌、審查方式及標準：「一、審查方式：由本會組成審查小組辦理審查，地方政府應出席簡報。二、審查標準：……。（二）興辦應備程序及證明文件。」臺東縣政府於 106 年 10 月 20 日及 107 年 4 月 23 日 2 度函送臺東縣金峰鄉公所提報部落之心示範點建置計畫（正興部落）至原住民族委員會，經該會審查結果，分別於 107 年 1 月 29 日及 6 月 13 日核定補助 2,000 萬元及 1,400 萬元(追加預算)，合計 3,400 萬元，建置文化與學童分享教室一中繼屋、正興多功能文化聚會所設施改善及修

繕母語托育中心，計畫期程為 107 年 3 月至 108 年 12 月，期營造部落傳統生活及老幼共學生活空間、傳承部落傳統文化。經查，截至 109 年底止，正興多功能文化聚會所設施改善及修繕母語托育中心分別於 108 年 8 月及 109 年 3 月完工，經原住民族委員會於 109 年 9 月 11 日、110 年 1 月 10 日撥付尾款並同意結案。另文化與學童分享教室一中繼屋計畫之用地，涉及原住民保留地撥用，以及後續申請非都市土地變更編定事宜，金峰鄉公所未依部落之心示範點建置補助計畫柒、提案方式、四規定，先洽主管機關完成相關土地撥用及土地變更編定，即於 106 年 10 月及 107 年 4 月間申請計畫，原住民族委員會亦未落實計畫審查，確認本案興辦程序及證明文件是否符合提案方式之規範，仍於 107 年 1 月及 6 月核定計畫及後續追加經費，致金峰鄉公所雖於 107 年 11 月完成規劃設計及工程採購案發包作業，惟土地用地取得及編定變更等應備程序未完備，遲無法取得建造執照，施工廠商僅能先行施作水土保持工程，108 年 9 月 30 日規劃設計監造廠商並以未取得建造執照工程無法繼續執行為由，向金峰鄉公所申請停工，經該公所於同年 10 月 21 日同意待停工事由消滅後再行復工等，計畫執行進度嚴重落後，經原住民族委員會 109 年 12 月 23 日通知依補助計畫規定撤銷補助該項計畫並要求繳回賸餘款。查原住民族委員會未依規定確實審查，在本案用地取得及變更尚未完成前，即核定補助計畫，後續因土地撥用作業費時，工程無法施作，執行進度嚴重延宕而撤銷補助，致已投入之水土保持工程經費 123 萬餘元形同不經濟支出，未能達成建置臺東縣部落之心示範點之計畫目標，經函請原住民族委員會嗣後允宜落實補助計畫審查機制，避免再因用地取得等前置作業未完成，而影響計畫執行期程與成效。據復：後續審查相關補助計畫時，將確實依照規定予以審理及核定，落實相關要件審查，避免類似情形再度發生。

2. 屏東縣及宜蘭縣部落之心示範點建置計畫，因工程採購多次流標，致延遲施工；高雄市示範點則因公共安全疑慮而停止執行，整體計畫執行進度延宕：依部落之心示範點建置補助計畫玖、督導與考核規定：「一、計畫執行期間本會（或委託專業單位）將不定期派員進行督導與查核，並將結果作成紀錄。……。」

三、計畫執行進度落後或執行成效欠佳，且限期未能改善者，本會得視情形調整（刪減）經費或撤銷補助該項計畫。……。五、受補助機關應指定專責單位及人員，負責統籌協調與執行管考工作，並按季填報辦理進度、實際支用補助經費情形，於次月五日前送本會備查，並出席本會召開之相關會議。……。」原住民族委員會於107年1月29日核定高雄市、屏東縣、宜蘭縣及臺東縣等4個市縣政府辦理部落之心示範點計畫，其中屏東縣政府辦理新建創始家屋等8棟建築物整修工程，因第2期工程歷經5次流標，又宜蘭縣政府籌劃興建原住民多功能會館，因規劃設計標作業延宕，影響工程採購時程，且工程歷經5次流標等，各該工程採購雖分別於109年8月27日及108年11月18日決標，惟截至109年底之施工進度僅約20%及40%；至於高雄市政府之示範點位於原住民族神話故事館，將擴充長期照顧、課後扶持、部落大學等相關機能空間，並規劃增建VR與AR科技設備，提供高雄市都會區長者與幼童整合性服務，雖於109年1月3日完成第1期整修計畫，惟原住民族神話故事館鄰近道路於109年9月11日發生乙烯外洩意外，事業管線修復時程冗長，考量民眾使用安全性，爰未再執行第2期整修計畫等，致屏東縣、宜蘭縣及高雄市等政府未能依計畫如期完成建置部落之心示範點。原住民族委員會雖依規定辦理督考並於109年7月21日召開部落之心示範點建置補助計畫執行情形會議，惟仍有工程多次流標未決或無法遂行接續整修工程情事，經函請原住民族委員會積極督促地方政府依工程採購契約完成施作，或評估另覓新場址作為部落之心示範點之可行性，以達到建置具原住民族傳統建築及文化意涵的綜合服務中心，提供整合長者照護、學童課後照顧、幼兒托育及無線寬頻上網服務、營造原住民族文化傳承與發展之場域等設置目的。據復：將持續督促屏東縣及宜蘭縣政府依工程採購契約完成施作，以達到建置具原住民族傳統建築及文化意涵的綜合服務中心設置目的；至於高雄市政府之示範點部分，涉及公共安全事宜，將尊重該府後續監測及安全管制狀態等，再研議未來結案方向。

七、因應少子化友善育兒空間建設

政府為營造優質生養環境，改善少子女化問題，於 106 年度起編列特別預算推動前瞻基礎建設計畫，將因應少子化友善育兒空間建設納於其中，以加速擴大幼兒托育及教保的公共化，提供價格合理且品質有保障的托育及教保服務，減輕家長之經濟負擔，並增進福利服務之可近性。前瞻第 1、2 期特別預算因應少子化友善育兒空間建設計畫共計編列預算 41 億 7,970 萬餘元（第 1 期 19 億 6,050 萬元；第 2 期 22 億 1,920 萬餘元），由衛生福利部（下稱衛福部）及教育部分別推動辦理建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫及校園社區化改造計畫－營造友善育兒空間等 2 項計畫，補助市縣政府布建社區公共托育設施等據點及新建幼兒園園舍。截至 109 年底止，已補助增設或改善 205 處社區公共托育設施、45 處托育資源中心、106 處家庭（社會）福利服務中心、21 處綜合社會福利館及 268 班幼兒園園舍，有助提升托育及教保服務量能。經查因應少子化友善育兒空間建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一） 衛福部補助辦理建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫有助強化福利服務輸送量能，惟先期規劃作業未臻嚴謹，且計畫執行進度落後，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效。

衛福部為發展在地化之照顧服務網絡，強化福利服務輸送量能，經行政院於 106 年 7 月 10 日核定辦理前瞻基礎建設計畫－少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫，規劃於 106 至 114 年間，補助地方政府活化地區閒置空間，布建或修繕社區公共托育設施等服務據點，並充實其設施設備，作為民眾取得福利服務之近便窗口，計畫計分 5 期辦理，總經費需求計 60 億餘元，全數以前瞻特別預算支應。經查執行情形，核有下列事項：

1. 部分案件先期規劃及評估作業未臻嚴謹，於核定補助後撤案，允宜強化案件審查作業，以利計畫推行：按建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫第 1、2 期之工作項目，包括推動社區公共托育設施、布建托育資源中心、增設或改善家庭（社會）福利服務中心及整建綜合社會福利館等 4 項。衛福部為利各該工作項

目之推行，訂有少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫補助及評選作業要點，明確規範市縣政府提案原則、補助項目及評估標準等事項，作為審查申請補助案件之準據。惟經本部前查核發現，衛生福利部社會及家庭署（下稱社家署）原核定建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫第 1 期補助案件 260 案，其中 11 案因原規劃設置據點場地用途變更等因素，於計畫核定後申請撤回，經於 108 年 6 月 12 日函請社家署強化申請案件審查作業，俾免類此情事再生，據復將持續督導市縣政府落實執行需求評估作業，並審慎辦理計畫審查，以提升計畫執行效益。嗣經就後續執行情形追蹤覆核結果，發現建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫第 2 期補助案件 475 案中，亦有桃園市楊梅區（員本社區活動中心）社區公共托育家園等 89 案，因規劃布建服務據點場地另有他用、建物尚須辦理耐震補強工程，或案件多次流標，評估無法於計畫期程內完成等因素，於計畫核定後申請撤回，撤案比率為 18.74%，相較第 1 期之 4.23% 不減反增，顯示各該市縣政府仍未能審慎辦理先期規劃評估作業，於計畫核定補助後復申請撤案，虛耗行政作業成本，並影響其他市縣政府可申請補助額度，經函請社家署督促市縣政府完備先期規劃及確實評估提案之可行性，並強化申請案件審查作業，以利計畫推行。據復：已修正少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫補助及評選作業要點，明確規範市縣政府應確實掌握規劃建設地點之相關資訊，並預先完成工程技術可行性評估、消防及公共安全法規適法性評估等前置作業；另已函請各市縣政府於申請前瞻第 3 期特別預算補助案時，檢送相關檢核表單，作為社家署審查案件之依據，以利計畫推行。

2. 計畫推動期程落後，允宜積極輔導市縣政府提升執行能力，以強化社區照顧服務網絡：按建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫之執行期程為 106 至 114 年度，計分 5 期辦理，第 1 期計畫執行期間為 106 及 107 年度，編列預算 5 億 9,050 萬元（不含經行政院同意停止執行之育兒百寶箱經費 2 億元）；第 2 期計畫執行期間為 108 及 109 年度，編列預算 14 億 5,481 萬元。執行結果，社家署核定第 1 期補助案件 260 案，核定補助經費計 5 億 9,012 萬元，截至 107 年底止，實現數僅 1

億 1,048 萬餘元，約為核定數之 18.72%，並保留 4 億 514 萬餘元至以後年度繼續執行，惟保留款執行 2 年後，僅實現 2 億 6,276 萬餘元，未及保留數之 7 成，且尚有 7 案補助計畫未執行完畢，續予保留經費 1 億 3,273 萬餘元至 110 年度執行（表 44）；至第 2 期計畫之執行情形，社家署計核定補助案件 475 案，核定補助經

表 44 建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫第 1 期特別預算執行情形

單位：新臺幣千元、%

工作項目	法定 預算數	核定數 (A)	107 年度執行情形			保留數執行情形				
			實現數 (B)	實現率 (B/A× 100)	保留數 (C)	108 年度 實現數 (D)	109 年度 實現數 (E)	小計 (F=D+E)	實現率 (F/C× 100)	保留至 110 年度 執行數
合計	590,500	590,120	110,481	18.72	405,143	103,690	159,069	262,760	64.86	132,731
推動社區 公共托育 設施	108,000	129,867	64,389	49.58	48,550	18,600	27,540	46,140	95.04	1,200
布建托育資 源中心	109,500	84,540	26,783	31.68	37,655	13,955	7,946	21,901	58.16	15,706
增設或改 善家庭(社 會)福利服 務中心	145,000	110,571	19,308	17.46	78,835	27,875	38,413	66,288	84.08	4,541
整建綜合社 會福利館	228,000	265,142	—	—	240,103	43,260	85,170	128,430	53.49	111,284

註：1. 本表法定預算數不含已經行政院同意停止執行之育兒百寶箱經費 2 億元。

2. 建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫第 1 期特別預算全數分配於 107 年度執行。

3. 資料來源：整理自社家署提供資料。

費計 14 億 1,567 萬餘元，截至 109 年底止，實現數 3 億 5,477 萬餘元，亦僅為核定數之 25.06%，須保留 129 件未竣案件之補助經費 7 億 417 萬餘元至 110 年度繼續執行（表 45），顯示前

瞻特別預算整體經費執行成效欠佳。據社家署說明，主要係因市縣政府空餘場地尋覓不易，規劃設置據點場域多為老舊建物，須辦理使用執照變更及耐震補強等作業，廠商

表 45 建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫第 2 期特別預算執行情形

單位：新臺幣千元、%

工作項目	法定 預算數	核定數	實現數	實現率	保留數
合計	1,454,810	1,415,677	354,777	25.06	704,172
推動社區公共托 育設施	537,310	483,128	155,961	32.28	99,583
布建托育資源中心	283,500	290,163	93,679	32.29	118,088
增設或改善家庭 (社會)福利服 務中心	234,000	154,320	64,492	41.79	43,118
整建綜合社會福 利館	400,000	488,066	40,643	8.33	443,382

資料來源：整理自社家署提供資料。

投標意願薄弱，招標階段多次流標，影響後續設計監造及工程進度等，致預算執行進度未如預期。復以建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫各工作項目之效益目標達成情形觀之，第 1、2 期計畫所列 4 個工作項目中，僅布建托育資源中心 1 項已達預定目標 45 處；另整建綜合社會福利館項目因市縣政府申請新建場館案件所需經費較高，經核定新（修）建 21 處據點後預算已用罄，爰未能達成目標值 30 處，其餘推動社區公共托育設施及增設或改善家庭（社會）福利服務中心等 2 項，已分別布建 205 處及 106 處，然因部分補助案件經市縣政府評估建物老舊改建困難或招標不易後辦理撤案，致申請案量未如預期，增設據點數較目標值為少，相關服務之受益人數亦未能達標。綜上，社家署以前瞻特別預算辦理建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫，囿於市縣政府設置據點場地尋覓不易及工程招標困難等因素，致預算執行情形欠佳，部分工作項目未能達成預定效益目標，業經國家發展委員會依循公共建設計畫審議、預警及退場機制，評列為 109 年度高風險（紅燈）計畫，計畫執行進度顯有落後，經函請社家署督導市縣政府針對進度落後案件研提具體改善方案落實執行，儘速完成建物修繕及開辦據點等相關事宜，俾及早設置相關據點，提供民眾所需之福利服務。據復：已採行定期召開公共建設推動會報，逐案管考期程，檢討案件執行情形與因應對策，及不定期辦理市縣政府實地訪查等改善措施，以輔導市縣政府提升計畫執行能力。

（二） 教育部國民及學前教育署補助市縣政府新建幼兒園園舍，提供民眾平價、優質的教保場所，有待衡酌平價教保服務供給妥善資源配置，並改善非營利法人甄選作業時程，以降低未能如期開辦之風險。

教育部配合前瞻計畫推動校園社區化改造計畫，補助市縣政府新建幼兒園園舍，預計設置公共化（含公立及非營利）幼兒園 200 班（485 間教室），提供民眾就近選擇平價、優質的教保場所。教育部國民及學前教育署（下稱國教署）於前瞻第 1、2 期特別預算因應少子化友善育兒空間建設項下編列預算合計 19 億 3,439 萬餘元，106 年 11 月核定補助市縣政府新建幼兒園園舍 50 園，執行結果，截至

109 年底止，累計實現數 18 億 7,432 萬餘元，實現率 96.89%，106 至 109 年度新建幼兒園園舍 268 班（485 間教室），其中 141 班（251 間教室）已開辦招生、17 班（31 間教室）已竣工、110 班（203 間教室）已開工，預計於 110 年 7 月底前竣工。經查執行情形，核有下列事項：

1. **參採教保公共化比率決定補助新建幼兒園園舍之優先序位，允宜於建立準公共機制後，研議將準公共幼兒園提升平價教保供給納入決定補助優先序位之考量，妥善資源配置：**依教育部國民及學前教育署補助辦理校園社區化改造計畫之新建幼兒園園舍作業要點第 5 點第 1 款規定，整體縣（市）公共化比例未達 4 成者優先核定補助經費，各行政區公共化比例未達 4 成者其次，公共化比例已達 4 成惟仍有新建園舍需求者再次之；同要點第 6 點第 2 款規定，市縣政府應審慎評估各行政區幼兒人口成長狀況及公共化幼兒園供應量，充分考量城鄉供需及平衡後，研提新建幼兒園園舍申請計畫。顯示該署參採教保公共化比率（公共化幼兒園核定招生名額占各類幼兒園總核定招生名額之比率）決定補助優先序位，以合理分配教保資源。又國教署為加速提升平價教保供應量，除運用前瞻特別預算補助新建幼兒園園舍外，另依我國少子女化對策計畫（107 至 111 年度），推動準公共機制，以貼近公共化幼兒園之收費標準，與私立幼兒園合作成立準公共幼兒園，自 107 學年度起於非直轄市實施，於 108 學年度推動至全國，並於 108 年底運用公務預算核定補助新建幼兒園園舍 45 園。經查準公共機制於全國實施後，108 學年度除連江縣均為公立幼兒園外，其餘市縣平價教保名額比率（公共化及準公共幼兒園核定招生名額占各類幼兒園總核定招生名額之比率）介於 25.10%至 90.88%之間（表 46），部分市縣已大幅提

表 46 108 學年度各市縣幼兒平價教保概況

單位：%

市縣別	教保公共化比率	平價教保名額比率
合計	30.17	46.14
臺北市	38.23	47.71
新北市	30.38	37.31
桃園市	23.45	38.63
臺中市	20.26	32.71
臺南市	21.46	30.46
高雄市	23.51	45.86
基隆市	44.44	57.26
宜蘭縣	53.59	75.84
新竹縣	21.21	25.80
新竹市	19.73	25.10
苗栗縣	27.34	72.65
彰化縣	28.90	55.50
南投縣	42.82	77.64
雲林縣	46.65	77.00
嘉義縣	54.18	85.23
嘉義市	28.66	46.15
屏東縣	34.52	76.67
花蓮縣	56.24	66.69
臺東縣	63.33	72.39
澎湖縣	79.60	85.69
金門縣	84.79	90.88
連江縣	100.00	100.00

資料來源：整理自國教署提供資料。

升平價教保供應量，如苗栗縣、屏東縣教保公共化比率雖未達 4 成，惟加計準公共幼兒園核定招生名額，平價教保名額比率已逾 7 成，如僅參採教保公共化比率決定補助優先序位，資源分配標準恐未盡妥適。鑑於政府持續補助新（擴）建幼兒園園舍，擴大公共化教保供應量，允宜將準公共幼兒園提升平價教保供給，納入後續決定補助優先序位之考量，以使政府資源得以優先配置於平價教保資源不足之地區，經函請國教署研議辦理。據復：將學區內整體平價教保服務供應量，納入協助市縣政府興建公共化幼兒園園舍之評估要件。

2. 新建幼兒園園舍間有工程進度落後，未能按預定時程完成非營利法人甄選等情，近 4 成幼兒園未能如期於 109 學年度開辦，有待改善執行進度及非營利法人甄選作業時程：國教署 106 年 11 月核定補助市縣政府新建幼兒園園舍 50 園，原預定於 108 年 7 月底全數竣工並取得使用執照，至遲於 109 學年度開辦招生，並委託國立雲林科技大學辦理專案管理，每月召開進度列管會議掌握各幼兒園執行進度。據 109 年 2 月份進度列管會議紀錄，截至 109 年 1 月底止，50 園中僅 1 園取得使用執照，尚有 11 園仍處於工程招標文件上網公告、建築工程簽約（決標）階段，38 園仍處於建築工程開工階段，執行進度嚴重落後。另依非營利幼兒園實施辦法第 9 條規定，非營利法人應依公告事項，檢具經營計畫書參加甄選。各級主管機關並應依據非營利幼兒園委託及申請辦理甄選審議基準，辦理非營利法人甄選審議事宜。據專案管理計畫期末報告載列，新建計畫規劃於 108 年 2 月 28 日前完成法人遴選及核備，惟多數未能按照預定時程完成；間有市縣政府表示，法人參與誘因仍不足，從設置至法人進駐營運，均需冗長的磨合與等待時間，顯示法人甄選作業面臨一定程度之不確定性。因工程進度落後及未完成法人甄選，109 學年度計有 19 園（占 38.00%）未能如期開辦，有待改善執行進度並研議提前甄選非營利法人之可行性，以降低未能如期開辦之風險，經函請國教署檢討辦理。據復：委託專案團隊協助工程進度落後園所追蹤工程施作情形，並督促市縣政府儘速辦理非營利法人甄選、簽約及前置籌備事宜；另規劃各學年度開辦幼兒園應至遲於開辦前 11 個月啟動法人甄選機制。

八、食品安全建設

政府為因應未來之挑戰及提升我國食品安全把關量能，於 106 年度起編列特別預算推動前瞻基礎建設計畫，將食品安全建設納於其中，期提升食品安全稽查、檢驗及研究量能，並由衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）推動辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫（下稱新建大樓工程案）、邊境查驗通關管理系統效能提升計畫、強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質、強化中央食安檢驗量能及提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化等 5 個子計畫，報經行政院於 109 年 9 月 9 日核定，計畫總經費 50 億 8,554 萬元，執行期程自 106 年 9 月至 114 年 8 月，分 5 期辦理。截至 109 年底止，前瞻第 1、2 期特別預算食品安全建設計畫共計編列預算 8 億 6,954 萬元（第 1 期 3 億 800 萬元；第 2 期 5 億 6,154 萬元），執行成果，包括：建置各港埠辦事處獨立機櫃及軟體、邊境查驗系統各港埠辦事處風險核判獨立運作功能擴充，以減輕邊境人員查驗負擔；補助 21 市縣衛生局購置檢驗所需儀器設備 442 套，及聘用檢驗人力 135 人，有助提升檢驗量能，及確保檢驗品質；購置 35 套檢驗儀器，並開發高精密、高靈敏及高通量之檢驗方法，以增加檢驗效率、擴增檢驗量能及縮短檢驗時間。經查食品安全建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一） 食藥署辦理強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫效益指標連續 3 年未達目標值，且未確實掌握各市縣衛生局一般例行性食品檢驗之年度規劃，允宜研謀檢討改善。

食藥署為落實食安五環政策，並推動聯合分工檢驗體系，於前瞻計畫規劃辦理強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫，總經費 10 億 7,128 萬元，由各市縣衛生局依據其檢驗需求提報計畫書，經食藥署審核後核定補助經費，期透過補助衛生局購置檢驗儀器設備、稽查車輛，及增聘檢驗人力，以擴大檢驗量能，提升檢驗效率與品質。食藥署為管控該計畫執行成效，列有聯合分工檢驗體系食品檢驗件數等 4 項效益指標，依據 106 至 109 年度各該年度前瞻計畫執行進度及績效報告顯示，一般例行性食品檢驗實際件數為 2 萬餘件至 6 萬餘件不等，除 106

年度達目標值外，107 至 109 年度均未達原訂之目標件數，且與目標件數之差距逐年擴大（表 47）。經查食藥署既將一般例行性食品檢驗件數列為計畫效益指

表 47 一般例行性食品檢驗件數

單位：件

年度 件數	106 (9-12 月)	107	108	109
目標值	21,000	65,000	66,700	67,500
實際值	21,818	63,674	63,668	64,408
差異件數	818	- 1,326	- 3,032	- 3,092

資料來源：整理自 106 至 109 年度各該年度前瞻計畫執行進度及績效報告。

標，惟僅研訂該指標總件數，逕由各市縣衛生局自行規劃其檢驗項目及件數，又尚未要求衛生局於計畫書列示完整之規劃項目與內容，致無從瞭解市縣衛生局預計辦理情形。鑑於該項指標係評估各地方政府辦理食品安全檢驗成效之一，食藥署卻未掌握其年度規劃，且未有其他相關管考作為，又該項指標年度目標檢驗件數與實際執行情形差距逐年擴大，亦未切實瞭解癥結原因，並研議相關改善措施，經函請食藥署檢討改善。據復：將要求地方衛生局依其規劃次一年度稽查抽驗件數，據以提報於計畫書中，以確實掌握一般例行性食品檢驗之預估檢驗件數，並加強審核計畫書及管考各地方衛生局實際執行狀況，以強化計畫執行成效。

（二）食藥署辦理昆陽大樓改建為動物中心與生物安全實驗室，尚須配合新建大樓工程案之執行進度，惟新建大樓執行進度落後，恐造成計畫後續無法如期辦理，允宜及早因應規劃。

食藥署考量實驗動物中心及高防護生物安全實驗室設置型態特殊，及所規劃新建大樓除包含常規實驗室，尚有辦公廳處所及教育訓練教室，為避免發生實驗影響，及辦公人員處於高風險之環境，爰未將生物安全實驗室設置於該新建大樓，而係將昆陽大樓整棟規劃改建為專業之動物中心與生物安全實驗室，以分層增設不同防護等級之生物安全實驗室、動物實驗室等，並據以於前瞻計畫之提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化計畫項下辦理，總經費 8 億 4,936 萬元，期程自 110 年 1 月至 114 年 8 月，分 3 期執行。經查該計畫可行性評估期中報告，昆陽大樓改建工程案規劃於前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算辦理，為持續辦理例行性檢驗工作，及不影響人員辦公，該改建工程係採三階段進行，其中第二階段工程尚須俟人員搬遷至新建大樓後，再進行昆陽大樓整修工

程，惟新建大樓工程案因歷經數次流標，尚未完成採購決標作業，執行進度已較預計落後 7 個月，且食藥署為增加廠商投標誘因，延長工期 180 個日曆天，致整體工程進度延宕約 1 年 1 個月，推估最快預計 114 年 8 月始能竣工，加以後續人員搬遷等作業亦需時數月，恐將影響昆陽大樓改建工程第二階段之進度，造成計畫後續無法如期辦理，經函請食藥署及早因應規劃，以利昆陽大樓改建工程順利進行。據復：將強化與新建大樓承辦窗口溝通聯繫，掌握新建大樓施工進度與期程，及早規劃相關搬遷作業，並審慎規劃各階段施工工序，彈性調度人員辦公場所，另針對施工階段各項前置作業訂定管控里程碑，且定期追蹤檢討，以利昆陽大樓改建工程順利進行。

九、人才培育促進就業建設

人力資源係經濟成長與國際競爭力之基礎，亦是國家永續發展之關鍵，政府著眼於未來 30 年國家發展所需，應投入更多經費於人才培育，爰將人才培育促進就業建設納入前瞻基礎建設計畫推動，以打造臺灣成為國際標竿創業聚落為核心，吸引國際人才來臺發展，促進我國青年創業、就業及國際產學研合作交流活動，協助創新創業生態系與國際接軌，實施期程自 106 至 113 年度，共計 8 個年度。前瞻第 1、2 期特別預算人才培育促進就業建設計畫共計編列預算 139 億 3,981 萬餘元（第 1 期 41 億 5,388 萬餘元；第 2 期 97 億 8,593 萬餘元），辦理優化技職校院實作環境計畫、推動國際產學聯盟計畫、青年科技創新創業基地建置計畫、重點產業高階人才培訓與就業計畫、年輕學者養成計畫、領袖學者助攻計畫等 6 大重點計畫，分由教育部、經濟部及科技部等 3 個主管機關執行。截至 109 年底止，部分計畫已完成，包括：補助跨域實作場域 91 案、成立產業菁英訓練基地 26 案及建置類產業環境工廠 19 案；成立 20 個國際產學聯盟，吸引國內外 230 家企業會員加入、產學投入及技術移轉金額 36 億元、培育人才 8,800 人次；打造創業旗艦基地，以 AI、軟體等科技領域為重點，吸引國內外 5 家知名加速器業者及協助 68 個團隊與企業完成實質商業合作，募資額達 47 億元；培養具國際聲望研究

團隊 22 個，產出論文 689 篇，刊登國外重要期刊 207 篇，產出專利 26 個等。經查人才培育促進就業建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一） 教育部補助技專校院辦理優化技職校院實作環境計畫，提升教師實務教學及學生實作能力，惟部分學校培育師生數未如預期或尚無產學合作案件，部分設備使用情形欠佳，有待檢討改善。

教育部為因應國內外新產業、新技術及前瞻建設所需技職人才，於前瞻第 1、2 期特別預算之人才培育促進就業建設項下，規劃辦理優化技職校院實作環境計畫，執行期程自 106 年 9 月 1 日至 110 年 8 月 31 日，補助技專校院購置教學實習設備，以培育國家重點產業所需之專業技術人才及跨領域人才，107 至 109 年度累計編列預算數（106 年度係盤整各校教學資源，無編列預算）27 億 5,013 萬元，累計執行數 26 億 2,210 萬餘元，執行率 95.34%。經查執行情形，核有下列事項：

1. 補助技專校院辦理優化技職校院實作環境計畫，對應 5+2 創新產業之補助案件已較往年提升，惟部分學校尚無產學合作案件或參與學生人次減少，有待檢討改善：依據優化技職校院實作環境計畫書載述，我國技職教育人才培育未能對焦政府推動之國家重點創新產業（包括亞洲矽谷、智慧機械、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業、循環經濟等 5+2 創新產業）；另產業界反映技術人力缺工嚴重，該計畫應培養缺工產業所需人才，技專校院並應就不同之就業職能予以區分；預計每年與國家重點產業之產學合作件數達 300 件，金額 9,000 萬元至 1 億 5,000 萬元，以帶動國家整體經濟動能。復據教育部優化技職校院實作環境計畫補助要點第 5 點規定略以，受補助計畫應與產業連結及合作。經查該計畫補助技專校院購置設備，與國家重點產業接軌，藉由產學合作計畫，強化學生實務能力，縮短學用落差，以培育專業技術人才。本部前查核該計畫 107 年度執行情形，核有教育部補助技專校院計 95 案（執行期程自 107 至 110 年度），其中對

應 5+2 創新產業者計 40 案，僅占全部補助案件之 42.11%，經函請該部加強補助 5+2 創新產業或缺工產業之計畫，以培育國家重點產業所需之專業技術人才。據復將考量產業人力需求及各校發展特色，加強培育各產業專業人才。經追蹤覆核結果，該部 108 及 109 年度另補助技專校院計 34 案，包括農業、機械、電子電機、管理、民生、設計及建築、工業及資訊、醫事、護理、其他等 10 項類別，其中對應 5+2 創新產業者共有農業、機械、電子電機、工業及資訊等 4 項類別，計 17 案

表 48 108 及 109 年度優化技職校院實作環境計畫補助案件對應 5+2 創新產業情形

單位：案

類別	合計	農業 (含生技、新農業)	機械 (含智慧機械、國防航太、軌道建設)	電子電機 (含循環經濟、綠能科技)	工業及資訊 (含亞洲矽谷、數位建設)
補助案件數	17	1	7	5	4

註：1. 非 5+2 創新產業計有：管理（1 案）、民生（4 案）、設計及建築（2 案）、醫事（2 案）、護理（4 案）、其他（4 案）等類別。

2. 資料來源：整理自教育部提供資料。

（表 48），占全部補助案件 34 案之比率 50%，較 107 年度之 42.11%，提升約 8 個百分點。復查 107 至 109 年度該計畫與國家重點產業之產學合作件數分別為 259 件、1,063 件、1,465 件，金額 1 億 4,873 萬餘元、7 億 9,722 萬餘元、8 億 4,398 萬餘元，108 及 109 年度整體產學合作件數及金額雖達預計目標，惟部分受補助學校連 2 年度未有產學合作案件，如台南應用科技大學鞋類與袋包實作場域計畫，未能達成計畫應與產業合作培育人才之目標。另上開 107 至 109 年度補助之 129 案於 109 年度產學合作案件培訓學生 11,179 人次，較 108 年度之 7,398 人次，增加 3,781 人次，惟其中 35 案參與學生人次減少，占 129 案之 27.13%，亟待檢討問題癥結並加強宣導，藉由產學合作強化學生實務能力，以培育國家重點產業人才，經函請教育部檢討及督促學校改進。據復：已於 110 年 5 月完成 109 年度補助計畫成果報告審查及實地訪視，將請學校檢討改善計畫執行缺失，並加強輔導，以協助計畫推動。

2. 補助學校購置設備並開設跨領域課程，以提升教師實務教學及學生實作能力，惟部分學校培育師生數未如預期，有待協助學校針對執行問題檢討改善，以發揮計畫效益：依據優化技職校院實作環境計畫書載述，我國產業變遷快速，教師實務能力未與時俱進，普遍與產業出現落差；課程偏重於學術導向，實作課程仍然不足，該計畫爰補助技專校院購置設備，並開設跨領域課程，以提升教師實務教學及學生（一般生及技優生）實作能力，並與產業接軌，預計每一補助案每年培育技優生 50 人，另補助 30 案每年培育種子教師 30 人，預計 107 至 110 年度培育一般生、技優生及種子教師分別為 43,200 人、20,000 人、3,600 人。經

表 49 107 至 109 年度優化技職校院實作環境計畫補助案件及培育師生人數

單位：案、人

計畫類別	補助案件	合計			主辦學校			夥伴學校		
		一般生	技優生	種子教師	一般生	技優生	種子教師	一般生	技優生	種子教師
合計	121	118,092	27,549	2,786	109,230	25,505	1,982	8,862	2,044	804
建置跨院系實作場域	91	79,579	16,609		79,579	16,609				
建置產業菁英訓練基地	11	25,607	6,519	1,644	20,292	5,529	1,233	5,315	990	411
培育類產業環境人才	19	12,906	4,421	1,142	9,359	3,367	749	3,547	1,054	393

註：1. 建置跨院系實作場域：學校應盤點既有教學設備，串連區域內學校相關科系資源，與法人機構、業界能量合作，對焦國家重點創新產業、在地產業重大發展計畫，提出跨領域計畫；建置產業菁英訓練基地：配合國家重點產業，由學校與法人共同成立區域性技術訓練基地，辦理師資培訓及培育專業技術人才；培育類產業環境人才：學校應盤點既有教學設備，建立產業界實作場域，規劃產業環境課程、促進師生與產業接軌。

2. 建置跨院系實作場域案件之主辦學校不須培育種子教師，夥伴學校毋須培育種子教師及學生。

3. 除上開 121 案外，尚有 8 案係補助學校建置 iPAS 基地，不屬於上開 3 類補助計畫類別。

4. 資料來源：整理自教育部提供資料。

查該計畫補助類型包括建置跨院系實作場域、建置產業菁英訓練基地、培育類產業環境人才等 3 類，獲補助學校 107 至 109 年度累計培育一般生、技優生及種子教師分別為 118,092 人、27,549 人、2,786 人（表 49）。經分析個別補助案件執行情形，109 年度主辦學校未培育一般生及技優生者，分別為 3 案及 8 案，夥伴學校（建置跨院系實作場域計畫之夥伴學校毋須培育學生）未培育一般生及技優生者，分別為 11 案及 13 案，主要係因設備較晚購置，未及開設相關課程。另該部 109

年度補助 37 案培育種子教師，主辦學校及夥伴學校分別培育種子教師為 1,111 人及 407 人，各案培育人數介於 2 人至 364 人間，其中培育人數少於 30 人者計 18 案，占 37 案之 48.65%，未達每案每年培育種子教師 30 人之目標。又據該部 109 年度訪視獲補助學校意見載述，部分學校未整合校內相關科系資源並開設跨領域課程，應擴大參與計畫之科系及學生；部分補助案設備尚未建置，致未開設相關課程；未積極招收技優生，並開設相關課程。綜上，該計畫旨在培育產業所需人才，惟部分學校未積極培育學生，近 5 成學校培育種子教師人數未達預計目標，執行成效仍待提升，經函請教育部檢討及協助學校改善。據復：有關部分學校培育學生數未如預期，已促請學校改善；將調查主辦及夥伴學校種子教師培訓現況，如課程內容未符合教師進修需求，將引導學校與企業合作，開設符合產業與學校實務需求之課程，以提升培育能量。

3. 已建置教學設備共享平臺，推動設備共享機制，惟上傳平臺之設備項數比率偏低，且借用學校數仍少，尚待督促學校加強運用設備，並上傳共享平臺供外界使用，俾發揮設備效益：按優化技職校院實作環境計畫書載述，該計畫規劃建置教學設備共享平臺，由學校盤點共享設備，並公開至平臺，以有效推廣共享機制，使區域內師生均能使用設備，降低重複購置成本，並可減少維運費用，達到設備使用率最佳化。教育部爰於 107 年 6 月 29 日委託社團法人臺灣評鑑協會建置優化技職校院實作環境教學設備共享平臺，推廣設備共享機制。經查該部補助學校辦理上開計畫，自 106 至 109 年度購置設備共 4,224 項，總計 14,114 單位（個、套、組……等），採購金額 18 億 5,111 萬餘元，惟上傳設備資訊至該平臺者，共有 65 校計 765 項，占獲補助校數（76 校）及設備項數（4,224 項）之 85.53% 及 18.11%；其中尚無學校及外部單位（如政府機關、企業）借用紀錄者計 538 項，另使用該平臺借用設備之學校數僅 15 校。據該部 109 年度訪視獲補助學校意見載述，部分學校購置之設備使用率偏低，或僅供主辦學校科系（計畫執行單位）

學生使用，或學校未運用設備於產學合作案，或設備資訊未上傳至該平臺提供其他單位借用等。綜上，該計畫補助技專校院購置教學設備，已有超過 8 成學校上傳設備資訊供外界借用，惟上傳設備項數比率未及 2 成，僅少數學校借用設備，尚待督促學校結合課程以充分運用設備，並上傳資訊至共享平臺供外界使用，俾發揮設備效益，經函請教育部檢討及督促學校改進。據復：將督促各校將設備資訊上傳至該平臺，供外界查詢及租借，並促請學校充分運用設備。

(二) 教育部國民及學前教育署補助技術型高級中等學校優化實作環境，惟間有學校尚未補足部定必修科目所需設備、補助項目不符補助原則及引進產業捐贈教學資源未達預期目標等情，允宜研謀改善。

教育部國民及學前教育署（下稱國教署）為充裕技術型高級中等學校（下稱技術型高中）教學場域，配合國家產業發展培育技職人才，運用前瞻第 1、2 期特別預算人才培育促進就業建設經費 37 億 8,529 萬餘元，補助技術型高中充實基礎教學實習設備、改善實習教學環境與設施、發展務實致用課程所需設備、引進產業捐贈教學資源等。經查執行情形，核有：1. 國教署為補足十二年國民基本教育課程綱要技術型高中設備基準部定必修實習科目所需設備，補助技術型高中充實基礎教學實習設備，依其申請及審查作業流程，該署透過比對各校現有設備與設備基準之差異，核定各校設備項目表，並召開會議討論後核定補助經費，由各校依核定設備項目表所列之項目、單價及數量為限進行購置。按國教署核定設備項目表之需求類型為「新購」者，應為學校不足之設備清單，惟該署 107 至 109 年度核定資本門金額，均未及核定新購設備所需金額之 2 成（表 50），各校無法足額採購所需設備，須於核定設備項

表 50 國教署核定補助技術型高中充實基礎教學實習設備情形

單位：新臺幣千元、%

年度	核定資本門 金額 (A)	核定新購設備 所需金額 (B) (註1)	占比 (A/B×100)
107	806,399	5,789,883	13.93
108	1,114,026	5,690,209	19.58
109	1,014,350	5,707,210	17.77

註：1. 核定新購設備所需金額係以設備項目之核定單價乘以核定數量計算。

2. 資料來源：整理自國教署提供資料。


目及數量內，自行調整優先採購順序，間有部分群科優先購置校訂科目設備，尚有部定必修科目所需設備未購置，允宜盤點設備需求並妥適資源配置，以提升技職教育教學品質；2. 國教署為養成學生多元及跨領域能力，鼓勵學校依據國家重點創新產業規劃選修課程，補助學校發展校本專業、實習多元選修、跨域專題製作及特色課程所需之教學設備。依優化實作環境計畫需求及成果填報說明會簡報，學校發展校訂課程所需設備單價須達 1 萬元以上，惟經檢視該署 108 及 109 年度核定設備項目表，仍有單價未及 1 萬元之設備，核與上開補助原則未合，允宜研議輔以資訊系統排除不予補助項目，以提升審查效率；3. 國教署為促進產學合作交流，補助高級中等學校搬遷安置整備費用，鼓勵產業捐贈教學設備，提高產業主動參與人才培育之誘因，並透過業界捐贈之儀器設備，縮短教學實作設備與業界之落差。執行結果，107 至 109 年度分別獲贈 13 件、8 件、6 件，每年均未達預計目標（20 件）且逐年下降，允宜賡續輔導學校引進產業捐贈教學資源，以落實學校教學環境接軌產業現況等情事，經函請國教署檢討改善。據復：1. 未來於審查階段將部定必修科目所需設備列為優先補助項目，以利培育基層技術人才，進而提升技職教育教學品質；2. 將於審查作業時，提供審查委員各群科設備清單參閱並於系統檢核單價，以避免核定設備單價未及 1 萬元之情形；3. 已請學校辦理實習媒合時加強與產業互動，提供該計畫補助要點予廠商參考，亦將持續輔導學校改善。

（三） 科技部推動人才培育促進就業建設計畫，促進科研人才之培育與就業，惟部分計畫賸餘經費數額多，或未編列後續經費及未追蹤研發能量提升情形，亟待強化經費控管與人才媒合機制，俾提升計畫執行成效。

科技部為促進科研人才之培育與就業，配合前瞻計畫-人才培育促進就業建設，於前瞻第 1、2 期特別預算編列經費 44 億 1,766 萬餘元（第 1 期特別預算 9

億元，第 2 期特別預算 35 億 1,766 萬餘元)，參照國際標竿作法，辦理年輕學者養成計畫、領袖學者助攻計畫及重點產業高階人才培訓與就業計畫。經查執行情形，核有：1. 年輕學者養成計畫於前瞻第 2 期（108 至 109 年度）特別預算編列經費 22 億 9,550 萬餘元支應，提供年輕研究人才每年 500 萬元至 1,000 萬元之研究經費，以長期且充分之資源，培植科研新世代，期改善我國大專校院教師之年齡結構高齡化及科研世代斷層情形，執行結果，實支數 21 億 688 萬餘元，經費賸餘 1 億 8,861 萬餘元，約 8.22%，據說明主要係計畫申請案經委員審核，依需求之必要性核給經費，未足額核列經費所致。又 107 至 109 年度計核定研究計畫 249 件，於計畫通過前未具計畫主持人資格者有 93 件，1 年覓職期過後，未獲聘任職，致取消資格者 9 件，約 9.68%；另計畫執行期間因移民、個人因素等，主動終止計畫者 3 件，亟待研謀強化經費控管與人才媒合機制，俾提升計畫執行成效；2. 領袖學者助攻計畫於前瞻第 2 期特別預算編列經費 4 億 4,216 萬餘元支應，提供 45 歲（含）以下或曾獲國際殊榮之學者每年 500 萬元至 1,500 萬元之研究經費，期建構完整之系統性學術攻頂職涯發展路徑（圖 9），公告徵求補助研究計畫，以執行期間 3 至 5 年為原則，補助計畫類型分為突破研究型及輔導規劃型，茲因於 108 年間獲悉 110 年度已無前瞻第 3 期特別預算經費支應，經核定突破研究型計畫 12 件、輔導規劃型計畫 10 件，核定經費 3 億 9,272 萬餘元，均為 2 年期，且後續不再辦理，亟待檢討妥為規劃後續銜接機制，建構完整之學術攻頂發展路徑，以提升計畫執行成效；3. 重點產業高階人才培訓與就

圖 9 學術攻頂職涯發展路徑



資料來源：摘錄自領袖學者助攻計畫書。

業計畫於前瞻第 1、2 期特別預算合計編列計畫經費 11 億 8,000 萬元，規劃培訓 1,000 名博士級人才，透過法人及大學校院作為培訓單位，連結合作廠商提供實習機會，協助媒合至少三分之二博士級人才成功就業或創業，並補助每名博士級人才每月 6 萬元培訓酬金，提供初期優先進用博士級人才之誘因，引導博士級人才投入產業界。截至 109 年底止，法人及大專校院已與 638 家公司合作培育 1,173 位博士級人才，1 年期培訓結束後，其中 934 位博士至產業界就業，平均就業率 79.6%，已達計畫目標，惟查合作公司中，計有 35 家公司連續 3 年均獲補助，其中正○生技（股）公司及中○光電（股）公司分別獲補助 24 人次及 16 人次，與計畫提供廠商聘用博士級人才初期誘因之意旨未盡相合，且未追蹤合作廠商研發能量提升情形，亟待檢討擇選合作廠商之條件及機制，並盤點計畫執行之具體效益等情事，經通知科技部研謀改善，俾促進科研人才之培育與就業，強化產業界研究發展能量。據復：1. 針對未任職身分獲通過計畫者，透過諮詢輔導及強化資訊流通方式，協助加速獲聘期程，110 年度將著重計畫成果之評估與管理，並強化經費控管，提供計畫所需之研究資源，以提升整體執行成效；2. 已依科研人才各職涯階段特性，重新檢討厚實中堅階段之各項補助計畫，除擴大既有計畫規模外，另規劃辦理「中堅躍升研究計畫」及「人文及社會科學卓越計畫」，期透過縝密布局厚實中堅人才，引領我國科研能力再向上進階；3. 將調整為策略性補助，朝向協助中小企業技術升級、平衡區域資源投入、重視技術領域多元發展等方向精進，並持續追蹤合作廠商研發能量提升情形，優化擇選合作廠商之條件及機制。

本部對於上列各項重要審核意見聲復結果及改進措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

乙、最終審

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審
			金 額
一、歲 入 合 計	—	458,971,657	546,903,441
（一）罰 款 及 賠 償 收 入	—	99,044,942	99,044,942
（二）財 產 收 入	—	270,779,187	358,710,971
（三）其 他 收 入	—	89,147,528	89,147,528
二、歲 出 合 計	222,954,054,000	216,304,568,089	216,304,568,089
（一）一 般 政 務 支 出	9,236,131,000	9,171,526,190	9,171,526,190
（二）教 育 科 學 文 化 支 出	57,185,644,000	55,741,947,485	55,741,947,485
（三）經 濟 發 展 支 出	135,182,142,000	131,088,258,846	131,088,258,846
（四）社 會 福 利 支 出	7,363,485,000	6,796,403,303	6,796,403,303
（五）社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	13,986,652,000	13,506,432,265	13,506,432,265
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 222,954,054,000	- 215,845,596,432	- 215,757,664,648

定數額表

特別決算歲入歲出決算審定數簡明比較表

至 109 年度

單位：新臺幣元

定 數	決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%
占 總 數 %				
100.00	546,903,441	--	87,931,784	19.16
18.11	99,044,942	--	—	—
65.59	358,710,971	--	87,931,784	32.47
16.30	89,147,528	--	—	—
100.00	- 6,649,485,911	- 2.98	—	—
4.24	- 64,604,810	- 0.70	—	—
25.77	- 1,443,696,515	- 2.52	—	—
60.60	- 4,093,883,154	- 3.03	—	—
3.14	- 567,081,697	- 7.70	—	—
6.24	- 480,219,735	- 3.43	—	—
100.00	7,196,389,352	- 3.23	87,931,784	- 0.04

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

項 目	預 算 數		決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、收 入 合 計	222,954,054,000	100.00	216,304,568,089	100.00
(一)歲 入	—	—	458,971,657	0.21
(二)債 務 之 舉 借	222,954,054,000	100.00	215,845,596,432	99.79
二、支 出 合 計	222,954,054,000	100.00	216,304,568,089	100.00
歲 出	222,954,054,000	100.00	216,304,568,089	100.00

特別決算審定後收支簡明比較分析表

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與	
金 額	%	金 額	增 減
216,304,568,089	100.00	- 6,649,485,911	- 2.98
546,903,441	0.25	546,903,441	--
215,757,664,648	99.75	- 7,196,389,352	- 3.23
216,304,568,089	100.00	- 6,649,485,911	- 2.98
216,304,568,089	100.00	- 6,649,485,911	- 2.98

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算融資調度決算審定表

中華民國 108 年度至 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數			決 算 審 定 數 與 預算數比較增減	
			實 現 數	保 留 數	合 計	金 額	%
債務之舉借	222,954,054,000	215,845,596,432	159,450,136,087	56,307,528,561	215,757,664,648	- 7,196,389,352	- 3.23

註：行政院原列決算數經本部修正減列 87,931,784 元。

丙、平衡表之查核

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算平衡表原列 109 年 12 月 31 日之資產 60,516,449,842 元、負債 12,133,289,918 元及淨資產 48,383,159,924 元，茲將行政院原列平衡表科目及金額說明如次：

一、資產類

(一) 流動資產：包括應收款項 229,676,624 元，預付款 4,590,590,362 元，預付其他基金款 764,523,725 元，預付其他政府款 16,001,495,861 元，合計 21,586,286,572 元，占 35.67%。

(二) 長期投資：包括採權益法之投資 8,846,153,070 元，其他長期投資 4,370,952,894 元，合計 13,217,105,964 元，占 21.84%。

(三) 固定資產：包括土地 42,496,806 元，土地改良物 1,859,572,440 元，房屋建築及設備 18,673,293 元，機械及設備 602,662,005 元，交通及運輸設備 4,837,218 元，雜項設備 54,967,351 元，購建中固定資產 22,911,741,014 元，合計 25,494,950,127 元，占 42.13%。

(四) 無形資產 218,107,179 元，占 0.36%。

二、負債類：包括應付款項 2,003,610,497 元，應付其他基金款 625,116,811 元，應付其他政府款 9,504,562,610 元，合計 12,133,289,918 元，占 20.05%。

三、淨資產類：資產減除負債後餘額之淨資產 48,383,159,924 元，占 79.95%。

經審核修正增列歲入應收數 87,931,784 元，減列歲出實現數 1,064,898,426 元，及減少長期投資之評價調整 18,150,627 元，決算審定後之資產總額 61,651,129,425 元，負債總額 12,303,420,666 元，淨資產總額 49,347,708,759 元。茲列表如次：

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算平衡表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	金 額		貸 方 科 目	金 額	
	小 計	合 計		小 計	合 計
資 產 部 分			負 債 部 分		
流動資產		21,586,286,572	流動負債		12,133,289,918
應收款項	229,676,624		應付款項	2,003,610,497	
預付款	4,590,590,362		應付其他基金款	625,116,811	
預付其他基金款	764,523,725		應付其他政府款	9,504,562,610	
預付其他政府款	16,001,495,861				
長期投資		13,217,105,964			
採權益法之投資	8,846,153,070				
其他長期投資	4,370,952,894				
固定資產		25,494,950,127			
土地	42,496,806				
土地改良物	1,859,572,440				
房屋建築及設備	18,673,293				
機械及設備	602,662,005				
交通及運輸設備	4,837,218				
雜項設備	54,967,351				
建購中固定資產	22,911,741,014				
無形資產		218,107,179			
無形資產	218,107,179				

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算平衡表（續）

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	金 額		貸 方 科 目	金 額	
	小 計	合 計		小 計	合 計
原 列 資 產 總 額		60,516,449,842	原 列 負 債 總 額		12,133,289,918
			本部審核修正決算應調整數		170,130,748
			減 列 歲 出 實 現 數	170,130,748	
			調 整 後 負 債 總 額		12,303,420,666
本部審核修正決算應調整數		1,134,679,583	淨 資 產 部 分		
增 列 歲 入 應 收 數	87,931,784		淨 資 產	48,383,159,924	
減 列 歲 出 實 現 數	1,064,898,426		原 列 淨 資 產 總 額		48,383,159,924
減少長期投資之評價調整	-18,150,627		本部審核修正決算應調整數		964,548,835
			增 列 歲 入 應 調 整 數	87,931,784	
			減 列 歲 出 實 現 數	894,767,678	
			減少長期投資之評價調整	- 18,150,627	
			調 整 後 淨 資 產 總 額		49,347,708,759
調 整 後 資 產 總 額		61,651,129,425	調 整 後 負 債 及 淨 資 產 總 額		61,651,129,425

註：依中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算平衡表備註：本特別決算之應付債務及中長期借款金額，已併同 109 年度中央政府總決算部分表達於總決算平衡表各該科目內。

丁、其他

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期

中華民國108年度

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
1			總 計	—	458,971,657	—	—	458,971,657
			罰 款 及 賠 償 收 入	—	99,044,942	—	—	99,044,942
	1		國 家 發 展 委 員 會	—	54,414	—	—	54,414
		1	賠 償 收 入	—	54,414	—	—	54,414
			一般賠償收入	—	54,414	—	—	54,414
	2		國 家 通 訊 傳 播 委 員 會	—	1,056	—	—	1,056
		1	賠 償 收 入	—	1,056	—	—	1,056
			一般賠償收入	—	1,056	—	—	1,056
	3		內 政 部	—	5,057,044	—	—	5,057,044
		1	賠 償 收 入	—	5,057,044	—	—	5,057,044
			一般賠償收入	—	5,057,044	—	—	5,057,044
	4		警 政 署 及 所 屬	—	2,634,347	—	—	2,634,347
		1	賠 償 收 入	—	2,634,347	—	—	2,634,347
			一般賠償收入	—	2,634,347	—	—	2,634,347
	5		消 防 署 及 所 屬	—	28,075,607	—	—	28,075,607
		1	賠 償 收 入	—	28,075,607	—	—	28,075,607
			一般賠償收入	—	28,075,607	—	—	28,075,607
	6		財 政 資 訊 中 心	—	500,997	—	—	500,997
		1	賠 償 收 入	—	500,997	—	—	500,997
			一般賠償收入	—	500,997	—	—	500,997
	7		國 民 及 學 前 教 育 署	—	502,410	—	—	502,410
		1	賠 償 收 入	—	502,410	—	—	502,410
			一般賠償收入	—	502,410	—	—	502,410
	8		經 濟 部	—	1,624,096	—	—	1,624,096
		1	賠 償 收 入	—	1,624,096	—	—	1,624,096
			一般賠償收入	—	1,624,096	—	—	1,624,096
	9		工 業 局	—	3,060,144	—	—	3,060,144
		1	賠 償 收 入	—	3,060,144	—	—	3,060,144
			一般賠償收入	—	3,060,144	—	—	3,060,144
	10		水 利 署 及 所 屬	—	8,615,852	—	—	8,615,852

附表

特別決算歲入來源別決算審定表

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
458,971,657	87,931,784	—	546,903,441	100.00	546,903,441	--	87,931,784	19.16
99,044,942	—	—	99,044,942	18.11	99,044,942	--	—	—
54,414	—	—	54,414	0.01	54,414	--	—	—
54,414	—	—	54,414	0.01	54,414	--	—	—
54,414	—	—	54,414	0.01	54,414	--	—	—
1,056	—	—	1,056	0.00	1,056	--	—	—
1,056	—	—	1,056	0.00	1,056	--	—	—
1,056	—	—	1,056	0.00	1,056	--	—	—
5,057,044	—	—	5,057,044	0.92	5,057,044	--	—	—
5,057,044	—	—	5,057,044	0.92	5,057,044	--	—	—
5,057,044	—	—	5,057,044	0.92	5,057,044	--	—	—
2,634,347	—	—	2,634,347	0.48	2,634,347	--	—	—
2,634,347	—	—	2,634,347	0.48	2,634,347	--	—	—
2,634,347	—	—	2,634,347	0.48	2,634,347	--	—	—
28,075,607	—	—	28,075,607	5.13	28,075,607	--	—	—
28,075,607	—	—	28,075,607	5.13	28,075,607	--	—	—
28,075,607	—	—	28,075,607	5.13	28,075,607	--	—	—
500,997	—	—	500,997	0.09	500,997	--	—	—
500,997	—	—	500,997	0.09	500,997	--	—	—
500,997	—	—	500,997	0.09	500,997	--	—	—
502,410	—	—	502,410	0.09	502,410	--	—	—
502,410	—	—	502,410	0.09	502,410	--	—	—
502,410	—	—	502,410	0.09	502,410	--	—	—
1,624,096	—	—	1,624,096	0.30	1,624,096	--	—	—
1,624,096	—	—	1,624,096	0.30	1,624,096	--	—	—
1,624,096	—	—	1,624,096	0.30	1,624,096	--	—	—
3,060,144	—	—	3,060,144	0.56	3,060,144	--	—	—
3,060,144	—	—	3,060,144	0.56	3,060,144	--	—	—
3,060,144	—	—	3,060,144	0.56	3,060,144	--	—	—
8,615,852	—	—	8,615,852	1.58	8,615,852	--	—	—

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
1	10	1		賠 償 收 入	—	8,615,852	—	—	8,615,852
			1	一般賠償收入	—	8,615,852	—	—	8,615,852
	11			中 小 企 業 處	—	858,632	—	—	858,632
		1		賠 償 收 入	—	858,632	—	—	858,632
			1	一般賠償收入	—	858,632	—	—	858,632
	12			加工出口區管理處及所屬	—	591,500	—	—	591,500
		1		罰金罰鍰及怠金	—	591,500	—	—	591,500
			1	罰 金 罰 鍰	—	591,500	—	—	591,500
	13			能 源 局	—	3,890,025	—	—	3,890,025
		1		賠 償 收 入	—	3,890,025	—	—	3,890,025
			1	一般賠償收入	—	3,890,025	—	—	3,890,025
	14			觀 光 局 及 所 屬	—	16,688	—	—	16,688
		1		賠 償 收 入	—	16,688	—	—	16,688
			1	一般賠償收入	—	16,688	—	—	16,688
	15			公 路 總 局 及 所 屬	—	20,589,770	—	—	20,589,770
		1		賠 償 收 入	—	20,589,770	—	—	20,589,770
			1	一般賠償收入	—	20,589,770	—	—	20,589,770
	16			鐵 道 局 及 所 屬	—	10,572,376	—	—	10,572,376
		1		賠 償 收 入	—	10,572,376	—	—	10,572,376
			1	一般賠償收入	—	10,572,376	—	—	10,572,376
	17			核 能 研 究 所	—	1,114,022	—	—	1,114,022
		1		賠 償 收 入	—	1,114,022	—	—	1,114,022
			1	一般賠償收入	—	1,114,022	—	—	1,114,022
	18			衛 生 福 利 部	—	2,132,225	—	—	2,132,225
		1		賠 償 收 入	—	2,132,225	—	—	2,132,225
			1	一般賠償收入	—	2,132,225	—	—	2,132,225
	19			食 品 藥 物 管 理 署	—	75,274	—	—	75,274
		1		賠 償 收 入	—	75,274	—	—	75,274
			1	一般賠償收入	—	75,274	—	—	75,274
	20			國 民 健 康 署	—	949,485	—	—	949,485

特別決算歲入來源別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
8,615,852	—	—	8,615,852	1.58	8,615,852	--	—	—
8,615,852	—	—	8,615,852	1.58	8,615,852	--	—	—
858,632	—	—	858,632	0.16	858,632	--	—	—
858,632	—	—	858,632	0.16	858,632	--	—	—
858,632	—	—	858,632	0.16	858,632	--	—	—
591,500	—	—	591,500	0.11	591,500	--	—	—
591,500	—	—	591,500	0.11	591,500	--	—	—
591,500	—	—	591,500	0.11	591,500	--	—	—
3,890,025	—	—	3,890,025	0.71	3,890,025	--	—	—
3,890,025	—	—	3,890,025	0.71	3,890,025	--	—	—
3,890,025	—	—	3,890,025	0.71	3,890,025	--	—	—
16,688	—	—	16,688	0.00	16,688	--	—	—
16,688	—	—	16,688	0.00	16,688	--	—	—
16,688	—	—	16,688	0.00	16,688	--	—	—
20,589,770	—	—	20,589,770	3.76	20,589,770	--	—	—
20,589,770	—	—	20,589,770	3.76	20,589,770	--	—	—
20,589,770	—	—	20,589,770	3.76	20,589,770	--	—	—
10,572,376	—	—	10,572,376	1.93	10,572,376	--	—	—
10,572,376	—	—	10,572,376	1.93	10,572,376	--	—	—
10,572,376	—	—	10,572,376	1.93	10,572,376	--	—	—
1,114,022	—	—	1,114,022	0.20	1,114,022	--	—	—
1,114,022	—	—	1,114,022	0.20	1,114,022	--	—	—
1,114,022	—	—	1,114,022	0.20	1,114,022	--	—	—
2,132,225	—	—	2,132,225	0.39	2,132,225	--	—	—
2,132,225	—	—	2,132,225	0.39	2,132,225	--	—	—
2,132,225	—	—	2,132,225	0.39	2,132,225	--	—	—
75,274	—	—	75,274	0.01	75,274	--	—	—
75,274	—	—	75,274	0.01	75,274	--	—	—
75,274	—	—	75,274	0.01	75,274	--	—	—
949,485	—	—	949,485	0.17	949,485	--	—	—

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
1	20	1		賠 償 收 入	—	949,485	—	—	949,485
			1	一般賠償收入	—	949,485	—	—	949,485
	21			環 境 保 護 署	—	1,746,150	—	—	1,746,150
		1		賠 償 收 入	—	1,746,150	—	—	1,746,150
			1	一般賠償收入	—	1,746,150	—	—	1,746,150
	22			科 技 部	—	611,186	—	—	611,186
		1		賠 償 收 入	—	611,186	—	—	611,186
			1	一般賠償收入	—	611,186	—	—	611,186
	23			中部科學工業園區管理局 (中部科學園區管理局)	—	5,429,450	—	—	5,429,450
		1		賠 償 收 入	—	5,429,450	—	—	5,429,450
			1	一般賠償收入	—	5,429,450	—	—	5,429,450
	24			南部科學工業園區管理局 (南部科學園區管理局)	—	342,192	—	—	342,192
		1		賠 償 收 入	—	342,192	—	—	342,192
			1	一般賠償收入	—	342,192	—	—	342,192
2				財 產 收 入	—	270,779,187	—	—	270,779,187
	1			國家通訊傳播委員會	—	67,031	—	—	67,031
		1		財 產 孳 息	—	67,031	—	—	67,031
			1	利 息 收 入	—	67,031	—	—	67,031
	2			內 政 部	—	52,196	—	—	52,196
		1		廢舊物資售價	—	52,196	—	—	52,196
	3			營建署及所屬	—	—	—	—	—
		1		廢舊物資售價	—	—	—	—	—
	4			警政署及所屬	—	4,250	—	—	4,250
		1		廢舊物資售價	—	4,250	—	—	4,250
	5			工 業 局	—	39,030,847	—	—	39,030,847
		1		財 產 孳 息	—	725,049	—	—	725,049
			1	利 息 收 入	—	725,049	—	—	725,049
		2		廢舊物資售價	—	38,305,798	—	—	38,305,798
	6			水利署及所屬	—	12,962,340	—	—	12,962,340
		1		財 產 售 價	—	12,962,340	—	—	12,962,340

特別決算歲入來源別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
949,485	—	—	949,485	0.17	949,485	--	—	—
949,485	—	—	949,485	0.17	949,485	--	—	—
1,746,150	—	—	1,746,150	0.32	1,746,150	--	—	—
1,746,150	—	—	1,746,150	0.32	1,746,150	--	—	—
1,746,150	—	—	1,746,150	0.32	1,746,150	--	—	—
611,186	—	—	611,186	0.11	611,186	--	—	—
611,186	—	—	611,186	0.11	611,186	--	—	—
611,186	—	—	611,186	0.11	611,186	--	—	—
5,429,450	—	—	5,429,450	0.99	5,429,450	--	—	—
5,429,450	—	—	5,429,450	0.99	5,429,450	--	—	—
5,429,450	—	—	5,429,450	0.99	5,429,450	--	—	—
342,192	—	—	342,192	0.06	342,192	--	—	—
342,192	—	—	342,192	0.06	342,192	--	—	—
342,192	—	—	342,192	0.06	342,192	--	—	—
270,779,187	87,931,784	—	358,710,971	65.59	358,710,971	--	87,931,784	32.47
67,031	—	—	67,031	0.01	67,031	--	—	—
67,031	—	—	67,031	0.01	67,031	--	—	—
67,031	—	—	67,031	0.01	67,031	--	—	—
52,196	—	—	52,196	0.01	52,196	--	—	—
52,196	—	—	52,196	0.01	52,196	--	—	—
—	87,931,784	—	87,931,784	16.08	87,931,784	--	87,931,784	--
—	87,931,784	—	87,931,784	16.08	87,931,784	--	87,931,784	--
4,250	—	—	4,250	0.00	4,250	--	—	—
4,250	—	—	4,250	0.00	4,250	--	—	—
39,030,847	—	—	39,030,847	7.14	39,030,847	--	—	—
725,049	—	—	725,049	0.13	725,049	--	—	—
725,049	—	—	725,049	0.13	725,049	--	—	—
38,305,798	—	—	38,305,798	7.00	38,305,798	--	—	—
12,962,340	—	—	12,962,340	2.37	12,962,340	--	—	—
12,962,340	—	—	12,962,340	2.37	12,962,340	--	—	—

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
2	6	1	1	動 產 售 價	—	12,962,340	—	—	12,962,340
	7			中 小 企 業 處	—	968,177	—	—	968,177
			1	財 產 孳 息	—	968,177	—	—	968,177
			1	利 息 收 入	—	968,177	—	—	968,177
	8			加工出口區管理處及所屬	—	5,373,402	—	—	5,373,402
			1	廢 舊 物 資 售 價	—	5,373,402	—	—	5,373,402
	9			能 源 局	—	6,415,057	—	—	6,415,057
			1	財 產 孳 息	—	6,415,057	—	—	6,415,057
			1	租 金 收 入	—	6,415,057	—	—	6,415,057
	10			公路總局及所屬	—	205,683,691	—	—	205,683,691
			1	廢 舊 物 資 售 價	—	205,683,691	—	—	205,683,691
	11			鐵 道 局 及 所 屬	—	1,879	—	—	1,879
			1	財 產 孳 息	—	1,879	—	—	1,879
			1	利 息 收 入	—	1,879	—	—	1,879
	12			國 民 健 康 署	—	9,491	—	—	9,491
			1	廢 舊 物 資 售 價	—	9,491	—	—	9,491
	13			科 技 部	—	189,314	—	—	189,314
			1	財 產 孳 息	—	189,314	—	—	189,314
			1	利 息 收 入	—	189,314	—	—	189,314
	14			中部科學工業園區管理局 (中部科學園區管理局)	—	13,343	—	—	13,343
			1	財 產 孳 息	—	13,343	—	—	13,343
			1	利 息 收 入	—	13,343	—	—	13,343
	15			南部科學工業園區管理局 (南部科學園區管理局)	—	8,169	—	—	8,169
			1	財 產 孳 息	—	8,169	—	—	8,169
			1	租 金 收 入	—	8,169	—	—	8,169
3				其 他 收 入	—	89,147,528	—	—	89,147,528
	1			內 政 部	—	326,539	—	—	326,539
			1	雜 項 收 入	—	326,539	—	—	326,539
			1	收回以前年度歲出	—	326,539	—	—	326,539
	2			警 政 署 及 所 屬	—	165,595	—	—	165,595

特別決算歲入來源別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
12,962,340	—	—	12,962,340	2.37	12,962,340	--	—	—
968,177	—	—	968,177	0.18	968,177	--	—	—
968,177	—	—	968,177	0.18	968,177	--	—	—
968,177	—	—	968,177	0.18	968,177	--	—	—
5,373,402	—	—	5,373,402	0.98	5,373,402	--	—	—
5,373,402	—	—	5,373,402	0.98	5,373,402	--	—	—
6,415,057	—	—	6,415,057	1.17	6,415,057	--	—	—
6,415,057	—	—	6,415,057	1.17	6,415,057	--	—	—
6,415,057	—	—	6,415,057	1.17	6,415,057	--	—	—
205,683,691	—	—	205,683,691	37.61	205,683,691	--	—	—
205,683,691	—	—	205,683,691	37.61	205,683,691	--	—	—
1,879	—	—	1,879	0.00	1,879	--	—	—
1,879	—	—	1,879	0.00	1,879	--	—	—
1,879	—	—	1,879	0.00	1,879	--	—	—
9,491	—	—	9,491	0.00	9,491	--	—	—
9,491	—	—	9,491	0.00	9,491	--	—	—
189,314	—	—	189,314	0.03	189,314	--	—	—
189,314	—	—	189,314	0.03	189,314	--	—	—
189,314	—	—	189,314	0.03	189,314	--	—	—
13,343	—	—	13,343	0.00	13,343	--	—	—
13,343	—	—	13,343	0.00	13,343	--	—	—
13,343	—	—	13,343	0.00	13,343	--	—	—
8,169	—	—	8,169	0.00	8,169	--	—	—
8,169	—	—	8,169	0.00	8,169	--	—	—
8,169	—	—	8,169	0.00	8,169	--	—	—
89,147,528	—	—	89,147,528	16.30	89,147,528	--	—	—
326,539	—	—	326,539	0.06	326,539	--	—	—
326,539	—	—	326,539	0.06	326,539	--	—	—
326,539	—	—	326,539	0.06	326,539	--	—	—
165,595	—	—	165,595	0.03	165,595	--	—	—

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期

中華民國108年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
3	2	1		雜 項 收 入	—	165,595	—	—	165,595
			1	收回以前年度歲出	—	165,595	—	—	165,595
	3			工 業 局	—	16,389,717	—	—	16,389,717
		1		雜 項 收 入	—	16,389,717	—	—	16,389,717
			1	其他雜項收入	—	16,389,717	—	—	16,389,717
	4			水 利 署 及 所 屬	—	26,455,919	—	—	26,455,919
		1		雜 項 收 入	—	26,455,919	—	—	26,455,919
			1	其他雜項收入	—	26,455,919	—	—	26,455,919
	5			能 源 局	—	11,594,906	—	—	11,594,906
		1		雜 項 收 入	—	11,594,906	—	—	11,594,906
			1	收回以前年度歲出	—	3,708,034	—	—	3,708,034
			2	其他雜項收入	—	7,886,872	—	—	7,886,872
	6			公 路 總 局 及 所 屬	—	20,566,346	—	—	20,566,346
		1		雜 項 收 入	—	20,566,346	—	—	20,566,346
			1	收回以前年度歲出	—	20,249,080	—	—	20,249,080
			2	其他雜項收入	—	317,266	—	—	317,266
	7			衛 生 福 利 部	—	11,942	—	—	11,942
		1		雜 項 收 入	—	11,942	—	—	11,942
			1	其他雜項收入	—	11,942	—	—	11,942
	8			環 境 保 護 署	—	183,323	—	—	183,323
		1		雜 項 收 入	—	183,323	—	—	183,323
			1	其他雜項收入	—	183,323	—	—	183,323
	9			科 技 部	—	10,000	—	—	10,000
		1		雜 項 收 入	—	10,000	—	—	10,000
			1	其他雜項收入	—	10,000	—	—	10,000
	10			中部科學工業園區管理局 (中部科學園區管理局)	—	48,000	—	—	48,000
		1		雜 項 收 入	—	48,000	—	—	48,000
			1	其他雜項收入	—	48,000	—	—	48,000
	11			南部科學工業園區管理局 (南部科學園區管理局)	—	13,395,241	—	—	13,395,241
		1		雜 項 收 入	—	13,395,241	—	—	13,395,241
			1	其他雜項收入	—	13,395,241	—	—	13,395,241

特別決算歲入來源別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
165,595	—	—	165,595	0.03	165,595	--	—	—
165,595	—	—	165,595	0.03	165,595	--	—	—
16,389,717	—	—	16,389,717	3.00	16,389,717	--	—	—
16,389,717	—	—	16,389,717	3.00	16,389,717	--	—	—
16,389,717	—	—	16,389,717	3.00	16,389,717	--	—	—
26,455,919	—	—	26,455,919	4.84	26,455,919	--	—	—
26,455,919	—	—	26,455,919	4.84	26,455,919	--	—	—
26,455,919	—	—	26,455,919	4.84	26,455,919	--	—	—
11,594,906	—	—	11,594,906	2.12	11,594,906	--	—	—
11,594,906	—	—	11,594,906	2.12	11,594,906	--	—	—
3,708,034	—	—	3,708,034	0.68	3,708,034	--	—	—
7,886,872	—	—	7,886,872	1.44	7,886,872	--	—	—
20,566,346	—	—	20,566,346	3.76	20,566,346	--	—	—
20,566,346	—	—	20,566,346	3.76	20,566,346	--	—	—
20,249,080	—	—	20,249,080	3.70	20,249,080	--	—	—
317,266	—	—	317,266	0.06	317,266	--	—	—
11,942	—	—	11,942	0.00	11,942	--	—	—
11,942	—	—	11,942	0.00	11,942	--	—	—
11,942	—	—	11,942	0.00	11,942	--	—	—
183,323	—	—	183,323	0.03	183,323	--	—	—
183,323	—	—	183,323	0.03	183,323	--	—	—
183,323	—	—	183,323	0.03	183,323	--	—	—
10,000	—	—	10,000	0.00	10,000	--	—	—
10,000	—	—	10,000	0.00	10,000	--	—	—
10,000	—	—	10,000	0.00	10,000	--	—	—
48,000	—	—	48,000	0.01	48,000	--	—	—
48,000	—	—	48,000	0.01	48,000	--	—	—
48,000	—	—	48,000	0.01	48,000	--	—	—
13,395,241	—	—	13,395,241	2.45	13,395,241	--	—	—
13,395,241	—	—	13,395,241	2.45	13,395,241	--	—	—
13,395,241	—	—	13,395,241	2.45	13,395,241	--	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
			總 計	222,954,054,000	167,908,670,730	12,133,289,918	36,262,607,441	216,304,568,089
			(1. 一般政務支出)	9,236,131,000	5,818,748,013	343,653,018	3,009,125,159	9,171,526,190
1			行 政 支 出	1,066,705,000	881,955,202	168,103,983	1,938,525	1,051,997,710
	1		行 政 院	1,066,705,000	881,955,202	168,103,983	1,938,525	1,051,997,710
		1	數 位 建 設	1,066,705,000	881,955,202	168,103,983	1,938,525	1,051,997,710
2			司 法 支 出	89,180,000	89,180,000	—	—	89,180,000
	1		法 務 部	79,380,000	79,380,000	—	—	79,380,000
		1	數 位 建 設	79,380,000	79,380,000	—	—	79,380,000
	2		臺 灣 高 等 檢 察 署	9,800,000	9,800,000	—	—	9,800,000
		1	數 位 建 設	9,800,000	9,800,000	—	—	9,800,000
3			民 政 支 出	5,201,727,000	3,207,908,306	40,641,744	1,923,734,395	5,172,284,445
	1		原 住 民 族 委 員 會	1,515,080,000	1,299,521,413	11,965,613	201,510,523	1,512,997,549
		1	數 位 建 設	196,000,000	192,481,804	—	2,263,000	194,744,804
	2		城 鄉 建 設	1,319,080,000	1,107,039,609	11,965,613	199,247,523	1,318,252,745
	2		內 政 部	2,842,980,000	1,309,441,501	5,300,790	1,508,846,572	2,823,588,863
		1	數 位 建 設	568,400,000	495,790,516	855,424	70,636,378	567,282,318
		2	城 鄉 建 設	2,274,580,000	813,650,985	4,445,366	1,438,210,194	2,256,306,545
	3		消 防 署 及 所 屬	797,720,000	555,064,260	23,375,341	211,311,432	789,751,033
		1	數 位 建 設	397,880,000	323,843,784	—	73,463,099	397,306,883
		2	城 鄉 建 設	399,840,000	231,220,476	23,375,341	137,848,333	392,444,150
	4		移 民 署	45,947,000	43,881,132	—	2,065,868	45,947,000
		1	數 位 建 設	45,947,000	43,881,132	—	2,065,868	45,947,000
4			警 政 支 出	2,096,945,000	858,320,822	134,907,291	1,083,452,239	2,076,680,352
	1		警 政 署 及 所 屬	2,096,945,000	858,320,822	134,907,291	1,083,452,239	2,076,680,352
		1	數 位 建 設	71,540,000	70,916,720	—	—	70,916,720
		2	城 鄉 建 設	2,025,405,000	787,404,102	134,907,291	1,083,452,239	2,005,763,632
5			財 務 支 出	781,574,000	781,383,683	—	—	781,383,683

特別決算歲出政事別決算審定表

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
166,843,772,304	12,303,420,666	37,157,375,119	216,304,568,089	100.00	- 6,649,485,911	- 2.98	—	—
5,818,748,013	343,653,018	3,009,125,159	9,171,526,190	4.24	- 64,604,810	- 0.70	—	—
881,955,202	168,103,983	1,938,525	1,051,997,710	0.49	- 14,707,290	- 1.38	—	—
881,955,202	168,103,983	1,938,525	1,051,997,710	0.49	- 14,707,290	- 1.38	—	—
881,955,202	168,103,983	1,938,525	1,051,997,710	0.49	- 14,707,290	- 1.38	—	—
89,180,000	—	—	89,180,000	0.04	—	—	—	—
79,380,000	—	—	79,380,000	0.04	—	—	—	—
79,380,000	—	—	79,380,000	0.04	—	—	—	—
9,800,000	—	—	9,800,000	0.00	—	—	—	—
9,800,000	—	—	9,800,000	0.00	—	—	—	—
3,207,908,306	40,641,744	1,923,734,395	5,172,284,445	2.39	- 29,442,555	- 0.57	—	—
1,299,521,413	11,965,613	201,510,523	1,512,997,549	0.70	- 2,082,451	- 0.14	—	—
192,481,804	—	2,263,000	194,744,804	0.09	- 1,255,196	- 0.64	—	—
1,107,039,609	11,965,613	199,247,523	1,318,252,745	0.61	- 827,255	- 0.06	—	—
1,309,441,501	5,300,790	1,508,846,572	2,823,588,863	1.31	- 19,391,137	- 0.68	—	—
495,790,516	855,424	70,636,378	567,282,318	0.26	- 1,117,682	- 0.20	—	—
813,650,985	4,445,366	1,438,210,194	2,256,306,545	1.04	- 18,273,455	- 0.80	—	—
555,064,260	23,375,341	211,311,432	789,751,033	0.37	- 7,968,967	- 1.00	—	—
323,843,784	—	73,463,099	397,306,883	0.18	- 573,117	- 0.14	—	—
231,220,476	23,375,341	137,848,333	392,444,150	0.18	- 7,395,850	- 1.85	—	—
43,881,132	—	2,065,868	45,947,000	0.02	—	—	—	—
43,881,132	—	2,065,868	45,947,000	0.02	—	—	—	—
858,320,822	134,907,291	1,083,452,239	2,076,680,352	0.96	- 20,264,648	- 0.97	—	—
858,320,822	134,907,291	1,083,452,239	2,076,680,352	0.96	- 20,264,648	- 0.97	—	—
70,916,720	—	—	70,916,720	0.03	- 623,280	- 0.87	—	—
787,404,102	134,907,291	1,083,452,239	2,005,763,632	0.93	- 19,641,368	- 0.97	—	—
781,383,683	—	—	781,383,683	0.36	- 190,317	- 0.02	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
5	1	關 務 署 及 所 屬	29,400,000	29,398,896	—	—	29,398,896
	1	數 位 建 設	29,400,000	29,398,896	—	—	29,398,896
	2	財 政 資 訊 中 心	737,474,000	737,346,871	—	—	737,346,871
	1	數 位 建 設	737,474,000	737,346,871	—	—	737,346,871
	3	金 融 監 督 管 理 委 員 會	14,700,000	14,637,916	—	—	14,637,916
	1	數 位 建 設	14,700,000	14,637,916	—	—	14,637,916
		(2. 教育科學文化支出)	57,185,644,000	48,715,817,859	266,940,929	6,759,188,697	55,741,947,485
6		教 育 支 出	12,651,900,000	12,245,591,011	27,982,414	231,137,577	12,504,711,002
	1	教 育 部	6,364,678,000	6,088,513,659	—	178,472,904	6,266,986,563
	1	數 位 建 設	4,820,333,000	4,649,874,120	—	101,972,904	4,751,847,024
	2	城 鄉 建 設	49,098,000	47,675,955	—	—	47,675,955
	3	人才培育促進就業建設	1,495,247,000	1,390,963,584	—	76,500,000	1,467,463,584
	2	國 民 及 學 前 教 育 署	6,107,422,000	6,021,908,377	—	37,003,673	6,058,912,050
	1	數 位 建 設	1,378,442,000	1,367,054,636	—	—	1,367,054,636
	2	城 鄉 建 設	1,234,599,000	1,195,861,723	—	33,452,673	1,229,314,396
	3	少子化友善育兒空間建設	764,395,000	735,134,012	—	3,551,000	738,685,012
	4	人才培育促進就業建設	2,729,986,000	2,723,858,006	—	—	2,723,858,006
	3	體 育 署	179,800,000	135,168,975	27,982,414	15,661,000	178,812,389
	1	城 鄉 建 設	179,800,000	135,168,975	27,982,414	15,661,000	178,812,389
7		科 學 支 出	21,169,693,000	20,324,184,417	11,419,800	267,107,445	20,602,711,662
	1	中 央 研 究 院	729,170,000	694,544,421	—	—	694,544,421
	1	數 位 建 設	604,170,000	569,544,421	—	—	569,544,421
	2	綠 能 建 設	125,000,000	125,000,000	—	—	125,000,000
	2	經 濟 部	272,563,000	271,839,519	—	—	271,839,519
	1	數 位 建 設	272,563,000	271,839,519	—	—	271,839,519
	3	工 業 局	5,150,000,000	4,943,482,494	11,419,800	61,863,795	5,016,766,089
	1	數 位 建 設	4,450,000,000	4,254,215,886	11,419,800	61,863,795	4,327,499,481

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
29,398,896	—	—	29,398,896	0.01	- 1,104	- 0.00	—	—
29,398,896	—	—	29,398,896	0.01	- 1,104	- 0.00	—	—
737,346,871	—	—	737,346,871	0.34	- 127,129	- 0.02	—	—
737,346,871	—	—	737,346,871	0.34	- 127,129	- 0.02	—	—
14,637,916	—	—	14,637,916	0.01	- 62,084	- 0.42	—	—
14,637,916	—	—	14,637,916	0.01	- 62,084	- 0.42	—	—
47,821,050,181	266,940,929	7,653,956,375	55,741,947,485	25.77	- 1,443,696,515	- 2.52	—	—
12,036,230,952	27,982,414	440,497,636	12,504,711,002	5.78	- 147,188,998	- 1.16	—	—
6,088,513,659	—	178,472,904	6,266,986,563	2.90	- 97,691,437	- 1.53	—	—
4,649,874,120	—	101,972,904	4,751,847,024	2.20	- 68,485,976	- 1.42	—	—
47,675,955	—	—	47,675,955	0.02	- 1,422,045	- 2.90	—	—
1,390,963,584	—	76,500,000	1,467,463,584	0.68	- 27,783,416	- 1.86	—	—
5,829,492,462	—	229,419,588	6,058,912,050	2.80	- 48,509,950	- 0.79	—	—
1,367,054,636	—	—	1,367,054,636	0.63	- 11,387,364	- 0.83	—	—
1,032,954,820	—	196,359,576	1,229,314,396	0.57	- 5,284,604	- 0.43	—	—
705,625,000	—	33,060,012	738,685,012	0.34	- 25,709,988	- 3.36	—	—
2,723,858,006	—	—	2,723,858,006	1.26	- 6,127,994	- 0.22	—	—
118,224,831	27,982,414	32,605,144	178,812,389	0.08	- 987,611	- 0.55	—	—
118,224,831	27,982,414	32,605,144	178,812,389	0.08	- 987,611	- 0.55	—	—
20,324,184,417	11,419,800	267,107,445	20,602,711,662	9.52	- 566,981,338	- 2.68	—	—
694,544,421	—	—	694,544,421	0.32	- 34,625,579	- 4.75	—	—
569,544,421	—	—	569,544,421	0.26	- 34,625,579	- 5.73	—	—
125,000,000	—	—	125,000,000	0.06	—	—	—	—
271,839,519	—	—	271,839,519	0.13	- 723,481	- 0.27	—	—
271,839,519	—	—	271,839,519	0.13	- 723,481	- 0.27	—	—
4,943,482,494	11,419,800	61,863,795	5,016,766,089	2.32	- 133,233,911	- 2.59	—	—
4,254,215,886	11,419,800	61,863,795	4,327,499,481	2.00	- 122,500,519	- 2.75	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
7	3	2	人才培育促進就業建設	700,000,000	689,266,608	—	—	689,266,608
	4		標準檢驗局及所屬	279,734,000	276,855,503	—	—	276,855,503
		1	綠 能 建 設	250,000,000	247,199,503	—	—	247,199,503
		2	數 位 建 設	29,734,000	29,656,000	—	—	29,656,000
	5		智 慧 財 產 局	9,911,000	9,830,076	—	—	9,830,076
		1	數 位 建 設	9,911,000	9,830,076	—	—	9,830,076
	6		水 利 署 及 所 屬	455,924,000	440,434,115	—	3,491,000	443,925,115
		1	數 位 建 設	455,924,000	440,434,115	—	3,491,000	443,925,115
	7		中 小 企 業 處	547,958,000	522,591,937	—	—	522,591,937
		1	數 位 建 設	547,958,000	522,591,937	—	—	522,591,937
	8		加工出口區管理處及所屬	29,734,000	29,734,000	—	—	29,734,000
		1	數 位 建 設	29,734,000	29,734,000	—	—	29,734,000
	9		交 通 部	17,760,000	17,535,923	—	—	17,535,923
		1	數 位 建 設	17,760,000	17,535,923	—	—	17,535,923
	10		中 央 氣 象 局	1,142,545,000	1,142,544,772	—	—	1,142,544,772
		1	數 位 建 設	1,142,545,000	1,142,544,772	—	—	1,142,544,772
	11		核 能 研 究 所	196,000,000	195,975,027	—	—	195,975,027
		1	綠 能 建 設	196,000,000	195,975,027	—	—	195,975,027
	12		科 技 部	11,434,412,000	11,066,418,614	—	30,000,000	11,096,418,614
		1	數 位 建 設	3,634,594,000	3,603,627,414	—	30,000,000	3,633,627,414
		2	非營業特種基金—國家科學技術發展基金	7,799,818,000	7,462,791,200	—	—	7,462,791,200
	13		中部科學工業園區管理局 (中部科學園區管理局)	428,502,000	381,375,598	—	27,419,521	408,795,119
		1	數 位 建 設	428,502,000	381,375,598	—	27,419,521	408,795,119
	14		南部科學工業園區管理局 (南部科學園區管理局)	475,480,000	331,022,418	—	144,333,129	475,355,547
		1	數 位 建 設	475,480,000	331,022,418	—	144,333,129	475,355,547
8			文 化 支 出	23,364,051,000	16,146,042,431	227,538,715	6,260,943,675	22,634,524,821
	1		國 史 館	75,592,000	75,592,000	—	—	75,592,000

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
689,266,608	—	—	689,266,608	0.32	- 10,733,392	- 1.53	—	—
276,855,503	—	—	276,855,503	0.13	- 2,878,497	- 1.03	—	—
247,199,503	—	—	247,199,503	0.11	- 2,800,497	- 1.12	—	—
29,656,000	—	—	29,656,000	0.01	- 78,000	- 0.26	—	—
9,830,076	—	—	9,830,076	0.00	- 80,924	- 0.82	—	—
9,830,076	—	—	9,830,076	0.00	- 80,924	- 0.82	—	—
440,434,115	—	3,491,000	443,925,115	0.21	- 11,998,885	- 2.63	—	—
440,434,115	—	3,491,000	443,925,115	0.21	- 11,998,885	- 2.63	—	—
522,591,937	—	—	522,591,937	0.24	- 25,366,063	- 4.63	—	—
522,591,937	—	—	522,591,937	0.24	- 25,366,063	- 4.63	—	—
29,734,000	—	—	29,734,000	0.01	—	—	—	—
29,734,000	—	—	29,734,000	0.01	—	—	—	—
17,535,923	—	—	17,535,923	0.01	- 224,077	- 1.26	—	—
17,535,923	—	—	17,535,923	0.01	- 224,077	- 1.26	—	—
1,142,544,772	—	—	1,142,544,772	0.53	- 228	- 0.00	—	—
1,142,544,772	—	—	1,142,544,772	0.53	- 228	- 0.00	—	—
195,975,027	—	—	195,975,027	0.09	- 24,973	- 0.01	—	—
195,975,027	—	—	195,975,027	0.09	- 24,973	- 0.01	—	—
11,066,418,614	—	30,000,000	11,096,418,614	5.13	- 337,993,386	- 2.96	—	—
3,603,627,414	—	30,000,000	3,633,627,414	1.68	- 966,586	- 0.03	—	—
7,462,791,200	—	—	7,462,791,200	3.45	- 337,026,800	- 4.32	—	—
381,375,598	—	27,419,521	408,795,119	0.19	- 19,706,881	- 4.60	—	—
381,375,598	—	27,419,521	408,795,119	0.19	- 19,706,881	- 4.60	—	—
331,022,418	—	144,333,129	475,355,547	0.22	- 124,453	- 0.03	—	—
331,022,418	—	144,333,129	475,355,547	0.22	- 124,453	- 0.03	—	—
15,460,634,812	227,538,715	6,946,351,294	22,634,524,821	10.46	- 729,526,179	- 3.12	—	—
75,592,000	—	—	75,592,000	0.03	—	—	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
8	1	1	數 位 建 設	75,592,000	75,592,000	—	—	75,592,000
	2		國 立 故 宮 博 物 院	197,662,000	186,173,377	8,624,000	—	194,797,377
		1	數 位 建 設	197,662,000	186,173,377	8,624,000	—	194,797,377
	3		客 家 委 員 會 及 所 屬	1,187,760,000	1,134,684,365	53,075,635	—	1,187,760,000
		1	城 鄉 建 設	1,187,760,000	1,134,684,365	53,075,635	—	1,187,760,000
	4		體 育 署	6,456,000,000	3,063,990,845	67,792,098	2,908,799,180	6,040,582,123
		1	城 鄉 建 設	6,456,000,000	3,063,990,845	67,792,098	2,908,799,180	6,040,582,123
	5		國 家 圖 書 館	180,000	180,000	—	—	180,000
		1	數 位 建 設	180,000	180,000	—	—	180,000
	6		國 立 公 共 資 訊 圖 書 館	10,180,000	10,167,483	—	—	10,167,483
		1	數 位 建 設	10,180,000	10,167,483	—	—	10,167,483
	7		文 化 部	9,064,444,000	7,732,689,637	94,885,334	1,191,703,125	9,019,278,096
		1	數 位 建 設	2,167,106,000	1,830,328,901	46,216,274	264,894,770	2,141,439,945
		2	城 鄉 建 設	6,897,338,000	5,902,360,736	48,669,060	926,808,355	6,877,838,151
	8		文 化 資 產 局	4,900,000,000	3,126,077,970	—	1,559,841,294	4,685,919,264
		1	城 鄉 建 設	4,900,000,000	3,126,077,970	—	1,559,841,294	4,685,919,264
	9		影 視 及 流 行 音 樂 產 業 局	773,591,000	407,403,128	—	314,262,050	721,665,178
		1	數 位 建 設	773,591,000	407,403,128	—	314,262,050	721,665,178
	10		國 立 傳 統 藝 術 中 心	19,600,000	19,599,999	—	—	19,599,999
		1	數 位 建 設	19,600,000	19,599,999	—	—	19,599,999
	11		國 立 臺 灣 美 術 館 及 所 屬	47,922,000	46,942,000	980,000	—	47,922,000
		1	城 鄉 建 設	47,922,000	46,942,000	980,000	—	47,922,000
	12		國 立 臺 灣 工 藝 研 究 發 展 中 心	56,840,000	56,840,000	—	—	56,840,000
		1	數 位 建 設	9,800,000	9,800,000	—	—	9,800,000
		2	城 鄉 建 設	47,040,000	47,040,000	—	—	47,040,000
	13		國 立 臺 灣 博 物 館	135,240,000	135,181,301	—	—	135,181,301
		1	數 位 建 設	37,240,000	37,240,000	—	—	37,240,000

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
75,592,000	—	—	75,592,000	0.03	—	—	—	—
186,173,377	8,624,000	—	194,797,377	0.09	- 2,864,623	- 1.45	—	—
186,173,377	8,624,000	—	194,797,377	0.09	- 2,864,623	- 1.45	—	—
1,134,684,365	53,075,635	—	1,187,760,000	0.55	—	—	—	—
1,134,684,365	53,075,635	—	1,187,760,000	0.55	—	—	—	—
2,378,583,226	67,792,098	3,594,206,799	6,040,582,123	2.79	- 415,417,877	- 6.43	—	—
2,378,583,226	67,792,098	3,594,206,799	6,040,582,123	2.79	- 415,417,877	- 6.43	—	—
180,000	—	—	180,000	0.00	—	—	—	—
180,000	—	—	180,000	0.00	—	—	—	—
10,167,483	—	—	10,167,483	0.00	- 12,517	- 0.12	—	—
10,167,483	—	—	10,167,483	0.00	- 12,517	- 0.12	—	—
7,732,689,637	94,885,334	1,191,703,125	9,019,278,096	4.17	- 45,165,904	- 0.50	—	—
1,830,328,901	46,216,274	264,894,770	2,141,439,945	0.99	- 25,666,055	- 1.18	—	—
5,902,360,736	48,669,060	926,808,355	6,877,838,151	3.18	- 19,499,849	- 0.28	—	—
3,126,077,970	—	1,559,841,294	4,685,919,264	2.17	- 214,080,736	- 4.37	—	—
3,126,077,970	—	1,559,841,294	4,685,919,264	2.17	- 214,080,736	- 4.37	—	—
407,403,128	—	314,262,050	721,665,178	0.33	- 51,925,822	- 6.71	—	—
407,403,128	—	314,262,050	721,665,178	0.33	- 51,925,822	- 6.71	—	—
19,599,999	—	—	19,599,999	0.01	- 1	- 0.00	—	—
19,599,999	—	—	19,599,999	0.01	- 1	- 0.00	—	—
46,942,000	980,000	—	47,922,000	0.02	—	—	—	—
46,942,000	980,000	—	47,922,000	0.02	—	—	—	—
56,840,000	—	—	56,840,000	0.03	—	—	—	—
9,800,000	—	—	9,800,000	0.00	—	—	—	—
47,040,000	—	—	47,040,000	0.02	—	—	—	—
135,181,301	—	—	135,181,301	0.06	- 58,699	- 0.04	—	—
37,240,000	—	—	37,240,000	0.02	—	—	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
8	13	2	城 鄉 建 設	98,000,000	97,941,301	—	—	97,941,301
		14	國立臺灣史前文化博物館	439,040,000	150,520,326	2,181,648	286,338,026	439,040,000
		1	數 位 建 設	47,040,000	47,040,000	—	—	47,040,000
		2	城 鄉 建 設	392,000,000	103,480,326	2,181,648	286,338,026	392,000,000
			(3. 經濟發展支出)	135,182,142,000	102,127,508,678	8,543,513,364	20,417,236,804	131,088,258,846
9			農 業 支 出	45,183,679,000	36,116,935,618	6,023,647,667	583,853,864	42,724,437,149
	1		水利署及所屬	37,778,211,000	29,641,113,526	5,825,079,230	277,203,234	35,743,395,990
		1	水 環 境 建 設	37,778,211,000	29,641,113,526	5,825,079,230	277,203,234	35,743,395,990
	2		農 業 委 員 會	2,385,320,000	2,264,221,470	37,596,688	24,050,557	2,325,868,715
		1	水 環 境 建 設	2,107,000,000	1,994,218,625	37,596,688	24,050,557	2,055,865,870
		2	數 位 建 設	278,320,000	270,002,845	—	—	270,002,845
	3		林 務 局	1,541,148,000	1,382,158,005	7,032,722	140,952,298	1,530,143,025
		1	軌 道 建 設	433,748,000	295,165,560	6,281,153	132,028,229	433,474,942
		2	水 環 境 建 設	1,078,000,000	1,060,892,445	751,569	5,624,069	1,067,268,083
		3	數 位 建 設	29,400,000	26,100,000	—	3,300,000	29,400,000
	4		水 土 保 持 局	2,518,600,000	2,075,544,447	33,827,936	78,435,323	2,187,807,706
		1	水 環 境 建 設	2,489,200,000	2,046,179,625	33,827,936	78,435,323	2,158,442,884
		2	數 位 建 設	29,400,000	29,364,822	—	—	29,364,822
	5		漁 業 署 及 所 屬	931,000,000	724,500,244	120,111,091	63,212,452	907,823,787
		1	水 環 境 建 設	931,000,000	724,500,244	120,111,091	63,212,452	907,823,787
	6		農 糧 署 及 所 屬	29,400,000	29,397,926	—	—	29,397,926
		1	數 位 建 設	29,400,000	29,397,926	—	—	29,397,926
10			工 業 支 出	18,110,695,000	12,918,937,482	1,226,536,641	3,472,577,619	17,618,051,742
	1		營 建 署 及 所 屬	5,880,000,000	3,696,459,834	829,236,135	1,125,153,691	5,650,849,660
		1	城 鄉 建 設	5,880,000,000	3,696,459,834	829,236,135	1,125,153,691	5,650,849,660
	2		工 業 局	4,736,590,000	4,364,246,832	105,686,260	223,174,160	4,693,107,252
		1	城 鄉 建 設	4,736,590,000	4,364,246,832	105,686,260	223,174,160	4,693,107,252

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
97,941,301	—	—	97,941,301	0.05	- 58,699	- 0.06	—	—
150,520,326	2,181,648	286,338,026	439,040,000	0.20	—	—	—	—
47,040,000	—	—	47,040,000	0.02	—	—	—	—
103,480,326	2,181,648	286,338,026	392,000,000	0.18	—	—	—	—
101,957,377,930	8,713,644,112	20,417,236,804	131,088,258,846	60.60	- 4,093,883,154	- 3.03	—	—
36,116,935,618	6,023,647,667	583,853,864	42,724,437,149	19.75	- 2,459,241,851	- 5.44	—	—
29,641,113,526	5,825,079,230	277,203,234	35,743,395,990	16.52	- 2,034,815,010	- 5.39	—	—
29,641,113,526	5,825,079,230	277,203,234	35,743,395,990	16.52	- 2,034,815,010	- 5.39	—	—
2,264,221,470	37,596,688	24,050,557	2,325,868,715	1.08	- 59,451,285	- 2.49	—	—
1,994,218,625	37,596,688	24,050,557	2,055,865,870	0.95	- 51,134,130	- 2.43	—	—
270,002,845	—	—	270,002,845	0.12	- 8,317,155	- 2.99	—	—
1,382,158,005	7,032,722	140,952,298	1,530,143,025	0.71	- 11,004,975	- 0.71	—	—
295,165,560	6,281,153	132,028,229	433,474,942	0.20	- 273,058	- 0.06	—	—
1,060,892,445	751,569	5,624,069	1,067,268,083	0.49	- 10,731,917	- 1.00	—	—
26,100,000	—	3,300,000	29,400,000	0.01	—	—	—	—
2,075,544,447	33,827,936	78,435,323	2,187,807,706	1.01	- 330,792,294	- 13.13	—	—
2,046,179,625	33,827,936	78,435,323	2,158,442,884	1.00	- 330,757,116	- 13.29	—	—
29,364,822	—	—	29,364,822	0.01	- 35,178	- 0.12	—	—
724,500,244	120,111,091	63,212,452	907,823,787	0.42	- 23,176,213	- 2.49	—	—
724,500,244	120,111,091	63,212,452	907,823,787	0.42	- 23,176,213	- 2.49	—	—
29,397,926	—	—	29,397,926	0.01	- 2,074	- 0.01	—	—
29,397,926	—	—	29,397,926	0.01	- 2,074	- 0.01	—	—
12,918,937,482	1,226,536,641	3,472,577,619	17,618,051,742	8.15	- 492,643,258	- 2.72	—	—
3,696,459,834	829,236,135	1,125,153,691	5,650,849,660	2.61	- 229,150,340	- 3.90	—	—
3,696,459,834	829,236,135	1,125,153,691	5,650,849,660	2.61	- 229,150,340	- 3.90	—	—
4,364,246,832	105,686,260	223,174,160	4,693,107,252	2.17	- 43,482,748	- 0.92	—	—
4,364,246,832	105,686,260	223,174,160	4,693,107,252	2.17	- 43,482,748	- 0.92	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
10	3	加工出口區管理處及所屬	1,996,747,000	1,099,499,777	291,614,246	605,632,977	1,996,747,000
	1	城 鄉 建 設	1,996,747,000	1,099,499,777	291,614,246	605,632,977	1,996,747,000
	4	能 源 局	5,497,358,000	3,758,731,039	—	1,518,616,791	5,277,347,830
	1	綠 能 建 設	5,497,358,000	3,758,731,039	—	1,518,616,791	5,277,347,830
11		交 通 支 出	68,685,012,000	51,286,522,675	1,237,187,464	15,250,059,647	67,773,769,786
	1	國家通訊傳播委員會	754,497,000	678,816,634	2,583,577	30,000,000	711,400,211
	1	數 位 建 設	754,497,000	678,816,634	2,583,577	30,000,000	711,400,211
	2	營 建 署 及 所 屬	12,740,000,000	10,853,181,949	1,234,262,539	584,760,241	12,672,204,729
	1	城 鄉 建 設	12,740,000,000	10,853,181,949	1,234,262,539	584,760,241	12,672,204,729
	3	交 通 部	20,039,515,000	11,693,565,990	—	7,910,715,628	19,604,281,618
	1	營業基金—臺灣鐵路管理局	8,863,298,000	3,811,480,342	—	5,009,913,075	8,821,393,417
	2	營業基金—臺灣港務股份有限公司	1,350,000,000	956,671,201	—	—	956,671,201
	3	軌 道 建 設	9,826,217,000	6,925,414,447	—	2,900,802,553	9,826,217,000
	4	公 路 總 局 及 所 屬	12,653,831,000	11,613,749,173	—	1,040,081,827	12,653,831,000
	1	綠 能 建 設	674,502,000	639,397,390	—	35,104,610	674,502,000
	2	城 鄉 建 設	11,619,200,000	10,635,044,441	—	984,155,559	11,619,200,000
	3	水 環 境 建 設	360,129,000	339,307,342	—	20,821,658	360,129,000
	5	鐵 道 局 及 所 屬	22,497,169,000	16,447,208,929	341,348	5,684,501,951	22,132,052,228
	1	軌 道 建 設	22,497,169,000	16,447,208,929	341,348	5,684,501,951	22,132,052,228
12		其他經濟服務支出	3,202,756,000	1,805,112,903	56,141,592	1,110,745,674	2,972,000,169
	1	國家發展委員會	120,540,000	118,387,754	—	—	118,387,754
	1	數 位 建 設	120,540,000	118,387,754	—	—	118,387,754
	2	經 濟 部	588,637,000	136,149,113	21,601,594	390,762,929	548,513,636
	1	城 鄉 建 設	588,637,000	136,149,113	21,601,594	390,762,929	548,513,636
	3	中 小 企 業 處	1,893,579,000	1,077,085,123	34,539,998	696,924,939	1,808,550,060
	1	城 鄉 建 設	1,893,579,000	1,077,085,123	34,539,998	696,924,939	1,808,550,060
	4	觀 光 局 及 所 屬	600,000,000	473,490,913	—	23,057,806	496,548,719

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,099,499,777	291,614,246	605,632,977	1,996,747,000	0.92	—	—	—	—
1,099,499,777	291,614,246	605,632,977	1,996,747,000	0.92	—	—	—	—
3,758,731,039	—	1,518,616,791	5,277,347,830	2.44	- 220,010,170	- 4.00	—	—
3,758,731,039	—	1,518,616,791	5,277,347,830	2.44	- 220,010,170	- 4.00	—	—
51,116,391,927	1,407,318,212	15,250,059,647	67,773,769,786	31.33	- 911,242,214	- 1.33	—	—
678,816,634	2,583,577	30,000,000	711,400,211	0.33	- 43,096,789	- 5.71	—	—
678,816,634	2,583,577	30,000,000	711,400,211	0.33	- 43,096,789	- 5.71	—	—
10,683,051,201	1,404,393,287	584,760,241	12,672,204,729	5.86	- 67,795,271	- 0.53	—	—
10,683,051,201	1,404,393,287	584,760,241	12,672,204,729	5.86	- 67,795,271	- 0.53	—	—
11,693,565,990	—	7,910,715,628	19,604,281,618	9.06	- 435,233,382	- 2.17	—	—
3,811,480,342	—	5,009,913,075	8,821,393,417	4.08	- 41,904,583	- 0.47	—	—
956,671,201	—	—	956,671,201	0.44	- 393,328,799	- 29.14	—	—
6,925,414,447	—	2,900,802,553	9,826,217,000	4.54	—	—	—	—
11,613,749,173	—	1,040,081,827	12,653,831,000	5.85	—	—	—	—
639,397,390	—	35,104,610	674,502,000	0.31	—	—	—	—
10,635,044,441	—	984,155,559	11,619,200,000	5.37	—	—	—	—
339,307,342	—	20,821,658	360,129,000	0.17	—	—	—	—
16,447,208,929	341,348	5,684,501,951	22,132,052,228	10.23	- 365,116,772	- 1.62	—	—
16,447,208,929	341,348	5,684,501,951	22,132,052,228	10.23	- 365,116,772	- 1.62	—	—
1,805,112,903	56,141,592	1,110,745,674	2,972,000,169	1.37	- 230,755,831	- 7.20	—	—
118,387,754	—	—	118,387,754	0.05	- 2,152,246	- 1.79	—	—
118,387,754	—	—	118,387,754	0.05	- 2,152,246	- 1.79	—	—
136,149,113	21,601,594	390,762,929	548,513,636	0.25	- 40,123,364	- 6.82	—	—
136,149,113	21,601,594	390,762,929	548,513,636	0.25	- 40,123,364	- 6.82	—	—
1,077,085,123	34,539,998	696,924,939	1,808,550,060	0.84	- 85,028,940	- 4.49	—	—
1,077,085,123	34,539,998	696,924,939	1,808,550,060	0.84	- 85,028,940	- 4.49	—	—
473,490,913	—	23,057,806	496,548,719	0.23	- 103,451,281	- 17.24	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
12	4	1	水 環 境 建 設	600,000,000	473,490,913	—	23,057,806	496,548,719
			(4. 社會福利支出)	7,363,485,000	2,404,183,397	—	4,392,219,906	6,796,403,303
13			福 利 服 務 支 出	2,174,422,000	786,162,281	—	898,731,672	1,684,893,953
	1		社 會 及 家 庭 署	2,113,662,000	730,706,507	—	893,429,745	1,624,136,252
		1	城 鄉 建 設	658,852,000	375,928,762	—	189,257,280	565,186,042
		2	少子化友善育兒空間 建設	1,454,810,000	354,777,745	—	704,172,465	1,058,950,210
	2		國軍退除役官兵輔導委 員會	60,760,000	55,455,774	—	5,301,927	60,757,701
		1	數 位 建 設	60,760,000	55,455,774	—	5,301,927	60,757,701
14			醫 療 保 健 支 出	5,189,063,000	1,618,021,116	—	3,493,488,234	5,111,509,350
	1		衛 生 福 利 部	3,872,923,000	1,054,304,353	—	2,766,292,771	3,820,597,124
		1	城 鄉 建 設	3,598,523,000	843,474,033	—	2,710,333,756	3,553,807,789
		2	數 位 建 設	274,400,000	210,830,320	—	55,959,015	266,789,335
	2		食 品 藥 物 管 理 署	561,540,000	468,956,346	—	86,124,507	555,080,853
		1	食 品 安 全 建 設	561,540,000	468,956,346	—	86,124,507	555,080,853
	3		國 民 健 康 署	754,600,000	94,760,417	—	641,070,956	735,831,373
		1	城 鄉 建 設	754,600,000	94,760,417	—	641,070,956	735,831,373
			(5. 社區發展及環境保 護 支 出)	13,986,652,000	8,842,412,783	2,979,182,607	1,684,836,875	13,506,432,265
15			環 境 保 護 支 出	13,986,652,000	8,842,412,783	2,979,182,607	1,684,836,875	13,506,432,265
	1		營 建 署 及 所 屬	8,934,562,000	6,231,631,646	789,861,369	1,465,220,422	8,486,713,437
		1	水 環 境 建 設	8,413,202,000	5,710,271,646	789,861,369	1,465,220,422	7,965,353,437
		2	綠 能 建 設	490,000,000	490,000,000	—	—	490,000,000
		3	數 位 建 設	31,360,000	31,360,000	—	—	31,360,000
	2		環 境 保 護 署	5,052,090,000	2,610,781,137	2,189,321,238	219,616,453	5,019,718,828
		1	水 環 境 建 設	4,399,025,000	2,150,048,186	2,189,321,238	42,629,536	4,381,998,960
		2	數 位 建 設	653,065,000	460,732,951	—	176,986,917	637,719,868

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
473,490,913	—	23,057,806	496,548,719	0.23	- 103,451,281	- 17.24	—	—
2,404,183,397	—	4,392,219,906	6,796,403,303	3.14	- 567,081,697	- 7.70	—	—
786,162,281	—	898,731,672	1,684,893,953	0.78	- 489,528,047	- 22.51	—	—
730,706,507	—	893,429,745	1,624,136,252	0.75	- 489,525,748	- 23.16	—	—
375,928,762	—	189,257,280	565,186,042	0.26	- 93,665,958	- 14.22	—	—
354,777,745	—	704,172,465	1,058,950,210	0.49	- 395,859,790	- 27.21	—	—
55,455,774	—	5,301,927	60,757,701	0.03	- 2,299	- 0.00	—	—
55,455,774	—	5,301,927	60,757,701	0.03	- 2,299	- 0.00	—	—
1,618,021,116	—	3,493,488,234	5,111,509,350	2.36	- 77,553,650	- 1.49	—	—
1,054,304,353	—	2,766,292,771	3,820,597,124	1.77	- 52,325,876	- 1.35	—	—
843,474,033	—	2,710,333,756	3,553,807,789	1.64	- 44,715,211	- 1.24	—	—
210,830,320	—	55,959,015	266,789,335	0.12	- 7,610,665	- 2.77	—	—
468,956,346	—	86,124,507	555,080,853	0.26	- 6,459,147	- 1.15	—	—
468,956,346	—	86,124,507	555,080,853	0.26	- 6,459,147	- 1.15	—	—
94,760,417	—	641,070,956	735,831,373	0.34	- 18,768,627	- 2.49	—	—
94,760,417	—	641,070,956	735,831,373	0.34	- 18,768,627	- 2.49	—	—
8,842,412,783	2,979,182,607	1,684,836,875	13,506,432,265	6.24	- 480,219,735	- 3.43	—	—
8,842,412,783	2,979,182,607	1,684,836,875	13,506,432,265	6.24	- 480,219,735	- 3.43	—	—
6,231,631,646	789,861,369	1,465,220,422	8,486,713,437	3.92	- 447,848,563	- 5.01	—	—
5,710,271,646	789,861,369	1,465,220,422	7,965,353,437	3.68	- 447,848,563	- 5.32	—	—
490,000,000	—	—	490,000,000	0.23	—	—	—	—
31,360,000	—	—	31,360,000	0.01	—	—	—	—
2,610,781,137	2,189,321,238	219,616,453	5,019,718,828	2.32	- 32,371,172	- 0.64	—	—
2,150,048,186	2,189,321,238	42,629,536	4,381,998,960	2.03	- 17,026,040	- 0.39	—	—
460,732,951	—	176,986,917	637,719,868	0.29	- 15,345,132	- 2.35	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
1	1	1	1	總 計	222,954,054,000	167,908,670,730	12,133,289,918	36,262,607,441	216,304,568,089
				總 統 府 主 管	804,762,000	770,136,421	—	—	770,136,421
				國 史 館	75,592,000	75,592,000	—	—	75,592,000
				文 化 支 出	75,592,000	75,592,000	—	—	75,592,000
				數 位 建 設	75,592,000	75,592,000	—	—	75,592,000
				發展數位文創	75,592,000	75,592,000	—	—	75,592,000
				中 央 研 究 院	729,170,000	694,544,421	—	—	694,544,421
				科 學 支 出	729,170,000	694,544,421	—	—	694,544,421
				數 位 建 設	604,170,000	569,544,421	—	—	569,544,421
				建構開放政府及 智慧城鄉服務	16,170,000	16,048,877	—	—	16,048,877
				建設下世代科研 與智慧學習環境	588,000,000	553,495,544	—	—	553,495,544
				綠 能 建 設	125,000,000	125,000,000	—	—	125,000,000
				前瞻技術驗證及健 全綠色金融機制	125,000,000	125,000,000	—	—	125,000,000
				行 政 院 主 管	4,842,244,000	4,299,538,745	244,352,808	233,449,048	4,777,340,601
				行 政 院	1,066,705,000	881,955,202	168,103,983	1,938,525	1,051,997,710
				行 政 支 出	1,066,705,000	881,955,202	168,103,983	1,938,525	1,051,997,710
				數 位 建 設	1,066,705,000	881,955,202	168,103,983	1,938,525	1,051,997,710
				推動資安基礎建設	1,066,705,000	881,955,202	168,103,983	1,938,525	1,051,997,710
2	1	1	1	國 立 故 宮 博 物 院	197,662,000	186,173,377	8,624,000	—	194,797,377
				文 化 支 出	197,662,000	186,173,377	8,624,000	—	194,797,377
				數 位 建 設	197,662,000	186,173,377	8,624,000	—	194,797,377
				發展數位文創	197,662,000	186,173,377	8,624,000	—	194,797,377
				國 家 發 展 委 員 會	120,540,000	118,387,754	—	—	118,387,754
				其他經濟服務支出	120,540,000	118,387,754	—	—	118,387,754
				數 位 建 設	120,540,000	118,387,754	—	—	118,387,754
				推動資安基礎建設	120,540,000	118,387,754	—	—	118,387,754

特別決算歲出機關別決算審定表

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
166,843,772,304	12,303,420,666	37,157,375,119	216,304,568,089	100.00	- 6,649,485,911	- 2.98	—	—
770,136,421	—	—	770,136,421	0.36	- 34,625,579	- 4.30	—	—
75,592,000	—	—	75,592,000	0.03	—	—	—	—
75,592,000	—	—	75,592,000	0.03	—	—	—	—
75,592,000	—	—	75,592,000	0.03	—	—	—	—
75,592,000	—	—	75,592,000	0.03	—	—	—	—
694,544,421	—	—	694,544,421	0.32	- 34,625,579	- 4.75	—	—
694,544,421	—	—	694,544,421	0.32	- 34,625,579	- 4.75	—	—
569,544,421	—	—	569,544,421	0.26	- 34,625,579	- 5.73	—	—
16,048,877	—	—	16,048,877	0.01	- 121,123	- 0.75	—	—
553,495,544	—	—	553,495,544	0.26	- 34,504,456	- 5.87	—	—
125,000,000	—	—	125,000,000	0.06	—	—	—	—
125,000,000	—	—	125,000,000	0.06	—	—	—	—
4,299,538,745	244,352,808	233,449,048	4,777,340,601	2.21	- 64,903,399	- 1.34	—	—
881,955,202	168,103,983	1,938,525	1,051,997,710	0.49	- 14,707,290	- 1.38	—	—
881,955,202	168,103,983	1,938,525	1,051,997,710	0.49	- 14,707,290	- 1.38	—	—
881,955,202	168,103,983	1,938,525	1,051,997,710	0.49	- 14,707,290	- 1.38	—	—
881,955,202	168,103,983	1,938,525	1,051,997,710	0.49	- 14,707,290	- 1.38	—	—
186,173,377	8,624,000	—	194,797,377	0.09	- 2,864,623	- 1.45	—	—
186,173,377	8,624,000	—	194,797,377	0.09	- 2,864,623	- 1.45	—	—
186,173,377	8,624,000	—	194,797,377	0.09	- 2,864,623	- 1.45	—	—
186,173,377	8,624,000	—	194,797,377	0.09	- 2,864,623	- 1.45	—	—
118,387,754	—	—	118,387,754	0.05	- 2,152,246	- 1.79	—	—
118,387,754	—	—	118,387,754	0.05	- 2,152,246	- 1.79	—	—
118,387,754	—	—	118,387,754	0.05	- 2,152,246	- 1.79	—	—
118,387,754	—	—	118,387,754	0.05	- 2,152,246	- 1.79	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
2	4			原 住 民 族 委 員 會	1,515,080,000	1,299,521,413	11,965,613	201,510,523	1,512,997,549
				民 政 支 出	1,515,080,000	1,299,521,413	11,965,613	201,510,523	1,512,997,549
			1	數 位 建 設	196,000,000	192,481,804	—	2,263,000	194,744,804
				保障寬頻人權	196,000,000	192,481,804	—	2,263,000	194,744,804
			2	城 鄉 建 設	1,319,080,000	1,107,039,609	11,965,613	199,247,523	1,318,252,745
				原民部落營造	1,319,080,000	1,107,039,609	11,965,613	199,247,523	1,318,252,745
			5	客家委員會及所屬	1,187,760,000	1,134,684,365	53,075,635	—	1,187,760,000
				文 化 支 出	1,187,760,000	1,134,684,365	53,075,635	—	1,187,760,000
			1	城 鄉 建 設	1,187,760,000	1,134,684,365	53,075,635	—	1,187,760,000
			1	客家浪漫臺三線	1,187,760,000	1,134,684,365	53,075,635	—	1,187,760,000
			6	國家通訊傳播委員會	754,497,000	678,816,634	2,583,577	30,000,000	711,400,211
				交 通 支 出	754,497,000	678,816,634	2,583,577	30,000,000	711,400,211
			1	數 位 建 設	754,497,000	678,816,634	2,583,577	30,000,000	711,400,211
			1	推動資安基礎建設	324,497,000	290,711,840	—	30,000,000	320,711,840
			2	保障寬頻人權	430,000,000	388,104,794	2,583,577	—	390,688,371
3	1			內 政 部 主 管	33,338,154,000	23,547,981,144	3,016,943,465	5,980,810,465	32,545,735,074
				內 政 部	2,842,980,000	1,309,441,501	5,300,790	1,508,846,572	2,823,588,863
				民 政 支 出	2,842,980,000	1,309,441,501	5,300,790	1,508,846,572	2,823,588,863
			1	數 位 建 設	568,400,000	495,790,516	855,424	70,636,378	567,282,318
			1	推動資安基礎建設	568,400,000	495,790,516	855,424	70,636,378	567,282,318
			2	城 鄉 建 設	2,274,580,000	813,650,985	4,445,366	1,438,210,194	2,256,306,545
				公共服務據點整備	2,274,580,000	813,650,985	4,445,366	1,438,210,194	2,256,306,545
			2	營 建 署 及 所 屬	27,554,562,000	20,781,273,429	2,853,360,043	3,175,134,354	26,809,767,826
				工 業 支 出	5,880,000,000	3,696,459,834	829,236,135	1,125,153,691	5,650,849,660
			1	城 鄉 建 設	5,880,000,000	3,696,459,834	829,236,135	1,125,153,691	5,650,849,660
			1	城鎮之心工程	5,880,000,000	3,696,459,834	829,236,135	1,125,153,691	5,650,849,660

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,299,521,413	11,965,613	201,510,523	1,512,997,549	0.70	- 2,082,451	- 0.14	—	—
1,299,521,413	11,965,613	201,510,523	1,512,997,549	0.70	- 2,082,451	- 0.14	—	—
192,481,804	—	2,263,000	194,744,804	0.09	- 1,255,196	- 0.64	—	—
192,481,804	—	2,263,000	194,744,804	0.09	- 1,255,196	- 0.64	—	—
1,107,039,609	11,965,613	199,247,523	1,318,252,745	0.61	- 827,255	- 0.06	—	—
1,107,039,609	11,965,613	199,247,523	1,318,252,745	0.61	- 827,255	- 0.06	—	—
1,134,684,365	53,075,635	—	1,187,760,000	0.55	—	—	—	—
1,134,684,365	53,075,635	—	1,187,760,000	0.55	—	—	—	—
1,134,684,365	53,075,635	—	1,187,760,000	0.55	—	—	—	—
1,134,684,365	53,075,635	—	1,187,760,000	0.55	—	—	—	—
678,816,634	2,583,577	30,000,000	711,400,211	0.33	- 43,096,789	- 5.71	—	—
678,816,634	2,583,577	30,000,000	711,400,211	0.33	- 43,096,789	- 5.71	—	—
678,816,634	2,583,577	30,000,000	711,400,211	0.33	- 43,096,789	- 5.71	—	—
290,711,840	—	30,000,000	320,711,840	0.15	- 3,785,160	- 1.17	—	—
388,104,794	2,583,577	—	390,688,371	0.18	- 39,311,629	- 9.14	—	—
23,377,850,396	3,187,074,213	5,980,810,465	32,545,735,074	15.05	- 792,418,926	- 2.38	—	—
1,309,441,501	5,300,790	1,508,846,572	2,823,588,863	1.31	- 19,391,137	- 0.68	—	—
1,309,441,501	5,300,790	1,508,846,572	2,823,588,863	1.31	- 19,391,137	- 0.68	—	—
495,790,516	855,424	70,636,378	567,282,318	0.26	- 1,117,682	- 0.20	—	—
495,790,516	855,424	70,636,378	567,282,318	0.26	- 1,117,682	- 0.20	—	—
813,650,985	4,445,366	1,438,210,194	2,256,306,545	1.04	- 18,273,455	- 0.80	—	—
813,650,985	4,445,366	1,438,210,194	2,256,306,545	1.04	- 18,273,455	- 0.80	—	—
20,611,142,681	3,023,490,791	3,175,134,354	26,809,767,826	12.39	- 744,794,174	- 2.70	—	—
3,696,459,834	829,236,135	1,125,153,691	5,650,849,660	2.61	- 229,150,340	- 3.90	—	—
3,696,459,834	829,236,135	1,125,153,691	5,650,849,660	2.61	- 229,150,340	- 3.90	—	—
3,696,459,834	829,236,135	1,125,153,691	5,650,849,660	2.61	- 229,150,340	- 3.90	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
3	2	2		交 通 支 出	12,740,000,000	10,853,181,949	1,234,262,539	584,760,241	12,672,204,729
				城 鄉 建 設	12,740,000,000	10,853,181,949	1,234,262,539	584,760,241	12,672,204,729
			1	提升道路品質	12,740,000,000	10,853,181,949	1,234,262,539	584,760,241	12,672,204,729
				環 境 保 護 支 出	8,934,562,000	6,231,631,646	789,861,369	1,465,220,422	8,486,713,437
			3	水 環 境 建 設	8,413,202,000	5,710,271,646	789,861,369	1,465,220,422	7,965,353,437
			1	水 與 發 展	818,202,000	302,939,911	247,109,096	15,886,336	565,935,343
			2	水 與 安 全	5,635,000,000	3,512,575,729	510,037,567	1,431,674,542	5,454,287,838
			3	水 與 環 境	1,960,000,000	1,894,756,006	32,714,706	17,659,544	1,945,130,256
			4	綠 能 建 設	490,000,000	490,000,000	—	—	490,000,000
			1	加速綠能科學城建置	490,000,000	490,000,000	—	—	490,000,000
			5	數 位 建 設	31,360,000	31,360,000	—	—	31,360,000
			1	建構開放政府及智慧城鄉服務	31,360,000	31,360,000	—	—	31,360,000
			3	警 政 署 及 所 屬	2,096,945,000	858,320,822	134,907,291	1,083,452,239	2,076,680,352
				警 政 支 出	2,096,945,000	858,320,822	134,907,291	1,083,452,239	2,076,680,352
			1	數 位 建 設	71,540,000	70,916,720	—	—	70,916,720
			1	推動資安基礎建設	71,540,000	70,916,720	—	—	70,916,720
			2	城 鄉 建 設	2,025,405,000	787,404,102	134,907,291	1,083,452,239	2,005,763,632
			1	公共服務據點整備	2,025,405,000	787,404,102	134,907,291	1,083,452,239	2,005,763,632
			4	消 防 署 及 所 屬	797,720,000	555,064,260	23,375,341	211,311,432	789,751,033
				民 政 支 出	797,720,000	555,064,260	23,375,341	211,311,432	789,751,033
			1	數 位 建 設	397,880,000	323,843,784	—	73,463,099	397,306,883
			1	建構開放政府及智慧城鄉服務	137,200,000	136,847,120	—	95,040	136,942,160
			2	推動資安基礎建設	260,680,000	186,996,664	—	73,368,059	260,364,723
			2	城 鄉 建 設	399,840,000	231,220,476	23,375,341	137,848,333	392,444,150
			1	公共服務據點整備	399,840,000	231,220,476	23,375,341	137,848,333	392,444,150
	5			移 民 署	45,947,000	43,881,132	—	2,065,868	45,947,000

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
10,683,051,201	1,404,393,287	584,760,241	12,672,204,729	5.86	- 67,795,271	- 0.53	—	—
10,683,051,201	1,404,393,287	584,760,241	12,672,204,729	5.86	- 67,795,271	- 0.53	—	—
10,683,051,201	1,404,393,287	584,760,241	12,672,204,729	5.86	- 67,795,271	- 0.53	—	—
6,231,631,646	789,861,369	1,465,220,422	8,486,713,437	3.92	- 447,848,563	- 5.01	—	—
5,710,271,646	789,861,369	1,465,220,422	7,965,353,437	3.68	- 447,848,563	- 5.32	—	—
302,939,911	247,109,096	15,886,336	565,935,343	0.26	- 252,266,657	- 30.83	—	—
3,512,575,729	510,037,567	1,431,674,542	5,454,287,838	2.52	- 180,712,162	- 3.21	—	—
1,894,756,006	32,714,706	17,659,544	1,945,130,256	0.90	- 14,869,744	- 0.76	—	—
490,000,000	—	—	490,000,000	0.23	—	—	—	—
490,000,000	—	—	490,000,000	0.23	—	—	—	—
31,360,000	—	—	31,360,000	0.01	—	—	—	—
31,360,000	—	—	31,360,000	0.01	—	—	—	—
858,320,822	134,907,291	1,083,452,239	2,076,680,352	0.96	- 20,264,648	- 0.97	—	—
858,320,822	134,907,291	1,083,452,239	2,076,680,352	0.96	- 20,264,648	- 0.97	—	—
70,916,720	—	—	70,916,720	0.03	- 623,280	- 0.87	—	—
70,916,720	—	—	70,916,720	0.03	- 623,280	- 0.87	—	—
787,404,102	134,907,291	1,083,452,239	2,005,763,632	0.93	- 19,641,368	- 0.97	—	—
787,404,102	134,907,291	1,083,452,239	2,005,763,632	0.93	- 19,641,368	- 0.97	—	—
555,064,260	23,375,341	211,311,432	789,751,033	0.37	- 7,968,967	- 1.00	—	—
555,064,260	23,375,341	211,311,432	789,751,033	0.37	- 7,968,967	- 1.00	—	—
323,843,784	—	73,463,099	397,306,883	0.18	- 573,117	- 0.14	—	—
136,847,120	—	95,040	136,942,160	0.06	- 257,840	- 0.19	—	—
186,996,664	—	73,368,059	260,364,723	0.12	- 315,277	- 0.12	—	—
231,220,476	23,375,341	137,848,333	392,444,150	0.18	- 7,395,850	- 1.85	—	—
231,220,476	23,375,341	137,848,333	392,444,150	0.18	- 7,395,850	- 1.85	—	—
43,881,132	—	2,065,868	45,947,000	0.02	—	—	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
3	5	1		民 政 支 出	45,947,000	43,881,132	—	2,065,868	45,947,000
				數 位 建 設	45,947,000	43,881,132	—	2,065,868	45,947,000
			1	保障寬頻人權	45,947,000	43,881,132	—	2,065,868	45,947,000
4	1	1		財 政 部 主 管	766,874,000	766,745,767	—	—	766,745,767
				關 務 署 及 所 屬	29,400,000	29,398,896	—	—	29,398,896
				財 務 支 出	29,400,000	29,398,896	—	—	29,398,896
			1	數 位 建 設	29,400,000	29,398,896	—	—	29,398,896
			1	推動資安基礎建設	29,400,000	29,398,896	—	—	29,398,896
			2	財 政 資 訊 中 心	737,474,000	737,346,871	—	—	737,346,871
5	1	1		財 務 支 出	737,474,000	737,346,871	—	—	737,346,871
				數 位 建 設	737,474,000	737,346,871	—	—	737,346,871
			1	推動資安基礎建設	737,474,000	737,346,871	—	—	737,346,871
				教 育 部 主 管	19,118,260,000	15,319,929,339	95,774,512	3,139,936,757	18,555,640,608
				教 育 部	6,364,678,000	6,088,513,659	—	178,472,904	6,266,986,563
				教 育 支 出	6,364,678,000	6,088,513,659	—	178,472,904	6,266,986,563
			1	數 位 建 設	4,820,333,000	4,649,874,120	—	101,972,904	4,751,847,024
			1	推動資安基礎建設	607,600,000	584,928,400	—	20,250,172	605,178,572
			2	保障寬頻人權	140,244,000	138,604,857	—	—	138,604,857
			3	建設下世代科研 與智慧學習環境	4,072,489,000	3,926,340,863	—	81,722,732	4,008,063,595
			2	城 鄉 建 設	49,098,000	47,675,955	—	—	47,675,955
			1	校園社區化改造	49,098,000	47,675,955	—	—	47,675,955
			3	人才培育促進就業 建設	1,495,247,000	1,390,963,584	—	76,500,000	1,467,463,584
			2	國民及學前教育署	6,107,422,000	6,021,908,377	—	37,003,673	6,058,912,050
				教 育 支 出	6,107,422,000	6,021,908,377	—	37,003,673	6,058,912,050
		1		數 位 建 設	1,378,442,000	1,367,054,636	—	—	1,367,054,636
			1	建設下世代科研 與智慧學習環境	1,378,442,000	1,367,054,636	—	—	1,367,054,636

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
43,881,132	—	2,065,868	45,947,000	0.02	—	—	—	—
43,881,132	—	2,065,868	45,947,000	0.02	—	—	—	—
43,881,132	—	2,065,868	45,947,000	0.02	—	—	—	—
766,745,767	—	—	766,745,767	0.35	- 128,233	- 0.02	—	—
29,398,896	—	—	29,398,896	0.01	- 1,104	- 0.00	—	—
29,398,896	—	—	29,398,896	0.01	- 1,104	- 0.00	—	—
29,398,896	—	—	29,398,896	0.01	- 1,104	- 0.00	—	—
29,398,896	—	—	29,398,896	0.01	- 1,104	- 0.00	—	—
29,398,896	—	—	29,398,896	0.01	- 1,104	- 0.00	—	—
737,346,871	—	—	737,346,871	0.34	- 127,129	- 0.02	—	—
737,346,871	—	—	737,346,871	0.34	- 127,129	- 0.02	—	—
737,346,871	—	—	737,346,871	0.34	- 127,129	- 0.02	—	—
737,346,871	—	—	737,346,871	0.34	- 127,129	- 0.02	—	—
14,425,161,661	95,774,512	4,034,704,435	18,555,640,608	8.58	- 562,619,392	- 2.94	—	—
6,088,513,659	—	178,472,904	6,266,986,563	2.90	- 97,691,437	- 1.53	—	—
6,088,513,659	—	178,472,904	6,266,986,563	2.90	- 97,691,437	- 1.53	—	—
4,649,874,120	—	101,972,904	4,751,847,024	2.20	- 68,485,976	- 1.42	—	—
584,928,400	—	20,250,172	605,178,572	0.28	- 2,421,428	- 0.40	—	—
138,604,857	—	—	138,604,857	0.06	- 1,639,143	- 1.17	—	—
3,926,340,863	—	81,722,732	4,008,063,595	1.85	- 64,425,405	- 1.58	—	—
47,675,955	—	—	47,675,955	0.02	- 1,422,045	- 2.90	—	—
47,675,955	—	—	47,675,955	0.02	- 1,422,045	- 2.90	—	—
1,390,963,584	—	76,500,000	1,467,463,584	0.68	- 27,783,416	- 1.86	—	—
5,829,492,462	—	229,419,588	6,058,912,050	2.80	- 48,509,950	- 0.79	—	—
5,829,492,462	—	229,419,588	6,058,912,050	2.80	- 48,509,950	- 0.79	—	—
1,367,054,636	—	—	1,367,054,636	0.63	- 11,387,364	- 0.83	—	—
1,367,054,636	—	—	1,367,054,636	0.63	- 11,387,364	- 0.83	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
5	2	2		城 鄉 建 設	1,234,599,000	1,195,861,723	—	33,452,673	1,229,314,396
			1	校園社區化改造	1,234,599,000	1,195,861,723	—	33,452,673	1,229,314,396
			3	少子化友善育兒空間建設	764,395,000	735,134,012	—	3,551,000	738,685,012
			4	人才培育促進就業建設	2,729,986,000	2,723,858,006	—	—	2,723,858,006
	3			體 育 署	6,635,800,000	3,199,159,820	95,774,512	2,924,460,180	6,219,394,512
				教 育 支 出	179,800,000	135,168,975	27,982,414	15,661,000	178,812,389
			1	城 鄉 建 設	179,800,000	135,168,975	27,982,414	15,661,000	178,812,389
			1	校園社區化改造	179,800,000	135,168,975	27,982,414	15,661,000	178,812,389
				文 化 支 出	6,456,000,000	3,063,990,845	67,792,098	2,908,799,180	6,040,582,123
			2	城 鄉 建 設	6,456,000,000	3,063,990,845	67,792,098	2,908,799,180	6,040,582,123
			1	營造休閒運動環境	6,456,000,000	3,063,990,845	67,792,098	2,908,799,180	6,040,582,123
	4			國 家 圖 書 館	180,000	180,000	—	—	180,000
				文 化 支 出	180,000	180,000	—	—	180,000
			1	數 位 建 設	180,000	180,000	—	—	180,000
			1	保障寬頻人權	180,000	180,000	—	—	180,000
	5			國立公共資訊圖書館	10,180,000	10,167,483	—	—	10,167,483
				文 化 支 出	10,180,000	10,167,483	—	—	10,167,483
			1	數 位 建 設	10,180,000	10,167,483	—	—	10,167,483
			1	保障寬頻人權	10,180,000	10,167,483	—	—	10,167,483
6				法 務 部 主 管	89,180,000	89,180,000	—	—	89,180,000
	1			法 務 部	79,380,000	79,380,000	—	—	79,380,000
				司 法 支 出	79,380,000	79,380,000	—	—	79,380,000
			1	數 位 建 設	79,380,000	79,380,000	—	—	79,380,000
			1	推動資安基礎建設	79,380,000	79,380,000	—	—	79,380,000
	2			臺 灣 高 等 檢 察 署	9,800,000	9,800,000	—	—	9,800,000
				司 法 支 出	9,800,000	9,800,000	—	—	9,800,000

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決算審定數與 預算數比較增減		決算審定數與 決算數比較增減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,032,954,820	—	196,359,576	1,229,314,396	0.57	- 5,284,604	- 0.43	—	—
1,032,954,820	—	196,359,576	1,229,314,396	0.57	- 5,284,604	- 0.43	—	—
705,625,000	—	33,060,012	738,685,012	0.34	- 25,709,988	- 3.36	—	—
2,723,858,006	—	—	2,723,858,006	1.26	- 6,127,994	- 0.22	—	—
2,496,808,057	95,774,512	3,626,811,943	6,219,394,512	2.88	- 416,405,488	- 6.28	—	—
118,224,831	27,982,414	32,605,144	178,812,389	0.08	- 987,611	- 0.55	—	—
118,224,831	27,982,414	32,605,144	178,812,389	0.08	- 987,611	- 0.55	—	—
118,224,831	27,982,414	32,605,144	178,812,389	0.08	- 987,611	- 0.55	—	—
2,378,583,226	67,792,098	3,594,206,799	6,040,582,123	2.79	- 415,417,877	- 6.43	—	—
2,378,583,226	67,792,098	3,594,206,799	6,040,582,123	2.79	- 415,417,877	- 6.43	—	—
2,378,583,226	67,792,098	3,594,206,799	6,040,582,123	2.79	- 415,417,877	- 6.43	—	—
180,000	—	—	180,000	0.00	—	—	—	—
180,000	—	—	180,000	0.00	—	—	—	—
180,000	—	—	180,000	0.00	—	—	—	—
180,000	—	—	180,000	0.00	—	—	—	—
10,167,483	—	—	10,167,483	0.00	- 12,517	- 0.12	—	—
10,167,483	—	—	10,167,483	0.00	- 12,517	- 0.12	—	—
10,167,483	—	—	10,167,483	0.00	- 12,517	- 0.12	—	—
10,167,483	—	—	10,167,483	0.00	- 12,517	- 0.12	—	—
89,180,000	—	—	89,180,000	0.04	—	—	—	—
79,380,000	—	—	79,380,000	0.04	—	—	—	—
79,380,000	—	—	79,380,000	0.04	—	—	—	—
79,380,000	—	—	79,380,000	0.04	—	—	—	—
79,380,000	—	—	79,380,000	0.04	—	—	—	—
9,800,000	—	—	9,800,000	0.00	—	—	—	—
9,800,000	—	—	9,800,000	0.00	—	—	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
6	2	1		數 位 建 設	9,800,000	9,800,000	—	—	9,800,000
			1	推動資安基礎建設	9,800,000	9,800,000	—	—	9,800,000
7				經 濟 部 主 管	59,236,946,000	46,571,593,054	6,289,941,128	3,777,669,825	56,639,204,007
	1			經 濟 部	861,200,000	407,988,632	21,601,594	390,762,929	820,353,155
				科 學 支 出	272,563,000	271,839,519	—	—	271,839,519
		1		數 位 建 設	272,563,000	271,839,519	—	—	271,839,519
		1		推動資安基礎建設	173,449,000	173,142,519	—	—	173,142,519
		2		建構開放政府及 智慧城鄉服務	99,114,000	98,697,000	—	—	98,697,000
				其他經濟服務支出	588,637,000	136,149,113	21,601,594	390,762,929	548,513,636
		2		城 鄉 建 設	588,637,000	136,149,113	21,601,594	390,762,929	548,513,636
		1		公共服務據點整備	588,637,000	136,149,113	21,601,594	390,762,929	548,513,636
	2			工 業 局	9,886,590,000	9,307,729,326	117,106,060	285,037,955	9,709,873,341
				科 學 支 出	5,150,000,000	4,943,482,494	11,419,800	61,863,795	5,016,766,089
		1		數 位 建 設	4,450,000,000	4,254,215,886	11,419,800	61,863,795	4,327,499,481
		1		建構開放政府及 智慧城鄉服務	4,450,000,000	4,254,215,886	11,419,800	61,863,795	4,327,499,481
		2		人才培育促進就業 建設	700,000,000	689,266,608	—	—	689,266,608
				工 業 支 出	4,736,590,000	4,364,246,832	105,686,260	223,174,160	4,693,107,252
		3		城 鄉 建 設	4,736,590,000	4,364,246,832	105,686,260	223,174,160	4,693,107,252
		1		開發在地型產業 園區	4,736,590,000	4,364,246,832	105,686,260	223,174,160	4,693,107,252
	3			標準檢驗局及所屬	279,734,000	276,855,503	—	—	276,855,503
				科 學 支 出	279,734,000	276,855,503	—	—	276,855,503
		1		綠 能 建 設	250,000,000	247,199,503	—	—	247,199,503
		1		前瞻技術驗證及健 全綠色金融機制	250,000,000	247,199,503	—	—	247,199,503
		2		數 位 建 設	29,734,000	29,656,000	—	—	29,656,000
		1		推動資安基礎建設	29,734,000	29,656,000	—	—	29,656,000
4				智 慧 財 產 局	9,911,000	9,830,076	—	—	9,830,076

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
9,800,000	—	—	9,800,000	0.00	—	—	—	—
9,800,000	—	—	9,800,000	0.00	—	—	—	—
46,571,593,054	6,289,941,128	3,777,669,825	56,639,204,007	26.18	- 2,597,741,993	- 4.39	—	—
407,988,632	21,601,594	390,762,929	820,353,155	0.38	- 40,846,845	- 4.74	—	—
271,839,519	—	—	271,839,519	0.13	- 723,481	- 0.27	—	—
271,839,519	—	—	271,839,519	0.13	- 723,481	- 0.27	—	—
173,142,519	—	—	173,142,519	0.08	- 306,481	- 0.18	—	—
98,697,000	—	—	98,697,000	0.05	- 417,000	- 0.42	—	—
136,149,113	21,601,594	390,762,929	548,513,636	0.25	- 40,123,364	- 6.82	—	—
136,149,113	21,601,594	390,762,929	548,513,636	0.25	- 40,123,364	- 6.82	—	—
136,149,113	21,601,594	390,762,929	548,513,636	0.25	- 40,123,364	- 6.82	—	—
9,307,729,326	117,106,060	285,037,955	9,709,873,341	4.49	- 176,716,659	- 1.79	—	—
4,943,482,494	11,419,800	61,863,795	5,016,766,089	2.32	- 133,233,911	- 2.59	—	—
4,254,215,886	11,419,800	61,863,795	4,327,499,481	2.00	- 122,500,519	- 2.75	—	—
4,254,215,886	11,419,800	61,863,795	4,327,499,481	2.00	- 122,500,519	- 2.75	—	—
689,266,608	—	—	689,266,608	0.32	- 10,733,392	- 1.53	—	—
4,364,246,832	105,686,260	223,174,160	4,693,107,252	2.17	- 43,482,748	- 0.92	—	—
4,364,246,832	105,686,260	223,174,160	4,693,107,252	2.17	- 43,482,748	- 0.92	—	—
4,364,246,832	105,686,260	223,174,160	4,693,107,252	2.17	- 43,482,748	- 0.92	—	—
276,855,503	—	—	276,855,503	0.13	- 2,878,497	- 1.03	—	—
276,855,503	—	—	276,855,503	0.13	- 2,878,497	- 1.03	—	—
247,199,503	—	—	247,199,503	0.11	- 2,800,497	- 1.12	—	—
247,199,503	—	—	247,199,503	0.11	- 2,800,497	- 1.12	—	—
29,656,000	—	—	29,656,000	0.01	- 78,000	- 0.26	—	—
29,656,000	—	—	29,656,000	0.01	- 78,000	- 0.26	—	—
9,830,076	—	—	9,830,076	0.00	- 80,924	- 0.82	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
7	4	1	1	科 學 支 出	9,911,000	9,830,076	—	—	9,830,076
				數 位 建 設	9,911,000	9,830,076	—	—	9,830,076
				推動資安基礎建設	9,911,000	9,830,076	—	—	9,830,076
			5	水 利 署 及 所 屬	38,234,135,000	30,081,547,641	5,825,079,230	280,694,234	36,187,321,105
				科 學 支 出	455,924,000	440,434,115	—	3,491,000	443,925,115
				數 位 建 設	455,924,000	440,434,115	—	3,491,000	443,925,115
				推動資安基礎建設	128,848,000	125,314,274	—	3,491,000	128,805,274
				建構開放政府及 智慧城鄉服務	327,076,000	315,119,841	—	—	315,119,841
				農 業 支 出	37,778,211,000	29,641,113,526	5,825,079,230	277,203,234	35,743,395,990
				水 環 境 建 設	37,778,211,000	29,641,113,526	5,825,079,230	277,203,234	35,743,395,990
				1 水 與 發 展	18,178,725,000	15,347,703,684	2,208,002,897	46,024,999	17,601,731,580
				2 水 與 安 全	13,950,000,000	11,924,945,320	1,926,426,394	28,202,551	13,879,574,265
				3 水 與 環 境	5,649,486,000	2,368,464,522	1,690,649,939	202,975,684	4,262,090,145
	6	2	1	中 小 企 業 處	2,441,537,000	1,599,677,060	34,539,998	696,924,939	2,331,141,997
				科 學 支 出	547,958,000	522,591,937	—	—	522,591,937
				數 位 建 設	547,958,000	522,591,937	—	—	522,591,937
				1 保障寬頻人權	151,503,000	151,502,544	—	—	151,502,544
				2 建構開放政府及 智慧城鄉服務	396,455,000	371,089,393	—	—	371,089,393
				其他經濟服務支出	1,893,579,000	1,077,085,123	34,539,998	696,924,939	1,808,550,060
				城 鄉 建 設	1,893,579,000	1,077,085,123	34,539,998	696,924,939	1,808,550,060
				1 開發在地型產業 園區	1,893,579,000	1,077,085,123	34,539,998	696,924,939	1,808,550,060
				加工出口區管理處及 所屬	2,026,481,000	1,129,233,777	291,614,246	605,632,977	2,026,481,000
				科 學 支 出	29,734,000	29,734,000	—	—	29,734,000
	7	1	1	數 位 建 設	29,734,000	29,734,000	—	—	29,734,000
				推動資安基礎建設	29,734,000	29,734,000	—	—	29,734,000
				工 業 支 出	1,996,747,000	1,099,499,777	291,614,246	605,632,977	1,996,747,000

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
9,830,076	—	—	9,830,076	0.00	- 80,924	- 0.82	—	—
9,830,076	—	—	9,830,076	0.00	- 80,924	- 0.82	—	—
9,830,076	—	—	9,830,076	0.00	- 80,924	- 0.82	—	—
30,081,547,641	5,825,079,230	280,694,234	36,187,321,105	16.73	- 2,046,813,895	- 5.35	—	—
440,434,115	—	3,491,000	443,925,115	0.21	- 11,998,885	- 2.63	—	—
440,434,115	—	3,491,000	443,925,115	0.21	- 11,998,885	- 2.63	—	—
125,314,274	—	3,491,000	128,805,274	0.06	- 42,726	- 0.03	—	—
315,119,841	—	—	315,119,841	0.15	- 11,956,159	- 3.66	—	—
29,641,113,526	5,825,079,230	277,203,234	35,743,395,990	16.52	- 2,034,815,010	- 5.39	—	—
29,641,113,526	5,825,079,230	277,203,234	35,743,395,990	16.52	- 2,034,815,010	- 5.39	—	—
15,347,703,684	2,208,002,897	46,024,999	17,601,731,580	8.14	- 576,993,420	- 3.17	—	—
11,924,945,320	1,926,426,394	28,202,551	13,879,574,265	6.42	- 70,425,735	- 0.50	—	—
2,368,464,522	1,690,649,939	202,975,684	4,262,090,145	1.97	- 1,387,395,855	- 24.56	—	—
1,599,677,060	34,539,998	696,924,939	2,331,141,997	1.08	- 110,395,003	- 4.52	—	—
522,591,937	—	—	522,591,937	0.24	- 25,366,063	- 4.63	—	—
522,591,937	—	—	522,591,937	0.24	- 25,366,063	- 4.63	—	—
151,502,544	—	—	151,502,544	0.07	- 456	- 0.00	—	—
371,089,393	—	—	371,089,393	0.17	- 25,365,607	- 6.40	—	—
1,077,085,123	34,539,998	696,924,939	1,808,550,060	0.84	- 85,028,940	- 4.49	—	—
1,077,085,123	34,539,998	696,924,939	1,808,550,060	0.84	- 85,028,940	- 4.49	—	—
1,077,085,123	34,539,998	696,924,939	1,808,550,060	0.84	- 85,028,940	- 4.49	—	—
1,129,233,777	291,614,246	605,632,977	2,026,481,000	0.94	—	—	—	—
29,734,000	—	—	29,734,000	0.01	—	—	—	—
29,734,000	—	—	29,734,000	0.01	—	—	—	—
29,734,000	—	—	29,734,000	0.01	—	—	—	—
1,099,499,777	291,614,246	605,632,977	1,996,747,000	0.92	—	—	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
7	7	2		城 鄉 建 設	1,996,747,000	1,099,499,777	291,614,246	605,632,977	1,996,747,000
			1	開發在地型產業 園區	1,996,747,000	1,099,499,777	291,614,246	605,632,977	1,996,747,000
	8			能 源 局	5,497,358,000	3,758,731,039	—	1,518,616,791	5,277,347,830
				工 業 支 出	5,497,358,000	3,758,731,039	—	1,518,616,791	5,277,347,830
		1		綠 能 建 設	5,497,358,000	3,758,731,039	—	1,518,616,791	5,277,347,830
			1	完備綠能技術及 建設	2,140,858,000	466,841,000	—	1,479,429,791	1,946,270,791
			2	加速綠能科學城 建置	2,196,500,000	2,196,478,821	—	—	2,196,478,821
			3	前瞻技術驗證及健 全綠色金融機制	1,160,000,000	1,095,411,218	—	39,187,000	1,134,598,218
8				交 通 部 主 管	56,950,820,000	41,388,095,700	341,348	14,658,357,212	56,046,794,260
	1			交 通 部	20,057,275,000	11,711,101,913	—	7,910,715,628	19,621,817,541
				科 學 支 出	17,760,000	17,535,923	—	—	17,535,923
		1		數 位 建 設	17,760,000	17,535,923	—	—	17,535,923
			1	推動資安基礎建設	17,760,000	17,535,923	—	—	17,535,923
				交 通 支 出	20,039,515,000	11,693,565,990	—	7,910,715,628	19,604,281,618
		2		營業基金－臺灣鐵 路管理局	8,863,298,000	3,811,480,342	—	5,009,913,075	8,821,393,417
			1	高鐵臺鐵連結成網	1,174,611,000	903,095,946	—	271,515,054	1,174,611,000
			2	臺鐵升級及改善 東部服務	7,382,824,000	2,602,521,396	—	4,738,398,021	7,340,919,417
			3	中南部觀光鐵路	305,863,000	305,863,000	—	—	305,863,000
		3		營業基金－臺灣港 務股份有限公司	1,350,000,000	956,671,201	—	—	956,671,201
			1	完備綠能技術及 建設	1,350,000,000	956,671,201	—	—	956,671,201
		4		軌 道 建 設	9,826,217,000	6,925,414,447	—	2,900,802,553	9,826,217,000
			1	鐵路立體化及通 勤提速	24,000,000	—	—	24,000,000	24,000,000
			2	都市推動捷運	9,802,217,000	6,925,414,447	—	2,876,802,553	9,802,217,000
	2			中 央 氣 象 局	1,142,545,000	1,142,544,772	—	—	1,142,544,772
				科 學 支 出	1,142,545,000	1,142,544,772	—	—	1,142,544,772
		1		數 位 建 設	1,142,545,000	1,142,544,772	—	—	1,142,544,772

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,099,499,777	291,614,246	605,632,977	1,996,747,000	0.92	—	—	—	—
1,099,499,777	291,614,246	605,632,977	1,996,747,000	0.92	—	—	—	—
3,758,731,039	—	1,518,616,791	5,277,347,830	2.44	- 220,010,170	- 4.00	—	—
3,758,731,039	—	1,518,616,791	5,277,347,830	2.44	- 220,010,170	- 4.00	—	—
3,758,731,039	—	1,518,616,791	5,277,347,830	2.44	- 220,010,170	- 4.00	—	—
466,841,000	—	1,479,429,791	1,946,270,791	0.90	- 194,587,209	- 9.09	—	—
2,196,478,821	—	—	2,196,478,821	1.02	- 21,179	- 0.00	—	—
1,095,411,218	—	39,187,000	1,134,598,218	0.52	- 25,401,782	- 2.19	—	—
41,388,095,700	341,348	14,658,357,212	56,046,794,260	25.91	- 904,025,740	- 1.59	—	—
11,711,101,913	—	7,910,715,628	19,621,817,541	9.07	- 435,457,459	- 2.17	—	—
17,535,923	—	—	17,535,923	0.01	- 224,077	- 1.26	—	—
17,535,923	—	—	17,535,923	0.01	- 224,077	- 1.26	—	—
17,535,923	—	—	17,535,923	0.01	- 224,077	- 1.26	—	—
11,693,565,990	—	7,910,715,628	19,604,281,618	9.06	- 435,233,382	- 2.17	—	—
3,811,480,342	—	5,009,913,075	8,821,393,417	4.08	- 41,904,583	- 0.47	—	—
903,095,946	—	271,515,054	1,174,611,000	0.54	—	—	—	—
2,602,521,396	—	4,738,398,021	7,340,919,417	3.39	- 41,904,583	- 0.57	—	—
305,863,000	—	—	305,863,000	0.14	—	—	—	—
956,671,201	—	—	956,671,201	0.44	- 393,328,799	- 29.14	—	—
956,671,201	—	—	956,671,201	0.44	- 393,328,799	- 29.14	—	—
6,925,414,447	—	2,900,802,553	9,826,217,000	4.54	—	—	—	—
—	—	24,000,000	24,000,000	0.01	—	—	—	—
6,925,414,447	—	2,876,802,553	9,802,217,000	4.53	—	—	—	—
1,142,544,772	—	—	1,142,544,772	0.53	- 228	- 0.00	—	—
1,142,544,772	—	—	1,142,544,772	0.53	- 228	- 0.00	—	—
1,142,544,772	—	—	1,142,544,772	0.53	- 228	- 0.00	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
8	2	1	1	建構開放政府及智慧城鄉服務	1,093,212,000	1,093,211,772	—	—	1,093,211,772
			2	推動資安基礎建設	49,333,000	49,333,000	—	—	49,333,000
	3			觀光局及所屬	600,000,000	473,490,913	—	23,057,806	496,548,719
				其他經濟服務支出	600,000,000	473,490,913	—	23,057,806	496,548,719
	1			水環境建設	600,000,000	473,490,913	—	23,057,806	496,548,719
				水與環境	600,000,000	473,490,913	—	23,057,806	496,548,719
	4			公路總局及所屬	12,653,831,000	11,613,749,173	—	1,040,081,827	12,653,831,000
				交通支出	12,653,831,000	11,613,749,173	—	1,040,081,827	12,653,831,000
	1			綠能建設	674,502,000	639,397,390	—	35,104,610	674,502,000
				加速綠能科學城建置	674,502,000	639,397,390	—	35,104,610	674,502,000
	2			城鄉建設	11,619,200,000	10,635,044,441	—	984,155,559	11,619,200,000
				改善停車問題	3,650,000,000	2,929,360,113	—	720,639,887	3,650,000,000
	2			提升道路品質	7,969,200,000	7,705,684,328	—	263,515,672	7,969,200,000
				水環境建設	360,129,000	339,307,342	—	20,821,658	360,129,000
	1			水與安全	360,129,000	339,307,342	—	20,821,658	360,129,000
	5			鐵道局及所屬	22,497,169,000	16,447,208,929	341,348	5,684,501,951	22,132,052,228
				交通支出	22,497,169,000	16,447,208,929	341,348	5,684,501,951	22,132,052,228
	1			軌道建設	22,497,169,000	16,447,208,929	341,348	5,684,501,951	22,132,052,228
				高鐵臺鐵連結成網	20,000,000	3,496,500	—	16,503,500	20,000,000
	2			臺鐵升級及改善東部服務	12,714,284,000	9,870,566,636	341,348	2,479,070,016	12,349,978,000
				鐵路立體化及通勤提速	9,084,485,000	6,411,605,539	—	2,672,068,689	9,083,674,228
	4			都市推動捷運	623,400,000	161,540,254	—	461,859,746	623,400,000
				中南部觀光鐵路	55,000,000	—	—	55,000,000	55,000,000
9	1			原子能委員會主管	196,000,000	195,975,027	—	—	195,975,027
				核能研究所	196,000,000	195,975,027	—	—	195,975,027
				科學支出	196,000,000	195,975,027	—	—	195,975,027

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,093,211,772	—	—	1,093,211,772	0.51	- 228	- 0.00	—	—
49,333,000	—	—	49,333,000	0.02	—	—	—	—
473,490,913	—	23,057,806	496,548,719	0.23	- 103,451,281	- 17.24	—	—
473,490,913	—	23,057,806	496,548,719	0.23	- 103,451,281	- 17.24	—	—
473,490,913	—	23,057,806	496,548,719	0.23	- 103,451,281	- 17.24	—	—
473,490,913	—	23,057,806	496,548,719	0.23	- 103,451,281	- 17.24	—	—
11,613,749,173	—	1,040,081,827	12,653,831,000	5.85	—	—	—	—
11,613,749,173	—	1,040,081,827	12,653,831,000	5.85	—	—	—	—
639,397,390	—	35,104,610	674,502,000	0.31	—	—	—	—
639,397,390	—	35,104,610	674,502,000	0.31	—	—	—	—
10,635,044,441	—	984,155,559	11,619,200,000	5.37	—	—	—	—
2,929,360,113	—	720,639,887	3,650,000,000	1.69	—	—	—	—
7,705,684,328	—	263,515,672	7,969,200,000	3.68	—	—	—	—
339,307,342	—	20,821,658	360,129,000	0.17	—	—	—	—
339,307,342	—	20,821,658	360,129,000	0.17	—	—	—	—
16,447,208,929	341,348	5,684,501,951	22,132,052,228	10.23	- 365,116,772	- 1.62	—	—
16,447,208,929	341,348	5,684,501,951	22,132,052,228	10.23	- 365,116,772	- 1.62	—	—
16,447,208,929	341,348	5,684,501,951	22,132,052,228	10.23	- 365,116,772	- 1.62	—	—
3,496,500	—	16,503,500	20,000,000	0.01	—	—	—	—
9,870,566,636	341,348	2,479,070,016	12,349,978,000	5.71	- 364,306,000	- 2.87	—	—
6,411,605,539	—	2,672,068,689	9,083,674,228	4.20	- 810,772	- 0.01	—	—
161,540,254	—	461,859,746	623,400,000	0.29	—	—	—	—
—	—	55,000,000	55,000,000	0.03	—	—	—	—
195,975,027	—	—	195,975,027	0.09	- 24,973	- 0.01	—	—
195,975,027	—	—	195,975,027	0.09	- 24,973	- 0.01	—	—
195,975,027	—	—	195,975,027	0.09	- 24,973	- 0.01	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
9	1	1		綠 能 建 設	196,000,000	195,975,027	—	—	195,975,027
			1	前瞻技術驗證及健全綠色金融機制	196,000,000	195,975,027	—	—	195,975,027
10				農 業 委 員 會 主 管	7,405,468,000	6,475,822,092	198,568,437	306,650,630	6,981,041,159
	1			農 業 委 員 會	2,385,320,000	2,264,221,470	37,596,688	24,050,557	2,325,868,715
				農 業 支 出	2,385,320,000	2,264,221,470	37,596,688	24,050,557	2,325,868,715
		1		水 環 境 建 設	2,107,000,000	1,994,218,625	37,596,688	24,050,557	2,055,865,870
			1	水 與 安 全	1,960,000,000	1,872,961,244	37,596,688	15,310,557	1,925,868,489
			2	水 與 環 境	147,000,000	121,257,381	—	8,740,000	129,997,381
		2		數 位 建 設	278,320,000	270,002,845	—	—	270,002,845
			1	推動資安基礎建設	77,420,000	77,420,000	—	—	77,420,000
			2	建構開放政府及智慧城鄉服務	200,900,000	192,582,845	—	—	192,582,845
	2			林 務 局	1,541,148,000	1,382,158,005	7,032,722	140,952,298	1,530,143,025
				農 業 支 出	1,541,148,000	1,382,158,005	7,032,722	140,952,298	1,530,143,025
		1		軌 道 建 設	433,748,000	295,165,560	6,281,153	132,028,229	433,474,942
			1	中南部觀光鐵路	433,748,000	295,165,560	6,281,153	132,028,229	433,474,942
		2		水 環 境 建 設	1,078,000,000	1,060,892,445	751,569	5,624,069	1,067,268,083
			1	水 與 發 展	1,078,000,000	1,060,892,445	751,569	5,624,069	1,067,268,083
		3		數 位 建 設	29,400,000	26,100,000	—	3,300,000	29,400,000
			1	推動資安基礎建設	29,400,000	26,100,000	—	3,300,000	29,400,000
	3			水 土 保 持 局	2,518,600,000	2,075,544,447	33,827,936	78,435,323	2,187,807,706
				農 業 支 出	2,518,600,000	2,075,544,447	33,827,936	78,435,323	2,187,807,706
		1		水 環 境 建 設	2,489,200,000	2,046,179,625	33,827,936	78,435,323	2,158,442,884
			1	水 與 發 展	2,489,200,000	2,046,179,625	33,827,936	78,435,323	2,158,442,884
		2		數 位 建 設	29,400,000	29,364,822	—	—	29,364,822
			1	推動資安基礎建設	29,400,000	29,364,822	—	—	29,364,822
	4			漁 業 署 及 所 屬	931,000,000	724,500,244	120,111,091	63,212,452	907,823,787
				農 業 支 出	931,000,000	724,500,244	120,111,091	63,212,452	907,823,787

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
195,975,027	—	—	195,975,027	0.09	- 24,973	- 0.01	—	—
195,975,027	—	—	195,975,027	0.09	- 24,973	- 0.01	—	—
6,475,822,092	198,568,437	306,650,630	6,981,041,159	3.23	- 424,426,841	- 5.73	—	—
2,264,221,470	37,596,688	24,050,557	2,325,868,715	1.08	- 59,451,285	- 2.49	—	—
2,264,221,470	37,596,688	24,050,557	2,325,868,715	1.08	- 59,451,285	- 2.49	—	—
1,994,218,625	37,596,688	24,050,557	2,055,865,870	0.95	- 51,134,130	- 2.43	—	—
1,872,961,244	37,596,688	15,310,557	1,925,868,489	0.89	- 34,131,511	- 1.74	—	—
121,257,381	—	8,740,000	129,997,381	0.06	- 17,002,619	- 11.57	—	—
270,002,845	—	—	270,002,845	0.12	- 8,317,155	- 2.99	—	—
77,420,000	—	—	77,420,000	0.04	—	—	—	—
192,582,845	—	—	192,582,845	0.09	- 8,317,155	- 4.14	—	—
1,382,158,005	7,032,722	140,952,298	1,530,143,025	0.71	- 11,004,975	- 0.71	—	—
1,382,158,005	7,032,722	140,952,298	1,530,143,025	0.71	- 11,004,975	- 0.71	—	—
295,165,560	6,281,153	132,028,229	433,474,942	0.20	- 273,058	- 0.06	—	—
295,165,560	6,281,153	132,028,229	433,474,942	0.20	- 273,058	- 0.06	—	—
1,060,892,445	751,569	5,624,069	1,067,268,083	0.49	- 10,731,917	- 1.00	—	—
1,060,892,445	751,569	5,624,069	1,067,268,083	0.49	- 10,731,917	- 1.00	—	—
26,100,000	—	3,300,000	29,400,000	0.01	—	—	—	—
26,100,000	—	3,300,000	29,400,000	0.01	—	—	—	—
2,075,544,447	33,827,936	78,435,323	2,187,807,706	1.01	- 330,792,294	- 13.13	—	—
2,075,544,447	33,827,936	78,435,323	2,187,807,706	1.01	- 330,792,294	- 13.13	—	—
2,046,179,625	33,827,936	78,435,323	2,158,442,884	1.00	- 330,757,116	- 13.29	—	—
2,046,179,625	33,827,936	78,435,323	2,158,442,884	1.00	- 330,757,116	- 13.29	—	—
29,364,822	—	—	29,364,822	0.01	- 35,178	- 0.12	—	—
29,364,822	—	—	29,364,822	0.01	- 35,178	- 0.12	—	—
724,500,244	120,111,091	63,212,452	907,823,787	0.42	- 23,176,213	- 2.49	—	—
724,500,244	120,111,091	63,212,452	907,823,787	0.42	- 23,176,213	- 2.49	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
10	4	1		水 環 境 建 設	931,000,000	724,500,244	120,111,091	63,212,452	907,823,787
			1	水 與 環 境	931,000,000	724,500,244	120,111,091	63,212,452	907,823,787
	5			農 糧 署 及 所 屬	29,400,000	29,397,926	—	—	29,397,926
				農 業 支 出	29,400,000	29,397,926	—	—	29,397,926
		1		數 位 建 設	29,400,000	29,397,926	—	—	29,397,926
		1		推動資安基礎建設	29,400,000	29,397,926	—	—	29,397,926
11				衛 生 福 利 部 主 管	7,302,725,000	2,348,727,623	—	4,386,917,979	6,735,645,602
	1			衛 生 福 利 部	3,872,923,000	1,054,304,353	—	2,766,292,771	3,820,597,124
				醫 療 保 健 支 出	3,872,923,000	1,054,304,353	—	2,766,292,771	3,820,597,124
		1		城 鄉 建 設	3,598,523,000	843,474,033	—	2,710,333,756	3,553,807,789
		1		公共服務據點整備	3,598,523,000	843,474,033	—	2,710,333,756	3,553,807,789
		2		數 位 建 設	274,400,000	210,830,320	—	55,959,015	266,789,335
		1		推動資安基礎建設	176,400,000	114,299,070	—	55,959,015	170,258,085
		2		保障寬頻人權	98,000,000	96,531,250	—	—	96,531,250
	2			食 品 藥 物 管 理 署	561,540,000	468,956,346	—	86,124,507	555,080,853
				醫 療 保 健 支 出	561,540,000	468,956,346	—	86,124,507	555,080,853
		1		食 品 安 全 建 設	561,540,000	468,956,346	—	86,124,507	555,080,853
	3			國 民 健 康 署	754,600,000	94,760,417	—	641,070,956	735,831,373
				醫 療 保 健 支 出	754,600,000	94,760,417	—	641,070,956	735,831,373
		1		城 鄉 建 設	754,600,000	94,760,417	—	641,070,956	735,831,373
		1		公共服務據點整備	754,600,000	94,760,417	—	641,070,956	735,831,373
	4			社 會 及 家 庭 署	2,113,662,000	730,706,507	—	893,429,745	1,624,136,252
				福 利 服 務 支 出	2,113,662,000	730,706,507	—	893,429,745	1,624,136,252
		1		城 鄉 建 設	658,852,000	375,928,762	—	189,257,280	565,186,042
		1		公共服務據點整備	658,852,000	375,928,762	—	189,257,280	565,186,042
		2		少子化友善育兒空間建設	1,454,810,000	354,777,745	—	704,172,465	1,058,950,210
12				環 境 保 護 署 主 管	5,052,090,000	2,610,781,137	2,189,321,238	219,616,453	5,019,718,828

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決算審定數與 預算數比較增減		決算審定數與 決算數比較增減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
724,500,244	120,111,091	63,212,452	907,823,787	0.42	- 23,176,213	- 2.49	—	—
724,500,244	120,111,091	63,212,452	907,823,787	0.42	- 23,176,213	- 2.49	—	—
29,397,926	—	—	29,397,926	0.01	- 2,074	- 0.01	—	—
29,397,926	—	—	29,397,926	0.01	- 2,074	- 0.01	—	—
29,397,926	—	—	29,397,926	0.01	- 2,074	- 0.01	—	—
29,397,926	—	—	29,397,926	0.01	- 2,074	- 0.01	—	—
2,348,727,623	—	4,386,917,979	6,735,645,602	3.11	- 567,079,398	- 7.77	—	—
1,054,304,353	—	2,766,292,771	3,820,597,124	1.77	- 52,325,876	- 1.35	—	—
1,054,304,353	—	2,766,292,771	3,820,597,124	1.77	- 52,325,876	- 1.35	—	—
843,474,033	—	2,710,333,756	3,553,807,789	1.64	- 44,715,211	- 1.24	—	—
843,474,033	—	2,710,333,756	3,553,807,789	1.64	- 44,715,211	- 1.24	—	—
210,830,320	—	55,959,015	266,789,335	0.12	- 7,610,665	- 2.77	—	—
114,299,070	—	55,959,015	170,258,085	0.08	- 6,141,915	- 3.48	—	—
96,531,250	—	—	96,531,250	0.04	- 1,468,750	- 1.50	—	—
468,956,346	—	86,124,507	555,080,853	0.26	- 6,459,147	- 1.15	—	—
468,956,346	—	86,124,507	555,080,853	0.26	- 6,459,147	- 1.15	—	—
468,956,346	—	86,124,507	555,080,853	0.26	- 6,459,147	- 1.15	—	—
94,760,417	—	641,070,956	735,831,373	0.34	- 18,768,627	- 2.49	—	—
94,760,417	—	641,070,956	735,831,373	0.34	- 18,768,627	- 2.49	—	—
94,760,417	—	641,070,956	735,831,373	0.34	- 18,768,627	- 2.49	—	—
94,760,417	—	641,070,956	735,831,373	0.34	- 18,768,627	- 2.49	—	—
730,706,507	—	893,429,745	1,624,136,252	0.75	- 489,525,748	- 23.16	—	—
730,706,507	—	893,429,745	1,624,136,252	0.75	- 489,525,748	- 23.16	—	—
375,928,762	—	189,257,280	565,186,042	0.26	- 93,665,958	- 14.22	—	—
375,928,762	—	189,257,280	565,186,042	0.26	- 93,665,958	- 14.22	—	—
354,777,745	—	704,172,465	1,058,950,210	0.49	- 395,859,790	- 27.21	—	—
2,610,781,137	2,189,321,238	219,616,453	5,019,718,828	2.32	- 32,371,172	- 0.64	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
12	1			環 境 保 護 署	5,052,090,000	2,610,781,137	2,189,321,238	219,616,453	5,019,718,828
				環 境 保 護 支 出	5,052,090,000	2,610,781,137	2,189,321,238	219,616,453	5,019,718,828
		1		水 環 境 建 設	4,399,025,000	2,150,048,186	2,189,321,238	42,629,536	4,381,998,960
			1	水 與 發 展	299,025,000	141,757,322	152,562,994	3,000,000	297,320,316
			2	水 與 環 境	4,100,000,000	2,008,290,864	2,036,758,244	39,629,536	4,084,678,644
		2		數 位 建 設	653,065,000	460,732,951	—	176,986,917	637,719,868
			1	建構開放政府及 智慧城鄉服務	653,065,000	460,732,951	—	176,986,917	637,719,868
13				文 化 部 主 管	15,436,677,000	11,675,254,361	98,046,982	3,352,144,495	15,125,445,838
	1			文 化 部	9,064,444,000	7,732,689,637	94,885,334	1,191,703,125	9,019,278,096
				文 化 支 出	9,064,444,000	7,732,689,637	94,885,334	1,191,703,125	9,019,278,096
		1		數 位 建 設	2,167,106,000	1,830,328,901	46,216,274	264,894,770	2,141,439,945
			1	推動資安基礎建設	79,380,000	79,343,940	—	—	79,343,940
			2	發展數位文創	2,087,726,000	1,750,984,961	46,216,274	264,894,770	2,062,096,005
		2		城 鄉 建 設	6,897,338,000	5,902,360,736	48,669,060	926,808,355	6,877,838,151
			1	文化生活圈建設	6,897,338,000	5,902,360,736	48,669,060	926,808,355	6,877,838,151
	2			文 化 資 產 局	4,900,000,000	3,126,077,970	—	1,559,841,294	4,685,919,264
				文 化 支 出	4,900,000,000	3,126,077,970	—	1,559,841,294	4,685,919,264
		1		城 鄉 建 設	4,900,000,000	3,126,077,970	—	1,559,841,294	4,685,919,264
			1	文化生活圈建設	4,900,000,000	3,126,077,970	—	1,559,841,294	4,685,919,264
	3			影視及流行音樂產業局	773,591,000	407,403,128	—	314,262,050	721,665,178
				文 化 支 出	773,591,000	407,403,128	—	314,262,050	721,665,178
		1		數 位 建 設	773,591,000	407,403,128	—	314,262,050	721,665,178
			1	發展數位文創	773,591,000	407,403,128	—	314,262,050	721,665,178
	4			國 立 傳 統 藝 術 中 心	19,600,000	19,599,999	—	—	19,599,999
				文 化 支 出	19,600,000	19,599,999	—	—	19,599,999
		1		數 位 建 設	19,600,000	19,599,999	—	—	19,599,999
			1	發展數位文創	19,600,000	19,599,999	—	—	19,599,999

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
2,610,781,137	2,189,321,238	219,616,453	5,019,718,828	2.32	- 32,371,172	- 0.64	—	—
2,610,781,137	2,189,321,238	219,616,453	5,019,718,828	2.32	- 32,371,172	- 0.64	—	—
2,150,048,186	2,189,321,238	42,629,536	4,381,998,960	2.03	- 17,026,040	- 0.39	—	—
141,757,322	152,562,994	3,000,000	297,320,316	0.14	- 1,704,684	- 0.57	—	—
2,008,290,864	2,036,758,244	39,629,536	4,084,678,644	1.89	- 15,321,356	- 0.37	—	—
460,732,951	—	176,986,917	637,719,868	0.29	- 15,345,132	- 2.35	—	—
460,732,951	—	176,986,917	637,719,868	0.29	- 15,345,132	- 2.35	—	—
11,675,254,361	98,046,982	3,352,144,495	15,125,445,838	6.99	- 311,231,162	- 2.02	—	—
7,732,689,637	94,885,334	1,191,703,125	9,019,278,096	4.17	- 45,165,904	- 0.50	—	—
7,732,689,637	94,885,334	1,191,703,125	9,019,278,096	4.17	- 45,165,904	- 0.50	—	—
1,830,328,901	46,216,274	264,894,770	2,141,439,945	0.99	- 25,666,055	- 1.18	—	—
79,343,940	—	—	79,343,940	0.04	- 36,060	- 0.05	—	—
1,750,984,961	46,216,274	264,894,770	2,062,096,005	0.95	- 25,629,995	- 1.23	—	—
5,902,360,736	48,669,060	926,808,355	6,877,838,151	3.18	- 19,499,849	- 0.28	—	—
5,902,360,736	48,669,060	926,808,355	6,877,838,151	3.18	- 19,499,849	- 0.28	—	—
3,126,077,970	—	1,559,841,294	4,685,919,264	2.17	- 214,080,736	- 4.37	—	—
3,126,077,970	—	1,559,841,294	4,685,919,264	2.17	- 214,080,736	- 4.37	—	—
3,126,077,970	—	1,559,841,294	4,685,919,264	2.17	- 214,080,736	- 4.37	—	—
3,126,077,970	—	1,559,841,294	4,685,919,264	2.17	- 214,080,736	- 4.37	—	—
407,403,128	—	314,262,050	721,665,178	0.33	- 51,925,822	- 6.71	—	—
407,403,128	—	314,262,050	721,665,178	0.33	- 51,925,822	- 6.71	—	—
407,403,128	—	314,262,050	721,665,178	0.33	- 51,925,822	- 6.71	—	—
407,403,128	—	314,262,050	721,665,178	0.33	- 51,925,822	- 6.71	—	—
19,599,999	—	—	19,599,999	0.01	- 1	- 0.00	—	—
19,599,999	—	—	19,599,999	0.01	- 1	- 0.00	—	—
19,599,999	—	—	19,599,999	0.01	- 1	- 0.00	—	—
19,599,999	—	—	19,599,999	0.01	- 1	- 0.00	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
13	5	1	1	國立臺灣美術館及所屬	47,922,000	46,942,000	980,000	—	47,922,000
				文 化 支 出	47,922,000	46,942,000	980,000	—	47,922,000
				城 鄉 建 設	47,922,000	46,942,000	980,000	—	47,922,000
				文化生活圈建設	47,922,000	46,942,000	980,000	—	47,922,000
				國立臺灣工藝研究發展中心	56,840,000	56,840,000	—	—	56,840,000
				文 化 支 出	56,840,000	56,840,000	—	—	56,840,000
				數 位 建 設	9,800,000	9,800,000	—	—	9,800,000
				發展數位文創	9,800,000	9,800,000	—	—	9,800,000
				城 鄉 建 設	47,040,000	47,040,000	—	—	47,040,000
				文化生活圈建設	47,040,000	47,040,000	—	—	47,040,000
	6	1	1	國立臺灣博物館	135,240,000	135,181,301	—	—	135,181,301
				文 化 支 出	135,240,000	135,181,301	—	—	135,181,301
				數 位 建 設	37,240,000	37,240,000	—	—	37,240,000
				發展數位文創	37,240,000	37,240,000	—	—	37,240,000
				城 鄉 建 設	98,000,000	97,941,301	—	—	97,941,301
				文化生活圈建設	98,000,000	97,941,301	—	—	97,941,301
				國立臺灣史前文化博物館	439,040,000	150,520,326	2,181,648	286,338,026	439,040,000
				文 化 支 出	439,040,000	150,520,326	2,181,648	286,338,026	439,040,000
				數 位 建 設	47,040,000	47,040,000	—	—	47,040,000
				發展數位文創	47,040,000	47,040,000	—	—	47,040,000
	7	1	1	城 鄉 建 設	392,000,000	103,480,326	2,181,648	286,338,026	392,000,000
				文化生活圈建設	392,000,000	103,480,326	2,181,648	286,338,026	392,000,000
				科技部主管	12,338,394,000	11,778,816,630	—	201,752,650	11,980,569,280
				科 技 部	11,434,412,000	11,066,418,614	—	30,000,000	11,096,418,614
				科 學 支 出	11,434,412,000	11,066,418,614	—	30,000,000	11,096,418,614
				數 位 建 設	3,634,594,000	3,603,627,414	—	30,000,000	3,633,627,414
				建構開放政府及智慧城鄉服務	593,483,000	592,516,414	—	—	592,516,414

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
46,942,000	980,000	—	47,922,000	0.02	—	—	—	—
46,942,000	980,000	—	47,922,000	0.02	—	—	—	—
46,942,000	980,000	—	47,922,000	0.02	—	—	—	—
46,942,000	980,000	—	47,922,000	0.02	—	—	—	—
56,840,000	—	—	56,840,000	0.03	—	—	—	—
56,840,000	—	—	56,840,000	0.03	—	—	—	—
9,800,000	—	—	9,800,000	0.00	—	—	—	—
9,800,000	—	—	9,800,000	0.00	—	—	—	—
47,040,000	—	—	47,040,000	0.02	—	—	—	—
47,040,000	—	—	47,040,000	0.02	—	—	—	—
135,181,301	—	—	135,181,301	0.06	- 58,699	- 0.04	—	—
135,181,301	—	—	135,181,301	0.06	- 58,699	- 0.04	—	—
37,240,000	—	—	37,240,000	0.02	—	—	—	—
37,240,000	—	—	37,240,000	0.02	—	—	—	—
97,941,301	—	—	97,941,301	0.05	- 58,699	- 0.06	—	—
97,941,301	—	—	97,941,301	0.05	- 58,699	- 0.06	—	—
150,520,326	2,181,648	286,338,026	439,040,000	0.20	—	—	—	—
150,520,326	2,181,648	286,338,026	439,040,000	0.20	—	—	—	—
47,040,000	—	—	47,040,000	0.02	—	—	—	—
47,040,000	—	—	47,040,000	0.02	—	—	—	—
103,480,326	2,181,648	286,338,026	392,000,000	0.18	—	—	—	—
103,480,326	2,181,648	286,338,026	392,000,000	0.18	—	—	—	—
11,778,816,630	—	201,752,650	11,980,569,280	5.54	- 357,824,720	- 2.90	—	—
11,066,418,614	—	30,000,000	11,096,418,614	5.13	- 337,993,386	- 2.96	—	—
11,066,418,614	—	30,000,000	11,096,418,614	5.13	- 337,993,386	- 2.96	—	—
3,603,627,414	—	30,000,000	3,633,627,414	1.68	- 966,586	- 0.03	—	—
592,516,414	—	—	592,516,414	0.27	- 966,586	- 0.16	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
14	1	1	2	建設下世代科研與智慧學習環境	3,041,111,000	3,011,111,000	—	30,000,000	3,041,111,000
			2	非營業特種基金—國家科學技術發展基金	7,799,818,000	7,462,791,200	—	—	7,462,791,200
			1	加速綠能科學城建置	2,822,188,000	2,685,204,374	—	—	2,685,204,374
			2	建構開放政府及智慧城市鄉服務	116,928,000	115,154,642	—	—	115,154,642
			3	推動國際產學聯盟	950,000,000	950,000,000	—	—	950,000,000
			4	青年科技創新創業基地建置	393,035,000	392,930,000	—	—	392,930,000
			5	重點產業高階人才培訓與就業	780,000,000	780,000,000	—	—	780,000,000
			6	年輕學者養成	2,295,502,000	2,131,685,884	—	—	2,131,685,884
			7	領袖學者助攻方案	442,165,000	407,816,300	—	—	407,816,300
			2	中部科學工業園區管理局(中部科學園區管理局)	428,502,000	381,375,598	—	27,419,521	408,795,119
				科學支出	428,502,000	381,375,598	—	27,419,521	408,795,119
				數位建設	428,502,000	381,375,598	—	27,419,521	408,795,119
			3	建設下世代科研與智慧學習環境	428,502,000	381,375,598	—	27,419,521	408,795,119
				南部科學工業園區管理局(南部科學園區管理局)	475,480,000	331,022,418	—	144,333,129	475,355,547
				科學支出	475,480,000	331,022,418	—	144,333,129	475,355,547
			1	數位建設	475,480,000	331,022,418	—	144,333,129	475,355,547
			1	建設下世代科研與智慧學習環境	475,480,000	331,022,418	—	144,333,129	475,355,547
15	1	1	1	金融監督管理委員會主管	14,700,000	14,637,916	—	—	14,637,916
				金融監督管理委員會	14,700,000	14,637,916	—	—	14,637,916
				財務支出	14,700,000	14,637,916	—	—	14,637,916
				數位建設	14,700,000	14,637,916	—	—	14,637,916
				推動資安基礎建設	14,700,000	14,637,916	—	—	14,637,916
16	1	1	1	國軍退除役官兵輔導委員會主管	60,760,000	55,455,774	—	5,301,927	60,757,701
				國軍退除役官兵輔導委員會	60,760,000	55,455,774	—	5,301,927	60,757,701
				福利服務支出	60,760,000	55,455,774	—	5,301,927	60,757,701
				數位建設	60,760,000	55,455,774	—	5,301,927	60,757,701
				推動資安基礎建設	60,760,000	55,455,774	—	5,301,927	60,757,701

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
3,011,111,000	—	30,000,000	3,041,111,000	1.41	—	—	—	—
7,462,791,200	—	—	7,462,791,200	3.45	- 337,026,800	- 4.32	—	—
2,685,204,374	—	—	2,685,204,374	1.24	- 136,983,626	- 4.85	—	—
115,154,642	—	—	115,154,642	0.05	- 1,773,358	- 1.52	—	—
950,000,000	—	—	950,000,000	0.44	—	—	—	—
392,930,000	—	—	392,930,000	0.18	- 105,000	- 0.03	—	—
780,000,000	—	—	780,000,000	0.36	—	—	—	—
2,131,685,884	—	—	2,131,685,884	0.99	- 163,816,116	- 7.14	—	—
407,816,300	—	—	407,816,300	0.19	- 34,348,700	- 7.77	—	—
381,375,598	—	27,419,521	408,795,119	0.19	- 19,706,881	- 4.60	—	—
381,375,598	—	27,419,521	408,795,119	0.19	- 19,706,881	- 4.60	—	—
381,375,598	—	27,419,521	408,795,119	0.19	- 19,706,881	- 4.60	—	—
381,375,598	—	27,419,521	408,795,119	0.19	- 19,706,881	- 4.60	—	—
331,022,418	—	144,333,129	475,355,547	0.22	- 124,453	- 0.03	—	—
331,022,418	—	144,333,129	475,355,547	0.22	- 124,453	- 0.03	—	—
331,022,418	—	144,333,129	475,355,547	0.22	- 124,453	- 0.03	—	—
331,022,418	—	144,333,129	475,355,547	0.22	- 124,453	- 0.03	—	—
14,637,916	—	—	14,637,916	0.01	- 62,084	- 0.42	—	—
14,637,916	—	—	14,637,916	0.01	- 62,084	- 0.42	—	—
14,637,916	—	—	14,637,916	0.01	- 62,084	- 0.42	—	—
14,637,916	—	—	14,637,916	0.01	- 62,084	- 0.42	—	—
14,637,916	—	—	14,637,916	0.01	- 62,084	- 0.42	—	—
55,455,774	—	5,301,927	60,757,701	0.03	- 2,299	- 0.00	—	—
55,455,774	—	5,301,927	60,757,701	0.03	- 2,299	- 0.00	—	—
55,455,774	—	5,301,927	60,757,701	0.03	- 2,299	- 0.00	—	—
55,455,774	—	5,301,927	60,757,701	0.03	- 2,299	- 0.00	—	—
55,455,774	—	5,301,927	60,757,701	0.03	- 2,299	- 0.00	—	—

肆、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目				修 正 內 容	修		
					實	現	數應
款	項	目	名 稱		增	減	增
2	3	1	總 計		—	—	87,931,784
			財 產 收 入		—	—	87,931,784
			營 建 署 及 所 屬		—	—	87,931,784
			廢 舊 物 資 售 價	增列原列於總決算之 廢舊物資售價收入。	—	—	87,931,784

伍、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

中華民國 108 年度

科 目				修 正 內 容	修		
					實	現	數應
款	項	目	名 稱		增	減	增
3	2		總 計		—	1,064,898,426	170,130,748
			內 政 部 主 管		—	170,130,748	170,130,748
			營 建 署 及 所 屬		—	170,130,748	170,130,748
			交 通 支 出		—	170,130,748	170,130,748
5	2	2	城 鄉 建 設	補助地方政府經費，已 達付款款件，尚未支用 逕列實現數。	—	170,130,748	170,130,748
			教 育 部 主 管		—	894,767,678	—
			國 民 及 學 前 教 育 署		—	192,415,915	—
			教 育 支 出		—	192,415,915	—
	3	2	城 鄉 建 設	補助地方政府經費，尚 未支用逕列實現數。	—	162,906,903	—
			少 子 化 友 善 育 兒		—	29,509,012	—
			空 間 建 設		—	702,351,763	—
			體 育 署		—	16,944,144	—
	3	1	教 育 支 出	補助地方政府經費，尚 未支用逕列實現數。	—	16,944,144	—
			城 鄉 建 設		—	685,407,619	—
			文 化 支 出		—	685,407,619	—
			城 鄉 建 設		—	685,407,619	—

特別決算歲入決算修正數明細表

至 109 年度

單位：新臺幣元

正 數					應繳回國庫數	備 註
數	保	留	數	合 計		
減	增	減	增	減		
—	—	—	87,931,784	—	—	屬轉帳性質，毋須繳庫。
—	—	—	87,931,784	—	—	
—	—	—	87,931,784	—	—	
—	—	—	87,931,784	—	—	

特別決算歲出決算修正數明細表

至 109 年度

單位：新臺幣元

正 數					應 繳 回 國 庫 數		備 註
數 保 留		合 計					
減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數	
—	894,767,678	—	1,064,898,426	1,064,898,426	—	—	
—	—	—	170,130,748	170,130,748	—	—	
—	—	—	170,130,748	170,130,748	—	—	
—	—	—	170,130,748	170,130,748	—	—	
—	—	—	170,130,748	170,130,748	—	—	
—	894,767,678	—	894,767,678	894,767,678	—	—	
—	192,415,915	—	192,415,915	192,415,915	—	—	
—	192,415,915	—	192,415,915	192,415,915	—	—	
—	162,906,903	—	162,906,903	162,906,903	—	—	
—	29,509,012	—	29,509,012	29,509,012	—	—	
—	702,351,763	—	702,351,763	702,351,763	—	—	
—	16,944,144	—	16,944,144	16,944,144	—	—	
—	16,944,144	—	16,944,144	16,944,144	—	—	
—	685,407,619	—	685,407,619	685,407,619	—	—	
—	685,407,619	—	685,407,619	685,407,619	—	—	

陸、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算歲入應收保留原因分析簡明表

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
內政部主管 營建署及所屬 財產收入	—	87,931	--	應收出售廢舊物資收入。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

柒、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算歲入超收原因分析簡明表

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
內政部主管 內政部 罰款及賠償收入	—	5,057	5,057	--	廠商逾期違約罰款收入。
營建署及所屬 財產收入	—	87,931	87,931	--	出售廢舊物資收入。
警政署及所屬 罰款及賠償收入	—	2,634	2,634	--	廠商違約罰款收入及沒收履約保證金。
消防署及所屬 罰款及賠償收入	—	28,075	28,075	--	廠商違約罰款收入。
經濟部主管 經濟部 罰款及賠償收入	—	1,624	1,624	--	廠商違約罰款收入。
工業局 罰款及賠償收入	—	3,060	3,060	--	廠商違約罰款收入。
財產收入	—	39,030	39,030	--	自辦工程有價料變賣收入。
其他收入	—	16,389	16,389	--	高雄市政府繳回工程有價料變賣收入。
水利署及所屬 罰款及賠償收入	—	8,615	8,615	--	廠商逾期違約罰款收入。
財產收入	—	12,962	12,962	--	土石方標售收入。
其他收入	—	26,455	26,455	--	地方政府繳回工程有價料變賣收入。

柒、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算歲入超收原因分析簡明表(續)

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
加工出口區管理處及所屬					
財產收入	—	5,373	5,373	--	拆除老舊廠房出售廢舊物資收入。
能源局					
罰款及賠償收入	—	3,890	3,890	--	廠商未依約完成儲能設備，沒收履約保證金。
財產收入	—	6,415	6,415	--	收取高雄海洋科技產業創新專區之海洋工程區土地租金等。
其他收入	—	11,594	11,594	--	收取高雄海洋科技產業創新專區之訓練課程衍生收入。
交通部主管					
公路總局及所屬					
罰款及賠償收入	—	20,589	20,589	--	廠商違約罰款收入。
財產收入	—	205,683	205,683	--	變賣刨除料收入。
其他收入	—	20,566	20,566	--	收回補助地方政府工程結餘款。
鐵道局及所屬					
罰款及賠償收入	—	10,572	10,572	--	廠商逾期違約罰款及賠償等收入。
原子能委員會主管					
核能研究所					
罰款及賠償收入	—	1,114	1,114	--	廠商違約罰款收入。
衛生福利部主管					
衛生福利部					
罰款及賠償收入	—	2,132	2,132	--	整建長照衛福據點計畫工程廠商違約罰款收入。
環境保護署主管					
環境保護署					
罰款及賠償收入	—	1,746	1,746	--	廠商違約罰款收入。
科技部主管					
中部科學工業園區管理局 (中部科學園區管理局)					
罰款及賠償收入	—	5,429	5,429	--	委辦案件終止契約，沒收廠商履約保證金。
南部科學工業園區管理局 (南部科學園區管理局)					
其他收入	—	13,395	13,395	--	園區智慧機器人創新自造基地委託經營團隊依合約規定繳納之回饋金收入。

註：本表所列項目係指超收數達20%且百萬元以上，或3千萬元以上者。

捌、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
行政院主管 行 政 院				
數 位 建 設	1,066,705	170,042	15.94	補助市縣政府辦理強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫，部分補助案尚未完成驗收或結報作業，須保留繼續執行。
原住民族委員會				
城 鄉 建 設	1,319,080	211,213	16.01	補助市縣政府辦理部落之心示範點等計畫，工程尚未完工或完成驗收作業，須保留繼續執行。
客家委員會及所屬				
城 鄉 建 設	1,187,760	53,075	4.47	補助市縣政府辦理客家浪漫臺三線計畫，因多次變更設計，或工期延宕或已完工尚未完成驗收結算程序，須保留繼續執行。
國家通訊傳播委員會				
數 位 建 設	754,497	32,583	4.32	補助辦理數位匯流資通安全分析管理平臺建置與服務計畫未屆履約期限。
內政部主管 內 政 部				
數 位 建 設	568,400	71,491	12.58	內政資料中心資訊基礎設施及維運系統精進案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
城 鄉 建 設	2,274,580	1,442,655	63.43	補助地方政府辦理辦公廳舍及村（里）集會所活動中心補強或興建計畫，因合約期程跨年度，須保留繼續執行。
營建署及所屬				
城 鄉 建 設	5,880,000	1,954,389	33.24	補助地方政府辦理城鎮之心工程計畫，因變更設計，或合約期程跨年度，須保留繼續執行。
城 鄉 建 設	12,740,000	1,989,153	15.61	補助地方政府辦理提升道路品質計畫，因合約期程跨年度、辦理管線遷移作業或辦理驗收及付款作業等，須保留繼續執行。
水環境建設	8,413,202	2,255,081	26.80	補助地方政府辦理水與安全計畫，因合約期程跨年度、辦理管線遷移作業、辦理驗收及付款作業或變更設計等，須保留繼續執行。
警政署及所屬				
城 鄉 建 設	2,025,405	1,218,359	60.15	補助地方警察局耐震補強及修繕工程案，合約期程跨年度、尚未完工驗收等，須保留繼續執行。
消防署及所屬				
數 位 建 設	397,880	73,463	18.46	辦理防救災專用衛星通信系統更新建置案等，受新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫情影響，廠商履約進度延宕等，須保留繼續執行。
城 鄉 建 設	399,840	161,223	40.32	公有危險建築補強重建案部分地方政府消防局廳舍拆除重建、新建及遷建等工程，因多次流標及建築執照核發緩慢等影響執行進度，須保留繼續執行。

捌、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
教 育 部 主 管 教 育 部				
數 位 建 設	4,820,333	101,972	2.12	補助地方政府辦理國民中小學校園數位建設計畫，執行進度未如預期，須保留繼續執行。
人才培育促進 就 業 建 設	1,495,247	76,500	5.12	補助大專校院辦理工具機教學設備更新計畫期程跨年度，須保留繼續執行。
國民及學前教育署				
城 鄉 建 設	1,234,599	196,359	15.90	補助地方政府擴建幼兒園園舍、設置學校社區共讀站等計畫，合約期程跨年度或經費未於年度內結報，須保留繼續執行。
少子化友善育 兒 空 間 建 設	764,395	33,060	4.32	補助地方政府新建幼兒園園舍，合約期程跨年度或經費未於年度內結報，須保留繼續執行。
體 育 署				
城 鄉 建 設	179,800	60,587	33.70	補助地方政府辦理校園社區化改造計畫，因採購多次流廢標影響執行進度或經費未於年度內結報，須保留繼續執行。
城 鄉 建 設	6,456,000	3,661,998	56.72	補助地方政府辦理營造休閒運動環境計畫，因執行期程跨年度或採購多次流廢標影響執行進度，須保留繼續執行。
經 濟 部 主 管 經 濟 部				
城 鄉 建 設	588,637	412,364	70.05	作業期程延後，工程尚未發包，或已發包正持續進行中，須保留繼續執行。
工 業 局				
數 位 建 設	4,450,000	73,283	1.65	高雄市體感科技園區計畫等案件期程跨年度，須保留繼續執行。
城 鄉 建 設	4,736,590	328,860	6.94	屏東工業區污水下水道系統建置等工程期程跨年度，須保留繼續執行。
水利署及所屬				
水 環 境 建 設	37,778,211	6,102,282	16.15	補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善與全國水環境改善等計畫期程跨年度，須保留繼續執行。
中 小 企 業 處				
城 鄉 建 設	1,893,579	731,464	38.63	補助部分地方政府辦理城鄉特色產業園區發展計畫執行進度落後，須保留繼續執行。
加工出口區管理處 及所屬				
城 鄉 建 設	1,996,747	897,247	44.94	高雄園區更新與新建廠辦大樓工程尚在執行，須保留繼續執行。
能 源 局				
綠 能 建 設	5,497,358	1,518,616	27.62	高雄海洋科技產業創新專區等計畫，因當地漁民抗爭或受新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫情等影響執行進度，須保留繼續執行。

捌、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
交通部主管 交通部				
營業基金—臺 灣鐵路管理局	8,863,298	5,009,913	56.52	臺鐵電務智慧化提升計畫辦理環島光纖傳輸網路系統更新及電車線設備改善工程施作等，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
軌 道 建 設	9,826,217	2,900,802	29.52	交通部補助桃園市及高雄市政府辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫及高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫，合約期程跨年度或綜合規劃報告未奉核定，須保留繼續執行。
公路總局及所屬				
綠 能 建 設	674,502	35,104	5.20	台 86 線大潭交流道東向下匝道（往高鐵）拓寬及高發二路新闢工程等 2 案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
城 鄉 建 設	11,619,200	984,155	8.47	補助地方政府辦理改善停車問題計畫及提升道路品質計畫，合約期程跨年度或未完成結報手續等，須保留繼續執行。
鐵道局及所屬				
軌 道 建 設	22,497,169	5,684,843	25.27	軌道技術研究暨驗證中心計畫及臺南市區鐵路地下化計畫等，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
農業委員會主管 農業委員會				
水環境建設	2,107,000	61,647	2.93	補助各農田水利管理處辦理圳路改善工程，受發包作業時程或天災等自然因素影響，未及於年度內完成，須保留繼續執行。
林 務 局				
軌 道 建 設	433,748	138,309	31.89	阿里山林業鐵路第一分道周邊護坡加強及排水改善等工程，受規劃或發包作業時程影響，未及於年度內完成，須保留繼續執行。
水土保持局				
水環境建設	2,489,200	112,263	4.51	辦理加強水庫集水區保育治理計畫，因執行期程跨年度，須保留繼續執行。
漁業署及所屬				
水環境建設	931,000	183,323	19.69	補助地方政府辦理漁業環境營造，因部分計畫多次流標、受天候因素停工及施工履約爭議等，執行進度未如預期，須保留繼續執行。
衛生福利部主管 衛生福利部				
城 鄉 建 設	3,598,523	2,710,333	75.32	整建長照衛福據點計畫補助部分地方政府活化公有閒置空間或土地轉型設置長照資源暨整建社區活動中心，因工程合約期程跨年度、招標作業延誤或多次流標等，須保留繼續執行。
數 位 建 設	274,400	55,959	20.39	備援（份）資料中心基礎設施建置案暨虛擬環境系統儲存設備擴增與無線交換器、網路交換器及伺服器記憶體擴充案，合約期程跨年度或決標期程較晚，須保留繼續執行。

捌、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
食品藥物管理署				
食品安全建設	561,540	86,124	15.34	現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫之先期規劃採購案及委託監造服務案，合約期程跨年度，暨部分補助計畫尚未完成驗收，須保留繼續執行。
國民健康署				
城鄉建設	754,600	641,070	84.96	整建長照衛福據點計畫補助地方政府修建衛生所，合約期程跨年度，或尚未結案撥款，須保留繼續執行。
社會及家庭署				
城鄉建設	658,852	189,257	28.73	整建長照衛福據點計畫補助地方政府修建老人活動中心及公有閒置空間，部分案件合約期程跨年度或尚未完成驗收，須保留繼續執行。
少子化友善育兒空間建設	1,454,810	704,172	48.40	建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫補助地方政府修建綜合社會福利館等案件，因規劃或發包作業期程未如預期，及部分地方政府尚未完成核銷作業等，須保留繼續執行。
環境保護署主管 環境保護署				
水環境建設	4,399,025	2,231,950	50.74	補助地方政府辦理污水截流及水質淨化等水環境改善工作，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
數位建設	653,065	176,986	27.10	與地方政府合辦空氣品質感測器布建計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
文化部主管 文化局				
數位建設	2,167,106	311,111	14.36	推動超高畫質電視內容升級前瞻等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
城鄉建設	6,897,338	975,477	14.14	私有老建築保存再生等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
文化資產局				
城鄉建設	4,900,000	1,559,841	31.83	補助地方政府辦理再造歷史現場計畫，因部分市縣政府辦理招標多次流標或前期規劃設計作業期程延宕，須保留繼續執行。
影視及流行音樂 產業局				
數位建設	773,591	314,262	40.62	超高畫質電視節目製作等補助案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
國立臺灣史前 文化博物館				
城鄉建設	392,000	288,519	73.60	建築景觀再造工程等案件，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
科技部主管 科技部				
數位建設	3,634,594	30,000	0.83	辦理先進人工智慧大數據計算主機與儲存系統採購案，尚未完成驗收，須保留繼續執行。
南部科學工業園區管理局 (南部科學園區管理局)				
數位建設	475,480	144,333	30.36	園區智慧機器人創新自造基地計畫之補助案件，合約期程跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

玖、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算歲出賸餘原因分析簡明表

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
總統府主管 中央研究院 數位建設	604,170	34,625	5.73	建設下世代科研與智慧學習環境計畫經費結餘。
行政院主管 國家通訊傳播委員會 數位建設	754,497	43,096	5.71	補助計畫之結餘；按業務需要減少支付之賸餘。
內政部主管 營建署及所屬 城鄉建設	5,880,000	229,150	3.90	補助計畫經費之結餘。
城鄉建設	12,740,000	67,795	0.53	補助計畫經費之結餘。
水環境建設	8,413,202	447,848	5.32	補助計畫經費之結餘。
教育部主管 教育部 數位建設	4,820,333	68,485	1.42	辦理建置校園智慧網路計畫之結餘。
體育署 城鄉建設	6,456,000	415,417	6.43	補助計畫經費之結餘。
經濟部主管 經濟部 城鄉建設	588,637	40,123	6.82	部分公有市場耐震補強補助計畫因地方政府辦理撤案，致有賸餘。
工業局 數位建設	4,450,000	122,500	2.75	普及智慧城鄉生活應用等計畫之補助經費結餘。
城鄉建設	4,736,590	43,482	0.92	開發在地型產業園區等計畫之工程結餘。
水利署及所屬 水環境建設	37,778,211	2,034,815	5.39	全國水環境改善計畫、營繕工程等經費結餘。
中小企業處 城鄉建設	1,893,579	85,028	4.49	補助計畫經費之結餘。
能源局 綠能建設	5,497,358	220,010	4.00	高雄海洋科技產業創新專區等委辦計畫之經費結餘。
交通部主管 交通部 營業基金－臺灣鐵路管理局	8,863,298	41,904	0.47	票務系統整合再造計畫辦理備援中心建置及資安強化案結餘。
營業基金－臺灣港務股份有限公司	1,350,000	393,328	29.14	臺中港離岸風電產業專區辦理臺中港 5A 碼頭改建、5B 碼頭新建暨淺水船渠整建工程結餘。

玖、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算歲出賸餘原因分析簡明表(續)

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
觀光局及所屬				
水環境建設	600,000	103,451	17.24	補助地方政府建設計畫賸餘。
鐵道局及所屬				
軌道建設	22,497,169	365,116	1.62	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫依現地實際施作數量減帳之結餘。
農業委員會主管				
農業委員會				
水環境建設	2,107,000	51,134	2.43	補助計畫經費之結餘。
水土保持局				
水環境建設	2,489,200	330,757	13.29	工程經費結餘。
衛生福利部主管				
衛生福利部				
城鄉建設	3,598,523	44,715	1.24	補助地方政府辦理整建長照衛福據點計畫經費結餘。
社會及家庭署				
城鄉建設	658,852	93,665	14.22	補助地方政府辦理整建長照衛福據點計畫經費結餘。
少子化友善育兒空間建設	1,454,810	395,859	27.21	補助地方政府辦理建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫經費結餘。
文化部主管				
文化資產局				
城鄉建設	4,900,000	214,080	4.37	再造歷史現場計畫等相關補(捐)助或委辦計畫經費之結餘。
影視及流行音樂產業局				
數位建設	773,591	51,925	6.71	新媒體跨平臺創意影音節目製作等補助計畫經費之結餘。
科技部主管				
科技部				
非營業特種基金—國家科學技術發展基金	7,799,818	337,026	4.32	加速綠能科學城建置計畫及年輕學者養成計畫之核定補助案件數未達預期。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

戊、附錄

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行成果

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算 1,070 億 7,084 萬餘元，自 106 至 107 年度止，分 2 個年度實施，截至 109 年底止，實現數 967 億 1,197 萬餘元（90.33%），應付保留數 44 億 1,495 萬餘元（4.12%），賸餘（減免、註銷）數 59 億 4,391 萬餘元（5.55%）。第 2 期特別預算 2,229 億 5,405 萬餘元，自 108 至 109 年度止，分 2 個年度實施，實現數 1,668 億 4,377 萬餘元（74.83%），應付保留數 494 億 6,079 萬餘元（22.18%），賸餘數 66 億 4,948 萬餘元（2.98%）。茲依國家發展委員會公布之各年度總績效檢討報告與各分支計畫執行進度及績效報告，將第 1、2 期特別預算截至 109 年底執行成果，按照建設類別擇要摘述如次：

一、軌道建設

（一） 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫：南迴鐵路全線電氣化業於 109 年 12 月 23 日通車，高雄至臺東間可縮短行車時間 27 分鐘、高雄至花蓮間可縮短行車時間 39 分鐘。

（二） 淡海輕軌運輸系統：第一期路網綠山線及藍海線〔淡水漁人碼頭站至臺北海洋大學站（V26—V28）〕分別於 107 年 12 月 24 日、109 年 11 月 15 日正式通車營運，串聯淡水地區觀光景點，改善淡海新市鎮聯外交通問題。

（三） 臺鐵電務智慧化提升計畫：列車自動防護系統（Automatic Train Protection, ATP）優化第二批施工完工，提高列車運轉效率、變電站設備系統提升（含安裝）竣工 6 座，導電軌裝設安裝完成 18.26 公里及高壓分相裝置安裝完成 64 組，提升供電穩定性。

（四） 票務系統整合再造計畫：臺鐵局第四代票務系統已於 108 年 4 月 23 日上線，提供 QR Code 無紙化票證服務、新版旅客訂票 APP「台鐵 e 訂通」及智慧劃座等功能。

(五) 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫：已於 109 年 1 月 3 日完成雙軌化通車切換，強化臺中山城與沿海區域之聯繫。

(六) 阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫：道床強度及路線（含上下邊坡）安全改善完工 7 件，有效提升邊坡穩定，降低行車風險。

(七) 高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫：已於 107 年 1 月 26 日完成臺鐵新左營站更新；108 年 8 月 28 日完成 60 輛電聯車更新，提供通勤旅客舒適、友善與便捷之軌道運輸優質服務。

二、水環境建設

(一) 水與發展：完成石門水庫、曾文水庫等 47 座水庫集水區控制土砂量 556.8 萬立方公尺、崩塌地整治面積 249.2 公頃、野溪整治長度 66.18 公里；完成自來水改善工程 239 件，自來水用水戶數增加 2.67 萬戶，全國自來水普及率提升至 94.5%；完成桃園、新竹及臺中防災緊急備援水井共 37 口，可增供緊急備援水量每日 9.82 萬噸，及臺中 30 口與屏東 11 口常態備援水井共 41 口，可增供常態備援水量每日 11.29 萬噸；烏溪烏嘴潭人工湖輸水隧道全線 297 公尺於 109 年 9 月 29 日貫通。

(二) 水與安全：增加縣市管河川及區域排水保護面積 25.32 平方公里、施設堤防護岸及排水路改善 35.01 公里、下水道改善 14.02 公里、都市滯洪量增加 7.93 萬立方公尺、農田排水渠道改善 53.52 公里及農田構造物改善 35 座。

(三) 水與環境：完成水環境亮點 75 處、營造親水空間 178.80 公頃。

三、綠能建設

(一) 區域性儲能設備技術示範驗證計畫：已分別於高雄永安、臺中龍井及彰化彰濱等地建置 7 座儲能示範系統，累計裝置容量 7.270MW/7.745MWh（百萬瓦/百萬瓦小時），達成 7MW/7MWh 之計畫目標。

(二) 科學城公共建設計畫－經濟部：綠能科技示範場域已全區完工，並啟動進駐作業，提供廠商完整之測試、驗證技術服務。

(三) 綠能科技聯合研發計畫：計 83 家企業參與計畫研發，促成與學界或產業團體合作研究 121 件，企業投資總金額 1.27 億元。另協助國內企業取得 2 件海外電業規模等級之國際示範實績。

(四) 科學城低碳智慧環境基礎建設—科技計畫：108 年 2 月完成啟用智駕測試實驗室，截至 109 年底止，已進行國內 15 臺自駕車，467 車次自駕 Level 3 以上運行測試，協助完成 9 份自駕車性能測試報告。

(五) 臺中港離岸風電產業專區：106 號碼頭於 109 年 4 月 17 日竣工，並獲行政院公共工程委員會第 20 屆公共工程金質獎；5A、5B 碼頭於 109 年 6 月 10 日竣工，其混凝土施工並獲 2020 年臺灣混凝土學會頒發混凝土工程優良獎。

四、數位建設

(一) 推動資安基礎建設，提供網路安心服務：完成公務體系資安 A 級雲端資料中心 9 座；整併機房 207 座、實體主機降減 1,685 臺，降減比率 29.26%；建置防救災行動通訊平臺定點式 48 臺及機動式 18 臺，提供緊急通訊服務及建構資安監控分析通報平臺等。

(二) 完備數位包容，保障寬頻人權：建設 Gbps 等級固網寬頻網路到鄉，擴展 100Mbps 等級固網寬頻電路到村（里）主要聚落，並完成無線寬頻環境建置 118 個部落；持續維運 403 處原住民族、離島地區衛生所（室）及巡迴醫療點網路，試辦臺東縣蘭嶼鄉等 5 處遠距專科醫療服務等。

(三) 發展數位文創，普及高畫質服務：補助業者製作超高畫質電視節目 20 件、158 小時，帶動業者相對投入 6 億餘元；建置國家文化記憶庫入口網站，整合文化部所屬博物館、中央部會及典藏機構、地方政府暨民間團體之博物館藏品及在地記憶素材逾 270 萬筆等。

(四) 建構開放政府及智慧城鄉服務：促成 294 家業者發展智慧應用 223 項，帶動廠商投資 301 億元；輔導推動民生公共物聯網資料應用 14 案，取得國內外訂單 6 億元，帶動投資 3 億元；運用災防應變資料，透過 Open API 資訊交換，

提供產官學研民查詢及取得防救災資訊等。

(五) 建設下世代科研與智慧學習環境：建構 AI 雲端平台 (Taiwan Computing Cloud)，服務逾 1,700 萬運算小時；協助成立機器人相關新創公司或進駐育成中心與加速器 156 家，產出關鍵技術或產品 114 件；促成成立儀器研發公司 5 家，協助毒品類檢測儀器商品化，發展生醫檢測光標靶儀、3D 長照偵測系統、隱藏毒品偵測儀、毒品唾液快篩儀等。

五、城鄉建設

(一) 提升道路品質計畫 (內政部)：提升都市與城鄉區域道路及人行街道環境，綠化面積 53,563.8 平方公尺、管線下地長度 8,437.56 公尺、改善道路品質長度 506.82 公里、公共通行路障排除改善 1,222 處。

(二) 提升道路品質計畫 (交通部)：提升公路系統道路品質，綠化面積 32,995 平方公尺、改善道路品質長度 1,451 公里、路面孔蓋下地 (座) 數 6,945 座。

(三) 城鎮之心工程計畫：促進城鄉均衡健康之發展，增加公園綠地面積 90 公頃；改善舊市區開放空間 (如廣場、公園綠地、遊樂設施、水岸環境等) 300 公頃；增加在地消費 9,000 萬元。

(四) 改善停車問題計畫：補助地方政府辦理停車場整體規劃及可行性評估案數 79 件；興建補助停車場工程案 122 件、停車格位數 47,431 格。

(五) 開發在地型產業園區計畫：推動園區創新轉型，完成前瞻聯合辦公大樓，興建標準廠房 2 座；活化土地使用面積 30 公頃、平價園區釋出 76 公頃產業用地；增加就業人數 46,935 人、推動城鄉特色產業園區發展創造就業機會 15,689 人、增加產值每年 140.59 億元。

(六) 公有危險建築補強重建計畫：補助辦理公有建築物耐震能力詳細評估 992 件、公有建築物耐震補強工程 553 件、公有建築物拆除重建或新建工程 74 件。

(七) 營造休閒運動環境計畫：改善符合國際標準區域運動場館 41 案、友

善休閒運動環境 160 案；建置運動休閒園區或名勝景點自行車道 27 條、既有自行車道優質化工程 465 公里。

（八） 校園社區化改造計畫：擴建教室 311 間；建置社區多元學習中心 104 所、社區資訊站 316 處；完成風雨球場、夜間照明、跑道改善、樂活運動空間 700 校；改善校園閱讀空間 737 校。

（九） 文化生活圈建設計畫：典藏臺灣藝術家重要作品逾 30 件、獲捐贈音樂史料 2,757 筆、調查徵集臺灣影視聽史料文物 2,784 件；完成地方藝文場館興建 12 案、整建 41 案、輔導升級與示範 12 案；藝文教育扎根 51 案、藝文場館營運升級 80 案、臺灣文化節慶升級 52 案。

（十） 整建長照衛福據點計畫：補助辦理整建長照衛福據點 685 處、整建照顧管理中心照管分站 62 站。

（十一） 客家浪漫臺三線計畫：完成浪漫臺三線國家自然步道 3 案、省道軸帶自然景觀優化 6 案、市鎮街區與立面改造 6 案、客家重要建築與客家大師故居修建 3 案、藝術村與大地園藝建置 15 案。

（十二） 原民部落營造計畫：活化部落公有公共空間作為文化健康綜合服務據點 361 處、營造安全便捷之社區道路 172 條、增加部落就業機會 1,300 人。

六、因應少子化友善育兒空間建設

（一） 建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫：補助增設或改善 205 處社區公共托育設施、45 處托育資源中心、106 處家庭（社會）福利服務中心及 21 處綜合社會福利館，擴充服務量能，增加民眾使用托育服務及福利服務之普及性與可近性。

（二） 校園社區化改造計畫－營造友善育兒空間：補助新建幼兒園園舍，讓民眾就近選擇平價、品質有保障之教保場所，106 至 109 年度新建幼兒園園舍 268 班（485 間教室），其中 141 班（251 間教室）已開辦、17 班（31 間教室）已竣工、110 班（203 間教室）已開工，預計於 110 年 7 月底前竣工。

七、食品安全建設

(一) 現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫：已完成選址、大樓興建安之可行性評估、先期規劃作業及細部設計等。

(二) 邊境查驗通關管理系統效能提升：建置各港埠辦事處獨立機櫃及軟體、邊境查驗系統各港埠辦事處風險核判獨立運作功能擴充，使各港埠辦事處可獨立運作風險核判作業。另在上開已完成之新建構基礎平臺上，持續發展食品雲相關系統升級。

(三) 強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質：補助 21 市縣衛生局購置檢驗所需儀器設備計 442 套、標準品或試劑耗材，與聘用檢驗人力計 135 人，以提升檢驗量能，市縣衛生局累計完成聯合分工檢驗體系檢驗 31,818 件、一般例行性檢驗 211,648 件，及通過衛生福利部食品藥物管理署實驗室認證之檢驗方法計 1,005 件。

(四) 強化中央食安檢驗量能：購置 35 套檢驗儀器，並藉由開發高精密、高靈敏及高通量之檢驗方法，增加檢驗效率、擴增檢驗量能及縮短檢驗時間。

八、人才培育促進就業建設

(一) 優化技職校院實作環境：補助跨域實作場域 91 案、成立產業菁英訓練基地 26 案、建置類產業環境工廠 19 案及補助充實基礎教學實習設備 486 校次等。

(二) 推動國際產學聯盟：成立 20 個國際產學聯盟，吸引國內外 230 家企業會員加入、產學投入及技術移轉金額 36 億元、培育人才 8,800 人次等。

(三) 建置青年科技創新創業基地：打造創業旗艦基地，以 AI、軟體等科技領域為重點，吸引國內外 5 家知名加速器業者及協助 68 個團隊與企業完成實質商業合作，募資額達 47 億元等。

(四) 推動領袖學者助攻計畫：培養具國際聲望研究團隊 22 個，產出論文 689 篇，刊登國外重要期刊 207 篇，產出專利 26 個等。

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算 1,070 億 7,084 萬餘元，自 106 至 107 年度止，分 2 個年度實施。截至 109 年底止，實現數 967 億 1,197 萬餘元（90.33%），應付保留數 44 億 1,495 萬餘元（4.12%），主要係工程預付款未達核銷轉正標準、招標不順、民眾抗爭及計畫合約期程跨年度，須保留繼續執行。茲依主管機關別（表 1）及建設類別（表 2）分述如次：

一、主管機關別

（一） 總統府主管：預算數 3 億 5,685 萬元，截至 109 年底止，實現數 3 億 1,534 萬餘元（88.37%），賸餘數 4,150 萬餘元（11.63%）。

（二） 行政院主管：預算數 27 億 3,592 萬餘元，截至 109 年底止，實現數 25 億 3,354 萬餘元（92.60%），賸餘數 2 億 237 萬餘元（7.40%）。

（三） 內政部主管：預算數 168 億 2,800 萬餘元，截至 109 年底止，實現數 163 億 5,517 萬餘元（97.19%），應付保留數 2,145 萬餘元（0.13%），主要係消防署辦理公共服務據點整備計畫補助案，因合約期程跨年度、部分案件尚在辦理經費核銷作業中，須保留繼續執行，賸餘數 4 億 5,137 萬餘元（2.68%）。

（四） 財政部主管：預算數 5 億 9,657 萬餘元，截至 109 年底止，實現數 5 億 9,656 萬餘元（100.00%），賸餘數 7,856 元（0.00%）。

（五） 教育部主管：預算數 116 億 860 萬元，截至 109 年底止，實現數 107 億 6,649 萬餘元（92.75%），應付保留數 5 億 9,794 萬餘元（5.15%），主要係體育署補助地方政府辦理營造休閒運動環境計畫，因環境影響評估作業、規劃設計作業延遲或多次流廢標，須保留繼續執行，賸餘數 2 億 4,416 萬餘元（2.10%）。

（六） 法務部主管：預算數 1,980 萬元，截至 109 年底止，實現數 1,978 萬餘元（99.93%），賸餘數 1 萬餘元（0.07%）。

(七) **經濟部主管**：預算數 301 億 5,562 萬餘元，截至 109 年底止，實現數 260 億 7,379 萬餘元 (86.46%)，應付保留數 9 億 6,138 萬餘元 (3.19%)，主要係能源局辦理高雄海洋科技產業創新專區計畫之疏浚工程，因漁民抗爭及深水池新建工程案多次流標，影響工程進度，須保留繼續執行，賸餘數 31 億 2,044 萬餘元 (10.35%)。

(八) **交通部主管**：預算數 224 億 4,257 萬餘元，截至 109 年底止，實現數 206 億 3,677 萬餘元 (91.95%)，應付保留數 17 億 7,771 萬餘元 (7.92%)，主要係交通部補助桃園市政府辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運暨土地整合發展計畫工程預付款未達核銷轉正標準，須保留繼續執行，賸餘數 2,809 萬餘元 (0.13%)。

(九) **農業委員會主管**：預算數 45 億 1,900 萬元，截至 109 年底止，實現數 39 億 9,643 萬餘元 (88.44%)，應付保留數 4,255 萬餘元 (0.94%)，主要係林務局辦理阿里山森林鐵路 42 號隧道計畫，因增辦環境影響評估作業，相關經費須保留繼續執行，賸餘數 4 億 8,001 萬餘元 (10.62%)。

(十) **衛生福利部主管**：預算數 41 億 1,700 萬元，截至 109 年底止，實現數 22 億 4,622 萬餘元 (54.56%)，應付保留數 9 億 1,988 萬餘元 (22.34%)，主要係整建長照衛福據點計畫，部分案件工程進度未如預期，或工程履約期程跨年度，或未及完成核銷，相關經費須保留繼續執行，賸餘數 9 億 5,089 萬餘元 (23.10%)。

(十一) **環境保護署主管**：預算數 23 億 5,049 萬元，截至 109 年底止，實現數 22 億 9,594 萬餘元 (97.68%)，應付保留數 3,111 萬餘元 (1.32%)，主要係環境保護署補助地方政府辦理污水截流及水質淨化等水環境改善工作，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數 2,343 萬餘元 (1.00%)。

(十二) 文化部主管：預算數 47 億 5,017 萬元，截至 109 年底止，實現數 43 億 4,905 萬餘元 (91.56%)，應付保留數 6,291 萬餘元 (1.32%)，主要係文化部補助私有老建築保存再生案件執行期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數 3 億 3,820 萬餘元 (7.12%)。

(十三) 科技部主管：預算數 65 億 7,496 萬餘元，截至 109 年底止，實現數 65 億 1,219 萬餘元 (99.05%)，賸餘數 6,276 萬餘元 (0.95%)。

(十四) 金融監督管理委員會主管：預算數 1,527 萬元，截至 109 年底止，實現數 1,463 萬餘元 (95.86%)，賸餘數 63 萬餘元 (4.14%)。

表 1 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形 (主管機關別)

106 年 9 月 13 日至 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

主管機關	預算數	累計實現數		賸餘 (減免、註銷) 數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
合計	107,070	96,711	90.33	5,943	5.55	4,414	4.12	
總統府	356	315	88.37	41	11.63	—	—	
行政院小計	2,735	2,533	92.60	202	7.40	—	—	
行政院	450	433	96.25	16	3.75	—	—	
原住民族委員會	743	681	91.72	61	8.28	—	—	
客家委員會及所屬	788	730	92.72	57	7.28	—	—	
國立故宮博物院	139	129	92.83	9	7.17	—	—	
國家通訊傳播委員會	515	459	89.17	55	10.83	—	—	
國家發展委員會	100	99	99.19	0.8	0.81	—	—	
內政部	16,828	16,355	97.19	451	2.68	21	0.13	主要係消防署辦理公共服務據點整備計畫補助案，因合約期程跨年度、部分案件尚在辦理經費核銷作業中，須保留繼續執行。
財政部	596	596	100.00	0	0.00	—	—	
教育部	11,608	10,766	92.75	244	2.10	597	5.15	主要係體育署補助地方政府辦理營造休閒運動環境計畫，因環境影響評估作業、規劃設計作業延遲或多次流廢標，須保留繼續執行。
法務部	19	19	99.93	0.01	0.07	—	—	
經濟部	30,155	26,073	86.46	3,120	10.35	961	3.19	主要係能源局辦理高雄海洋科技產業創新專區計畫之疏浚工程，因漁民抗爭及深水池新建工程案多次流標，影響工程進度，須保留繼續執行。

表 1 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形（主管機關別）（續）

106 年 9 月 13 日至 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

主管機關	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
交通部	22,442	20,636	91.95	28	0.13	1,777	7.92	主要係交通部補助桃園市政府辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運暨土地整合發展計畫工程預付款未達核銷轉正標準，須保留繼續執行。
農業委員會	4,519	3,996	88.44	480	10.62	42	0.94	主要係林務局辦理阿里山森林鐵路 42 號隧道計畫，因增辦環境影響評估作業，相關經費須保留繼續執行。
衛生福利部	4,117	2,246	54.56	950	23.10	919	22.34	主要係整建長照衛福據點計畫，部分案件工程進度未如預期，或工程履約期程跨年度，或未及完成核銷，相關經費須保留繼續執行。
環境保護署	2,350	2,295	97.68	23	1.00	31	1.32	主要係環境保護署補助地方政府辦理污水截流及水質淨化等水環境改善工作，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
文化部	4,750	4,349	91.56	338	7.12	62	1.32	主要係文化部補助私有老建築保存再生案件執行期程跨年度，須保留繼續執行。
科技部	6,574	6,512	99.05	62	0.95	—	—	
金融監督管理委員會	15	14	95.86	0.6	4.14	—	—	

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告、108 及 109 年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

二、建設類別

（一） **軌道建設**：預算數 165 億 6,657 萬餘元，截至 109 年底止，實現數 147 億 1,821 萬餘元（88.84%），應付保留數 18 億 2,026 萬餘元（10.99%），主要係交通部補助桃園市政府辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運暨土地整合發展計畫工程預付款未達核銷轉正標準，須保留繼續執行，賸餘數 2,809 萬餘元（0.17%）。

（二） **水環境建設**：預算數 251 億 1,800 萬元，截至 109 年底止，實現數 235 億 4,541 萬餘元（93.74%），應付保留數 3,550 萬餘元（0.14%），主要係環境保護署補助地方政府辦理污水截流及水質淨化等水環境改善工作，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數 15 億 3,708 萬餘元（6.12%）。

(三) **綠能建設**：預算數 80 億 3,444 萬餘元，截至 109 年底止，實現數 66 億 1,384 萬餘元 (82.32%)，應付保留數 7 億 2,503 萬餘元 (9.02%)，主要係經濟部能源局辦理高雄海洋科技產業創新專區計畫之疏浚工程，因漁民抗爭及深水池新建工程案多次流標，影響工程進度，須保留繼續執行，賸餘數 6 億 9,556 萬餘元 (8.66%)。

(四) **數位建設**：預算數 158 億 9,452 萬餘元，截至 109 年底止，實現數 154 億 5,732 萬餘元 (97.25%)，應付保留數 1,861 萬餘元 (0.12%)，主要係文化部辦理原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷補助案、影視及流行音樂產業局辦理新媒體跨平臺創意影音節目製作等補助案，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數 4 億 1,858 萬餘元 (2.63%)。

(五) **城鄉建設**：預算數 350 億 3,491 萬餘元，截至 109 年底止，實現數 304 億 5,649 萬餘元 (86.93%)，應付保留數 16 億 8,280 萬餘元 (4.80%)，主要係教育部體育署補助地方政府辦理營造休閒運動環境計畫，因環境影響評估作業、規劃設計作業延遲或多次流廢標，及衛生福利部辦理整建長照衛福據點計畫，補助地方政府修建社區活動中心、衛生所、老人活動中心及公有閒置空間等，合約期程跨年度，或尚未結案撥款，須保留繼續執行，賸餘數 28 億 9,561 萬餘元 (8.26%)。

(六) **因應少子化友善育兒空間建設**：預算數 19 億 6,050 萬元，截至 109 年底止，實現數 15 億 4,194 萬餘元 (78.65%)，應付保留數 1 億 3,273 萬餘元 (6.77%)，主要係衛生福利部社會及家庭署辦理建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫，補助地方政府修建綜合社會福利館及托育資源中心，部分案件未及完工或尚未完成驗收，須保留繼續執行，賸餘數 2 億 8,582 萬餘元 (14.58%)。

(七) **食品安全建設**：預算數 3 億 800 萬元，截至 109 年底止，實現數 2 億 8,695 萬餘元 (93.17%)，賸餘數 2,104 萬餘元 (6.83%)。

(八) **人才培育促進就業建設**：預算數 41 億 5,388 萬餘元，截至 109 年底止，實現數 40 億 9,178 萬餘元 (98.51%)，賸餘數 6,209 萬餘元 (1.49%)。

表 2 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形（建設類別）

106 年 9 月 13 日至 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

建設類別	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
合計	107,070	96,711	90.33	5,943	5.55	4,414	4.12	
軌道建設	16,566	14,718	88.84	28	0.17	1,820	10.99	主要係交通部補助桃園市政府辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運暨土地整合發展計畫工程預付款未達核銷轉正標準，須保留繼續執行。
水環境建設	25,118	23,545	93.74	1,537	6.12	35	0.14	主要係環境保護署補助地方政府辦理污水截流及水質淨化等水環境改善工作，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
綠能建設	8,034	6,613	82.32	695	8.66	725	9.02	主要係經濟部能源局辦理高雄海洋科技產業創新專區計畫之疏浚工程，因漁民抗爭及深水池新建工程案多次流標，影響工程進度，須保留繼續執行。
數位建設	15,894	15,457	97.25	418	2.63	18	0.12	主要係文化部辦理原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷補助案、影視及流行音樂產業局辦理新媒體跨平臺創意影音節目製作等補助案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
城鄉建設	35,034	30,456	86.93	2,895	8.26	1,682	4.80	主要係教育部體育署補助地方政府辦理營造休閒運動環境計畫，因環境影響評估作業、規劃設計作業延遲或多次流廢標，及衛生福利部辦理整建長照衛福據點計畫，補助地方政府修建社區活動中心、衛生所、老人活動中心及公有閒置空間等，合約期程跨年度，或尚未結案撥款，須保留繼續執行。
因應少子化友善育兒空間建設	1,960	1,541	78.65	285	14.58	132	6.77	主要係衛生福利部社會及家庭署辦理建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫，補助地方政府修建綜合社會福利館及托育資源中心，部分案件未及完工或尚未完成驗收，須保留繼續執行。
食品安全建設	308	286	93.17	21	6.83	—	—	
人才培育促進就業建設	4,153	4,091	98.51	62	1.49	—	—	

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告、108 及 109 年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

參、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助地方政府計畫經費暨各地方政府自籌經費編列及執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算編列補助地方政府經費共計 1,823 億 2,540 萬餘元，截至 109 年底止，中央各機關核定補助地方政府計畫總經費合計 8,074 億 3,778 萬餘元，其中由中央政府補助經費計 4,104 億 9,855 萬餘元（含前瞻特別預算及其他預算來源），由地方自籌之經費計 3,969 億 3,922 萬餘元。茲將中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助地方政府計畫經費暨各地方政府自籌經費編列及執行情形分述如次：

一、中央政府補助地方政府計畫經費編列及執行情形

第 1 期及第 2 期特別預算計有行政院（含行政院、原住民族委員會、客家委員會及所屬）、內政部、財政部、教育部、經濟部、交通部、農業委員會、衛生福利部、環境保護署、文化部等 10 個主管機關編列補助地方政府計畫經費，其中第 1 期特別預算編列預算數為 563 億 3,455 萬餘元，實際核定補助經費計 512 億 317 萬餘元，截至 109 年底止，實現數 463 億 4,951 萬餘元（90.52%），應付保留數 35 億 392 萬餘元（6.84%）；第 2 期特別預算編列預算數為 1,259 億 9,085 萬元，實際核定補助經費計 1,145 億 4,654 萬餘元，截至 109 年底止，實現數 819 億 5,712 萬餘元（71.55%），應付保留數 312 億 1,294 萬餘元（27.25%）。茲依主管機關別、建設類別及市縣別分別列表如下：

（一）主管機關別

表 1 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助地方政府計畫經費執行情形總表(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	10,518	807,437,781	51,203,179	46,349,514	90.52	3,503,920	6.84	114,546,544	81,957,120	71.55	31,212,943	27.25
行政院（本院）	44	2,132,157	438,423	421,833	96.22	—	—	1,055,705	870,955	82.50	170,042	16.11

表 1 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助地方政府計畫經費執行情形總表(主管機關別)(續)
單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數			
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
原住民族委員會	272	2,426,175	601,135	558,362	92.88	—	—	1,252,354	1,083,163	86.49	168,066	13.42		
客家委員會及所屬	49	2,720,605	731,536	730,632	99.88	—	—	1,187,760	1,134,684	95.53	53,075	4.47		
內政部	2,941	79,077,491	16,344,764	16,030,007	98.07	21,455	0.13	31,989,581	22,451,531	70.18	8,982,909	28.08		
財政部	44	283,093	107,872	107,864	99.99	—	—	79,509	79,455	99.93	—	—		
教育部	1,298	33,345,180	8,715,396	8,077,801	92.68	597,111	6.85	14,329,233	10,194,664	71.15	4,029,114	28.12		
經濟部	2,384	67,306,519	7,987,059	7,018,219	87.87	261,276	3.27	23,689,363	18,224,322	76.93	5,323,096	22.47		
交通部	453	577,657,761	8,455,072	6,780,964	80.20	1,674,107	19.80	20,712,688	16,688,058	80.57	3,922,063	18.94		
農業委員會	46	2,320,879	662,686	657,008	99.14	—	—	1,057,564	823,637	77.88	192,063	18.16		
衛生福利部	1,780	11,540,245	2,642,344	1,567,590	59.33	918,859	34.77	5,563,332	1,116,687	20.07	4,242,250	76.25		
環境保護署	231	8,957,920	2,020,000	1,973,380	97.69	31,110	1.54	4,143,027	1,933,545	46.67	2,209,482	53.33		
文化部	976	19,669,752	2,496,889	2,425,847	97.15	—	—	9,486,424	7,356,413	77.55	1,920,777	20.25		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 512 億 317 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 559 億 6,366 萬餘元不同，係因原住民族委員會原列 6 億 3,596 萬餘元，與本表列數差異 3,482 萬餘元，係部分計畫改由第 2 期特別預算支應；內政部原列 163 億 4,497 萬餘元，與本表列數差異 21 萬餘元，係部分計畫改由第 2 期特別預算支應；財政部原列 1 億 829 萬餘元，與本表差異 41 萬餘元，係部分計畫結餘款，不列入本表統計；教育部原列 88 億 4,790 萬餘元，與本表列數差異 1 億 3,251 萬元，係部分計畫改由第 2 期特別預算支應，或計畫撤案等；經濟部原列 88 億 8,759 萬餘元，與本表列數差異 9 億 53 萬餘元，係部分計畫預算未獲同意保留，或改由第 2 期特別預算支應，或計畫撤案；交通部原列 115 億 5,907 萬餘元，與本表列數差異 31 億 400 萬元，係該部自辦案件，不再列入本表統計；衛生福利部原列 27 億 4,131 萬餘元，與本表列數差異 9,897 萬餘元，係部分計畫預算未獲同意保留，或計畫撤案；環境保護署原列 24 億 378 萬餘元，與本表列數差異 3 億 8,378 萬餘元，係部分計畫撤案，或改由第 2 期特別預算支應；文化部原列 26 億 210 萬餘元，與本表列數差異 1 億 521 萬餘元，係部分計畫改由公務預算或第 2 期特別預算支應。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 1-1 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算行政院（本院）補助地方政府計畫經費執行情形明細表

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數			
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	44	2,132,157	438,423	421,833	96.22	—	—	1,055,705	870,955	82.50	170,042	16.11		
臺北市	2	270,008	65,000	56,029	86.20	—	—	70,004	69,990	99.98	—	—		
新北市	2	271,785	41,491	41,491	100.00	—	—	121,580	113,580	93.42	—	—		
桃園市	2	155,248	25,811	21,782	84.39	—	—	67,338	39,767	59.06	25,433	37.77		
臺中市	2	94,290	14,952	14,952	100.00	—	—	41,622	41,498	99.70	—	—		
臺南市	2	97,677	24,126	24,124	99.99	—	—	44,248	42,658	96.41	1,563	3.53		
高雄市	2	173,613	24,786	24,784	99.99	—	—	96,743	53,699	55.51	43,043	44.49		
基隆市	2	119,595	23,397	23,390	99.97	—	—	60,320	49,398	81.89	10,921	18.11		
宜蘭縣	2	164,080	53,664	53,664	100.00	—	—	77,600	77,545	99.93	—	—		
新竹縣	2	102,168	12,252	12,191	99.50	—	—	59,265	59,251	99.98	—	—		

表 1-1 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算行政院（本院）補助地方政府計畫經費執行情形明細表（續）

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	補助金額
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
新竹市	2	58,334	12,444	11,600	93.22	—	—	28,390	28,390	100.00	—	—		
苗栗縣	2	81,748	14,474	14,434	99.72	—	—	59,100	47,905	81.06	10,627	17.98		
彰化縣	2	87,875	10,504	10,059	95.76	—	—	59,796	57,632	96.38	948	1.59		
南投縣	2	62,250	10,800	10,666	98.76	—	—	39,000	15,623	40.06	22,651	58.08		
雲林縣	2	63,389	10,771	10,662	99.00	—	—	39,940	10,299	25.79	28,757	72.00		
嘉義縣	2	53,525	22,673	22,504	99.26	—	—	25,500	25,479	99.92	—	—		
嘉義市	2	53,304	12,313	12,313	100.00	—	—	25,000	24,999	100.00	—	—		
屏東縣	2	52,532	24,279	24,279	100.00	—	—	23,000	23,000	100.00	—	—		
花蓮縣	2	13,347	3,848	3,426	89.06	—	—	8,164	7,984	97.80	—	—		
臺東縣	2	72,601	17,437	16,657	95.53	—	—	47,905	21,127	44.10	26,096	54.48		
澎湖縣	2	63,459	6,742	6,719	99.66	—	—	50,370	50,307	99.88	—	—		
金門縣	2	8,588	3,192	2,640	82.72	—	—	2,820	2,820	100.00	—	—		
連江縣	2	12,741	3,467	3,462	99.86	—	—	8,000	7,995	99.95	—	—		

註：1. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

2. 資料來源：整理自行政院提供資料。

表 1-2 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算原住民族委員會補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	補助金額
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	272	2,426,175	601,135	558,362	92.88	—	—	1,252,354	1,083,163	86.49	168,066	13.42		
新北市	11	115,357	15,379	15,246	99.13	—	—	40,544	38,609	95.23	1,934	4.77		
桃園市	11	37,111	8,716	7,322	84.01	—	—	19,136	15,758	82.34	3,378	17.66		
臺中市	9	129,863	28,951	22,923	79.18	—	—	61,177	53,305	87.13	7,871	12.87		
臺南市	2	1,867	1,030	1,030	100.00	—	—	837	837	100.00	—	—		
高雄市	19	231,723	69,014	62,168	90.08	—	—	78,324	76,976	98.28	1,347	1.72		
基隆市	1	22,172	—	—	—	—	—	14,203	13,493	95.00	710	5.00		
宜蘭縣	16	227,179	28,141	27,217	96.72	—	—	116,154	90,376	77.81	25,778	22.19		
新竹縣	12	86,050	9,524	8,949	93.96	—	—	56,176	43,572	77.56	12,603	22.44		
新竹市	3	35,575	790	790	100.00	—	—	15,530	15,530	100.00	—	—		
苗栗縣	16	83,578	24,801	24,408	98.41	—	—	50,818	50,559	99.49	258	0.51		
南投縣	28	186,824	51,522	45,768	88.83	—	—	114,965	112,699	98.03	2,265	1.97		
嘉義縣	10	30,790	8,296	7,331	88.37	—	—	17,996	17,363	96.48	632	3.52		
屏東縣	50	436,881	116,948	111,535	95.37	—	—	242,562	172,462	71.10	70,099	28.90		
花蓮縣	44	376,252	109,750	105,759	96.36	—	—	204,796	182,990	89.35	21,287	10.39		
臺東縣	40	424,947	128,266	117,911	91.93	—	—	219,130	198,627	90.64	19,896	9.08		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 6 億 113 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 6 億 3,596 萬餘元，差異 3,482 萬餘元，係部分計畫改由第 2 期特別預算支應。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自原住民族委員會提供資料。

表 1-3 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算客家委員會及所屬補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	49	2,720,605	731,536	730,632	99.88	—	—	1,187,760	1,134,684	95.53	53,075	4.47		
桃園市	12	1,684,130	483,562	483,541	100.00	—	—	699,668	676,431	96.68	23,237	3.32		
臺中市	9	192,415	59,599	59,029	99.04	—	—	78,247	72,247	92.33	6,000	7.67		
新竹縣	8	325,710	85,390	85,279	99.87	—	—	116,960	116,960	100.00	—	—		
苗栗縣	20	518,348	102,984	102,781	99.80	—	—	292,884	269,045	91.86	23,838	8.14		

註：1. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

2. 資料來源：整理自客家委員會提供資料。

表 1-4 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算內政部主管補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	2,941	79,077,491	16,344,764	16,030,007	98.07	21,455	0.13	31,989,581	22,451,531	70.18	8,982,909	28.08		
臺北市	11	498,193	75,737	66,319	87.56	—	—	80,538	60,560	75.19	19,977	24.81		
新北市	183	6,677,071	1,566,611	1,557,769	99.44	—	—	1,585,701	1,358,669	85.68	201,465	12.71		
桃園市	103	8,331,164	1,228,549	1,222,158	99.48	3,645	0.30	3,055,024	2,219,315	72.64	808,788	26.47		
臺中市	190	6,554,569	879,998	872,849	99.19	—	—	2,299,232	1,741,491	75.74	274,565	11.94		
臺南市	257	6,666,193	1,277,252	1,242,138	97.25	216	0.02	2,862,107	2,162,122	75.54	682,669	23.85		
高雄市	209	5,893,376	1,457,591	1,439,573	98.76	—	—	3,110,388	1,821,582	58.56	1,272,902	40.92		
基隆市	57	1,353,018	160,649	158,291	98.53	—	—	869,094	493,193	56.75	371,120	42.70		
宜蘭縣	83	2,390,799	770,655	737,095	95.65	12,746	1.65	1,036,520	823,327	79.43	204,383	19.72		
新竹縣	119	2,813,180	677,824	670,517	98.92	3,976	0.59	1,140,206	710,214	62.29	427,099	37.46		
新竹市	61	1,837,314	213,382	211,145	98.95	—	—	760,863	672,348	88.37	85,009	11.17		
苗栗縣	207	3,649,272	613,678	606,987	98.91	—	—	1,692,542	1,047,871	61.91	638,244	37.71		
彰化縣	185	3,871,713	1,034,328	995,639	96.26	—	—	1,347,884	800,177	59.37	519,311	38.53		
南投縣	145	2,943,433	544,301	513,225	94.29	—	—	1,176,438	912,445	77.56	210,328	17.88		
雲林縣	207	5,312,552	1,151,027	1,139,430	98.99	746	0.06	2,134,732	1,664,688	77.98	454,887	21.31		
嘉義縣	260	5,405,473	1,587,113	1,566,695	98.71	—	—	2,051,131	1,259,835	61.42	774,639	37.77		
嘉義市	46	1,092,580	167,365	155,819	93.10	—	—	409,264	231,337	56.53	171,740	41.96		
屏東縣	279	5,235,626	1,329,484	1,311,070	98.61	—	—	2,039,353	1,672,113	81.99	351,679	17.24		
花蓮縣	98	2,776,735	336,767	335,334	99.57	—	—	1,671,582	972,634	58.19	698,603	41.79		
臺東縣	88	1,939,206	323,060	304,775	94.34	—	—	1,079,360	712,959	66.05	364,983	33.81		
澎湖縣	63	1,322,440	329,918	327,313	99.21	—	—	655,669	562,947	85.86	85,360	13.02		
金門縣	49	1,320,982	265,539	242,708	91.40	124	0.05	416,342	217,306	52.19	198,982	47.79		
連江縣	41	1,192,592	353,927	353,145	99.78	—	—	515,600	334,389	64.85	166,166	32.23		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 163 億 4,476 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 163 億 4,497 萬餘元，差異 21 萬餘元，係部分計畫改由第 2 期特別預算支應。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自內政部提供資料。

表 1-5 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算財政部主管補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	44	283,093	107,872	107,864	99.99	—	—	79,509	79,455	99.93	—	—	—	—
臺北市	2	63,421	19,951	19,951	100.00	—	—	11,751	11,751	100.00	—	—	—	—
新北市	2	41,233	13,840	13,840	100.00	—	—	10,900	10,900	100.00	—	—	—	—
桃園市	2	20,703	7,690	7,690	100.00	—	—	4,730	4,730	100.00	—	—	—	—
臺中市	2	11,490	1,112	1,105	99.34	—	—	5,547	5,547	100.00	—	—	—	—
臺南市	2	20,192	8,544	8,544	100.00	—	—	5,590	5,590	100.00	—	—	—	—
高雄市	2	27,194	11,005	11,005	100.00	—	—	8,025	8,024	100.00	—	—	—	—
基隆市	2	7,200	2,539	2,539	100.00	—	—	2,500	2,500	100.00	—	—	—	—
宜蘭縣	2	5,113	2,566	2,566	100.00	—	—	1,525	1,525	100.00	—	—	—	—
新竹縣	2	11,183	5,071	5,071	100.00	—	—	2,750	2,750	100.00	—	—	—	—
新竹市	2	5,274	2,241	2,241	100.00	—	—	1,450	1,450	100.00	—	—	—	—
苗栗縣	2	5,241	2,541	2,541	100.00	—	—	2,175	2,175	100.00	—	—	—	—
彰化縣	2	12,983	6,101	6,101	100.00	—	—	4,140	4,097	98.95	—	—	—	—
南投縣	2	5,667	2,809	2,809	100.00	—	—	1,725	1,725	100.00	—	—	—	—
雲林縣	2	11,365	5,536	5,536	100.00	—	—	3,550	3,550	100.00	—	—	—	—
嘉義縣	2	5,716	2,545	2,545	100.00	—	—	2,600	2,600	100.00	—	—	—	—
嘉義市	2	7,220	3,126	3,126	100.00	—	—	1,925	1,925	100.00	—	—	—	—
屏東縣	2	9,376	4,394	4,394	100.00	—	—	4,025	4,022	99.93	—	—	—	—
花蓮縣	2	3,307	1,063	1,063	100.00	—	—	1,800	1,800	100.00	—	—	—	—
臺東縣	2	3,854	2,194	2,194	100.00	—	—	1,275	1,275	100.00	—	—	—	—
澎湖縣	2	2,474	1,498	1,498	100.00	—	—	725	725	100.00	—	—	—	—
金門縣	2	1,421	540	540	100.00	—	—	450	442	98.36	—	—	—	—
連江縣	2	1,459	959	959	100.00	—	—	350	350	100.00	—	—	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 1 億 787 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 1 億 829 萬餘元，差異 41 萬餘元，係部分計畫結餘款，不列入本表統計。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自財政部提供資料。

表 1-6 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算教育部主管補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	1,298	33,345,180	8,715,396	8,077,801	92.68	597,111	6.85	14,329,233	10,194,664	71.15	4,029,114	28.12	—	—
臺北市	73	1,507,533	317,297	312,549	98.50	—	—	672,885	662,576	98.47	8,832	1.31	—	—
新北市	122	3,117,603	812,440	809,738	99.67	—	—	1,361,108	1,074,759	78.96	272,346	20.01	—	—
桃園市	76	4,545,407	926,491	688,609	74.32	235,070	25.37	1,252,785	899,773	71.82	351,682	28.07	—	—
臺中市	120	2,991,473	952,624	942,397	98.93	—	—	1,281,661	1,101,200	85.92	159,188	12.42	—	—
臺南市	68	4,390,546	973,221	883,614	90.79	89,457	9.19	1,033,114	574,132	55.57	453,540	43.90	—	—
高雄市	94	3,392,619	1,103,670	1,049,715	95.11	49,707	4.50	1,560,600	1,168,840	74.90	385,607	24.71	—	—
基隆市	48	865,754	208,526	182,771	87.65	25,400	12.18	415,491	265,078	63.80	143,528	34.54	—	—

表 1-6 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算教育部主管補助地方政府計畫經費執行情形明細表（續）

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
宜蘭縣	66	1,341,661	268,822	260,829	97.03	7,261	2.70	777,078	444,062	57.15	326,872	42.06
新竹縣	42	675,775	216,603	216,598	100.00	—	—	321,134	301,266	93.81	19,693	6.13
新竹市	49	1,559,590	443,724	383,536	86.44	60,087	13.54	702,614	229,030	32.60	471,678	67.13
苗栗縣	70	1,154,605	494,861	486,582	98.33	5,184	1.05	510,583	397,675	77.89	102,609	20.10
彰化縣	56	1,265,007	368,847	364,691	98.87	—	—	619,491	509,594	82.26	105,749	17.07
南投縣	48	744,316	189,784	189,350	99.77	—	—	436,429	308,127	70.60	125,660	28.79
雲林縣	62	722,845	159,519	159,265	99.84	—	—	432,844	373,125	86.20	59,580	13.76
嘉義縣	55	725,448	215,561	209,319	97.10	1,935	0.90	392,806	241,577	61.50	149,742	38.12
嘉義市	30	316,576	82,542	81,422	98.64	—	—	160,469	128,685	80.19	29,542	18.41
屏東縣	64	1,663,050	410,876	409,934	99.77	—	—	1,037,080	777,376	74.96	256,798	24.76
花蓮縣	47	735,366	159,711	159,617	99.94	—	—	471,777	361,113	76.54	106,442	22.56
臺東縣	47	596,520	133,211	115,802	86.93	17,409	13.07	372,661	237,001	63.60	126,364	33.91
澎湖縣	23	258,891	45,831	45,831	100.00	—	—	175,065	77,295	44.15	97,333	55.60
金門縣	19	147,284	39,454	39,454	100.00	—	—	60,208	38,713	64.30	19,021	31.59
連江縣	19	627,299	191,769	86,169	44.93	105,599	55.07	281,339	23,656	8.41	257,300	91.46

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 87 億 1,539 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 88 億 4,790 萬餘元，差異 1 億 3,251 萬元，係部分計畫改由第 2 期特別預算支應，或計畫撤案等。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自教育部提供資料。

表 1-7 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算經濟部主管補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	2,384	67,306,519	7,987,059	7,018,219	87.87	261,276	3.27	23,689,363	18,224,322	76.93	5,323,096	22.47
臺北市	5	815,865	3,770	3,770	100.00	—	—	318,365	318,275	99.97	—	—
新北市	85	7,458,423	285,867	247,244	86.49	18,258	6.39	2,537,236	2,107,658	83.07	429,497	16.93
桃園市	103	4,593,627	692,322	644,850	93.14	18,931	2.73	1,568,065	1,094,638	69.81	473,024	30.17
臺中市	252	2,187,693	693,362	657,598	94.84	29,396	4.24	731,062	465,132	63.62	259,956	35.56
臺南市	354	4,039,341	629,921	599,671	95.20	5,975	0.95	2,031,942	1,805,095	88.84	221,158	10.88
高雄市	196	9,498,884	1,359,912	1,352,950	99.49	—	—	2,765,603	2,387,560	86.33	351,408	12.71
基隆市	28	681,631	219,894	152,229	69.23	37,930	17.25	189,456	125,098	66.03	63,928	33.74
宜蘭縣	69	1,757,517	152,706	150,142	98.32	1,150	0.75	809,288	582,814	72.02	222,815	27.53
新竹縣	74	2,032,626	268,754	252,642	94.00	—	—	647,588	430,865	66.53	215,049	33.21
新竹市	53	1,748,911	267,108	223,237	83.58	42,876	16.05	626,885	431,509	68.83	195,287	31.15
苗栗縣	92	1,865,163	330,246	329,336	99.72	—	—	501,183	331,648	66.17	167,985	33.52
彰化縣	143	4,667,642	726,396	629,496	86.66	51,994	7.16	1,122,624	793,676	70.70	321,711	28.66
南投縣	40	1,508,044	66,557	47,248	70.99	6,300	9.47	140,787	114,349	81.22	26,231	18.63
雲林縣	237	6,037,251	764,611	292,120	38.21	14,665	1.92	2,093,603	1,518,656	72.54	558,388	26.67
嘉義縣	241	10,934,463	814,524	811,146	99.59	1,923	0.24	4,016,139	3,346,804	83.33	657,893	16.38
嘉義市	14	349,021	43,354	39,962	92.18	—	—	53,696	45,805	85.30	7,890	14.70
屏東縣	165	3,290,649	231,559	183,462	79.23	31,874	13.77	1,528,012	921,752	60.32	601,915	39.39

表 1-7 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算經濟部主管補助地方政府計畫經費執行情形明細表（續）

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
花蓮縣	81	826,753	65,494	62,202	94.97	—	—	539,870	408,230	75.62	131,566	24.37
臺東縣	44	776,478	59,025	33,651	57.01	—	—	338,142	250,372	74.04	43,974	13.00
澎湖縣	31	216,673	36,227	35,495	97.98	—	—	143,645	88,691	61.74	54,072	37.64
金門縣	45	945,806	196,754	191,748	97.46	—	—	352,274	222,242	63.09	120,680	34.26
連江縣	32	1,074,045	78,687	78,010	99.14	—	—	633,884	433,445	68.38	198,660	31.34

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 79 億 8,705 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 88 億 8,759 萬餘元，差異 9 億 53 萬餘元，係部分計畫預算未獲同意保留，或改由第 2 期特別預算支應，或計畫撤案。
2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
3. 資料來源：整理自經濟部提供資料。

表 1-8 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算交通部主管補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	453	577,657,761	8,455,072	6,780,964	80.20	1,674,107	19.80	20,712,688	16,688,058	80.57	3,922,063	18.94
臺北市	3	138,172,502	—	—	—	—	—	297,447	292,833	98.45	4,613	1.55
新北市	38	143,901,066	2,714,702	2,714,702	100.00	—	—	6,514,409	6,483,987	99.53	16,375	0.25
桃園市	37	102,710,203	1,982,790	421,853	21.28	1,560,937	78.72	3,934,295	2,295,233	58.34	1,639,062	41.66
臺中市	28	2,951,948	350,601	337,498	96.26	13,103	3.74	476,582	379,843	79.70	96,738	20.30
臺南市	31	4,300,575	496,285	481,285	96.98	15,000	3.02	1,436,923	983,209	68.42	450,701	31.37
高雄市	44	169,277,795	760,628	678,640	89.22	81,987	10.78	1,680,520	645,908	38.43	1,034,022	61.53
基隆市	4	505,219	3,720	3,720	100.00	—	—	200,421	200,421	100.00	—	—
宜蘭縣	29	2,427,102	270,355	270,355	100.00	—	—	676,147	597,578	88.38	2,535	0.37
新竹縣	20	1,640,755	188,065	188,065	100.00	—	—	576,651	576,651	100.00	—	—
新竹市	17	922,825	25,978	22,899	88.15	3,079	11.85	375,813	297,351	79.12	75,171	20.00
苗栗縣	21	1,001,757	235,651	235,651	100.00	—	—	438,294	424,803	96.92	13,490	3.08
彰化縣	19	575,962	86,781	86,781	100.00	—	—	267,904	263,107	98.21	4,624	1.73
南投縣	18	802,596	133,000	133,000	100.00	—	—	423,535	413,899	97.72	9,635	2.28
雲林縣	24	1,059,132	259,085	259,085	100.00	—	—	489,999	371,821	75.88	118,177	24.12
嘉義縣	20	900,540	227,378	227,378	100.00	—	—	446,156	412,966	92.56	30,344	6.80
嘉義市	2	8,600	2,612	2,612	100.00	—	—	5,737	5,737	100.00	—	—
屏東縣	32	4,203,687	206,224	206,224	100.00	—	—	1,141,701	721,011	63.15	420,690	36.85
花蓮縣	17	681,695	242,944	242,944	100.00	—	—	337,074	337,074	100.00	—	—
臺東縣	28	1,004,725	207,329	207,329	100.00	—	—	559,036	552,362	98.81	4,552	0.81
澎湖縣	13	530,600	58,748	58,748	100.00	—	—	372,544	372,544	100.00	—	—
金門縣	5	43,477	2,190	2,190	100.00	—	—	29,565	29,565	100.00	—	—
連江縣	3	35,000	—	—	—	—	—	31,925	30,145	94.42	1,326	4.15

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 84 億 5,507 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 115 億 5,907 萬餘元，差異 31 億 400 萬元，係該部自辦案件不再列入本表統計。
2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
3. 資料來源：整理自交通部提供資料。

表 1-9 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算農業委員會主管補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	46	2,320,879	662,686	657,008	99.14	—	—	1,057,564	823,637	77.88	192,063	18.16
新北市	7	133,661	6,488	6,488	100.00	—	—	86,918	83,989	96.63	—	—
桃園市	1	118,500	75,545	75,530	99.98	—	—	—	—	—	—	—
臺南市	2	27,523	9,557	9,494	99.35	—	—	11,555	11,555	100.00	—	—
高雄市	9	728,631	264,953	262,337	99.01	—	—	316,425	233,874	73.91	72,813	23.01
基隆市	1	56,727	—	—	—	—	—	43,673	29,506	67.56	14,166	32.44
新竹縣	5	109,174	—	—	—	—	—	78,930	52,916	67.04	19,390	24.57
新竹市	6	322,643	145,350	143,904	99.01	—	—	102,275	68,380	66.86	33,108	32.37
苗栗縣	1	97,000	84,091	82,552	98.17	—	—	—	—	—	—	—
彰化縣	1	97,348	10,662	10,662	100.00	—	—	69,163	52,607	76.06	16,213	23.44
嘉義縣	1	7,111	—	—	—	—	—	6,400	—	—	3,841	60.02
屏東縣	3	308,687	13,266	13,266	100.00	—	—	156,213	129,743	83.06	8,740	5.59
臺東縣	2	10,555	—	—	—	—	—	8,346	6,045	72.44	1,264	15.15
金門縣	7	303,317	52,772	52,772	100.00	—	—	177,665	155,017	87.25	22,525	12.68

註：1. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

2. 資料來源：整理自農業委員會提供資料。

表 1-10 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算衛生福利部主管補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,780	11,540,245	2,642,344	1,567,590	59.33	918,859	34.77	5,563,332	1,116,687	20.07	4,242,250	76.25
臺北市	101	614,643	73,624	65,534	89.01	8,000	10.87	153,805	29,899	19.44	123,700	80.43
新北市	125	708,465	99,335	94,933	95.57	2,015	2.03	179,557	99,456	55.39	75,985	42.32
桃園市	142	905,606	172,004	135,121	78.56	22,484	13.07	298,381	96,540	32.35	169,597	56.84
臺中市	93	563,767	83,617	71,302	85.27	6,257	7.48	301,862	63,197	20.94	223,968	74.20
臺南市	220	609,625	283,773	229,927	81.03	18,388	6.48	202,990	83,269	41.02	102,090	50.29
高雄市	99	616,935	228,236	128,471	56.29	93,374	40.91	248,601	142,459	57.30	83,706	33.67
基隆市	25	115,827	45,525	24,082	52.90	18,626	40.91	50,788	12,730	25.07	35,236	69.38
宜蘭縣	112	422,672	168,763	135,651	80.38	19,622	11.63	206,602	103,285	49.99	86,796	42.01
新竹縣	30	372,188	83,138	52,638	63.31	27,667	33.28	164,824	20,725	12.57	136,866	83.04
新竹市	21	161,875	58,367	16,819	28.82	35,804	61.34	34,443	8,196	23.80	25,607	74.35
苗栗縣	51	356,616	121,418	57,337	47.22	60,026	49.44	109,588	35,062	31.99	63,900	58.31
彰化縣	61	1,388,629	122,547	14,781	12.06	106,099	86.58	966,257	22,510	2.33	933,235	96.58
南投縣	64	469,255	91,236	66,604	73.00	13,500	14.80	296,390	48,644	16.41	236,647	79.84
雲林縣	155	916,878	218,582	52,817	24.16	160,653	73.50	490,309	55,337	11.29	419,018	85.46
嘉義縣	127	685,224	145,723	94,709	64.99	41,296	28.34	473,144	74,418	15.73	391,522	82.75
嘉義市	18	80,094	21,636	14,804	68.43	—	—	35,043	28,370	80.96	3,500	9.99
屏東縣	117	1,526,755	275,348	68,581	24.91	201,406	73.15	924,363	60,921	6.59	850,490	92.01

表 1-10 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算衛生福利部主管補助地方政府計畫經費執行情形明細表（續）

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
花蓮縣	102	179,373	60,074	33,696	56.09	22,593	37.61	86,382	27,186	31.47	57,154	66.16
臺東縣	47	211,207	89,349	50,392	56.40	34,177	38.25	109,851	23,826	21.69	82,086	74.72
澎湖縣	40	191,637	69,367	51,429	74.14	11,506	16.59	86,060	31,379	36.46	52,087	60.52
金門縣	20	348,410	85,192	64,346	75.53	15,363	18.03	119,158	24,456	20.52	89,051	74.73
連江縣	10	94,551	45,484	43,607	95.87	—	—	24,926	24,812	99.54	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 26 億 4,234 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 27 億 4,131 萬餘元，差異 9,897 萬餘元，係部分計畫預算未獲同意保留，或計畫撤案。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自衛生福利部提供資料。

表 1-11 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算環境保護署主管補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	231	8,957,920	2,020,000	1,973,380	97.69	31,110	1.54	4,143,027	1,933,545	46.67	2,209,482	53.33
新北市	9	345,098	9,796	9,796	100.00	—	—	195,160	56,374	28.89	138,786	71.11
桃園市	25	1,174,865	337,763	312,923	92.65	23,792	7.04	433,063	115,132	26.59	317,930	73.41
臺中市	23	3,030,087	804,477	801,960	99.69	—	—	1,197,038	640,129	53.48	556,909	46.52
臺南市	23	524,993	113,963	108,698	95.38	5,265	4.62	252,971	187,546	74.14	65,425	25.86
高雄市	18	439,534	82,882	80,911	97.62	—	—	207,350	116,352	56.11	90,997	43.89
基隆市	14	448,779	6,724	6,724	100.00	—	—	336,868	64,891	19.26	271,977	80.74
宜蘭縣	11	123,912	24,927	22,480	90.18	—	—	66,603	59,225	88.92	7,377	11.08
新竹縣	3	50,398	15,995	15,215	95.12	95	0.60	11,005	6,718	61.04	4,287	38.96
新竹市	10	125,574	8,823	8,823	100.00	—	—	61,948	11,413	18.42	50,534	81.58
苗栗縣	11	283,806	111,733	108,214	96.85	—	—	133,115	97,174	73.00	35,940	27.00
彰化縣	5	148,800	93,892	93,892	100.00	—	—	22,527	14,785	65.63	7,742	34.37
南投縣	8	48,477	14,614	14,614	100.00	—	—	18,393	18,393	100.00	—	—
雲林縣	23	1,466,931	189,374	188,793	99.69	313	0.17	896,243	326,100	36.39	570,142	63.61
嘉義縣	7	52,188	14,433	13,279	92.01	—	—	28,403	28,403	100.00	—	—
嘉義市	10	100,454	11,222	9,560	85.19	—	—	60,098	31,224	51.96	28,874	48.04
屏東縣	24	564,962	178,677	176,794	98.95	1,643	0.92	197,420	135,263	68.52	62,156	31.48
花蓮縣	2	16,267	—	—	—	—	—	14,585	14,585	100.00	—	—
澎湖縣	4	4,053	697	697	100.00	—	—	2,788	2,788	100.00	—	—
連江縣	1	8,736	—	—	—	—	—	7,441	7,041	94.63	399	5.37

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 20 億 2,000 萬元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 24 億 378 萬餘元，差異 3 億 8,378 萬餘元，係部分計畫撤案，或改由第 2 期特別預算支應。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自環境保護署提供資料。

表 1-12 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算文化部主管補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	976	19,669,752	2,496,889	2,425,847	97.15	—	—	9,486,424	7,356,413	77.55	1,920,777	20.25
臺北市	58	875,108	77,460	76,135	98.29	—	—	175,608	137,882	78.52	34,572	19.69
新北市	76	1,249,888	67,316	67,073	99.64	—	—	546,716	515,894	94.36	24,005	4.39
桃園市	67	1,830,924	131,680	131,662	99.99	—	—	817,506	724,376	88.61	82,245	10.06
臺中市	74	3,297,055	232,463	232,463	100.00	—	—	1,077,214	868,101	80.59	207,788	19.29
臺南市	78	1,965,677	253,665	251,565	99.17	—	—	847,857	536,744	63.31	297,645	35.11
高雄市	62	1,855,438	325,678	324,227	99.55	—	—	944,654	752,134	79.62	189,933	20.11
基隆市	29	1,202,840	148,983	148,398	99.61	—	—	576,666	337,332	58.50	234,597	40.68
宜蘭縣	55	829,605	133,190	132,477	99.46	—	—	515,520	356,360	69.13	119,356	23.15
新竹縣	27	109,842	18,310	18,310	100.00	—	—	54,529	52,164	95.66	—	—
新竹市	37	590,119	53,067	52,527	98.98	—	—	357,213	249,198	69.76	91,296	25.56
苗栗縣	38	272,644	31,286	29,276	93.58	—	—	196,764	173,532	88.19	20,795	10.57
彰化縣	34	389,324	93,757	66,166	70.57	—	—	205,556	162,516	79.06	42,227	20.54
南投縣	27	174,924	23,794	23,314	97.98	—	—	114,270	73,344	64.19	11,834	10.36
雲林縣	59	733,316	141,980	141,163	99.42	—	—	421,205	341,781	81.14	66,911	15.89
嘉義縣	39	455,613	94,568	78,089	82.57	—	—	276,391	238,589	86.32	32,045	11.59
嘉義市	32	691,828	74,964	73,614	98.20	—	—	213,655	173,994	81.44	38,003	17.79
屏東縣	47	1,314,753	201,782	201,250	99.74	—	—	947,045	699,063	73.82	215,036	22.71
花蓮縣	26	404,945	50,182	48,269	96.19	—	—	311,438	232,098	74.52	73,012	23.44
臺東縣	41	412,688	152,762	151,644	99.27	—	—	204,110	174,544	85.51	21,964	10.76
澎湖縣	29	207,160	14,823	14,823	100.00	—	—	169,941	137,974	81.19	30,283	17.82
金門縣	16	242,771	59,193	48,738	82.34	—	—	105,689	56,994	53.93	45,624	43.17
連江縣	25	563,279	115,980	114,658	98.86	—	—	406,869	361,788	88.92	41,595	10.22

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 24 億 9,688 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 26 億 210 萬餘元，差異 1 億 521 萬餘元，係部分計畫改由公務預算或第 2 期特別預算支應。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自文化部提供資料。

(二) 建設類別

表 2 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助地方政府計畫經費執行情形總表(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	10,518	807,437,781	51,203,179	46,349,514	90.52	3,503,920	6.84	114,546,544	81,957,120	71.55	31,212,943	27.25
軌道建設	16	540,636,737	4,286,459	2,612,351	60.94	1,674,107	39.06	9,826,217	6,925,414	70.48	2,900,802	29.52
水環境建設	1,795	75,551,409	10,120,227	9,809,075	96.93	60,434	0.60	32,084,819	22,854,119	71.23	8,691,102	27.09
綠能建設	2	2,023,000	381,406	381,406	100.00	—	—	1,076,299	1,062,251	98.69	14,047	1.31
數位建設	891	15,381,940	4,557,519	4,515,137	99.07	—	—	7,397,444	7,001,027	94.64	344,865	4.66

表 2 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助地方政府計畫經費執行情形總表（建設類別）（續）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	補助金額
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
城鄉建設	7,090	166,528,779	29,550,338	26,902,693	91.04	1,636,647	5.54	61,058,968	41,897,614	68.62	18,507,677	30.31		
因應少子化友善育兒空間建設	587	5,155,290	1,699,709	1,541,941	90.72	132,731	7.81	1,927,727	1,060,402	55.01	737,232	38.24		
食品安全建設	63	427,863	169,998	166,119	97.72	—	—	182,230	163,452	89.70	17,215	9.45		
人才培育促進就業建設	74	1,732,762	437,522	420,788	96.18	—	—	992,837	992,837	100.00	—	—		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 512 億 317 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 559 億 6,366 萬餘元不同，原因詳表 1 註 1。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-1 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算軌道建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	補助金額
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	16	540,636,737	4,286,459	2,612,351	60.94	1,674,107	39.06	9,826,217	6,925,414	70.48	2,900,802	29.52		
臺北市	1	136,905,710	—	—	—	—	—	235,000	230,386	98.04	4,613	1.96		
新北市	4	137,667,651	2,139,539	2,139,539	100.00	—	—	5,373,817	5,361,526	99.77	12,290	0.23		
桃園市	2	98,407,000	1,609,000	48,062	2.99	1,560,937	97.01	2,968,000	1,328,937	44.78	1,639,062	55.22		
臺中市	2	115,026	24,920	11,817	47.42	13,103	52.58	49,200	—	—	49,200	100.00		
臺南市	1	269,000	15,000	—	—	15,000	100.00	97,000	4,564	4.71	92,435	95.29		
高雄市	4	167,142,070	474,000	392,012	82.70	81,987	17.30	1,033,000	—	—	1,033,000	100.00		
新竹市	2	130,280	24,000	20,920	87.17	3,079	12.83	70,200	—	—	70,200	100.00		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 42 億 8,645 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 73 億 9,045 萬餘元不同，差異 31 億 400 萬元，原因詳表 1 註 1。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-2 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算水環境建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	補助金額
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	1,795	75,551,409	10,120,227	9,809,075	96.93	60,434	0.60	32,084,819	22,854,119	71.23	8,691,102	27.09		
臺北市	3	803,900	—	—	—	—	—	317,400	317,400	100.00	—	—		
新北市	69	6,051,309	1,058,497	1,051,535	99.34	—	—	1,865,914	1,240,737	66.49	591,311	31.69		
桃園市	106	9,151,764	1,487,940	1,438,404	96.67	27,437	1.84	3,774,183	2,330,623	61.75	1,427,771	37.83		

表 2-2 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算水環境建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形明細表（續）

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
臺中市	94	7,078,004	1,296,722	1,287,356	99.28	—	—	3,213,763	1,963,457	61.10	981,053	30.53		
臺南市	134	6,889,653	1,050,427	1,020,171	97.12	5,265	0.50	3,147,381	2,664,482	84.66	469,347	14.91		
高雄市	196	8,572,849	1,628,057	1,609,581	98.87	—	—	3,469,303	2,640,253	76.10	813,808	23.46		
基隆市	31	867,107	99,285	91,171	91.83	—	—	469,907	170,253	36.23	299,648	63.77		
宜蘭縣	58	2,197,421	211,242	202,423	95.83	1,150	0.54	1,117,702	775,487	69.38	265,340	23.74		
新竹縣	53	1,163,879	85,184	68,979	80.98	95	0.11	604,395	392,552	64.95	204,409	33.82		
新竹市	62	2,251,548	368,071	366,416	99.55	—	—	849,924	581,071	68.37	264,774	31.15		
苗栗縣	68	2,235,731	439,115	433,103	98.63	—	—	764,380	563,297	73.69	200,508	26.23		
彰化縣	96	4,283,533	462,284	429,726	92.96	7,203	1.56	1,269,841	863,480	68.00	400,385	31.53		
南投縣	41	739,366	84,345	54,311	64.39	—	—	366,443	224,267	61.20	98,726	26.94		
雲林縣	181	5,369,873	357,265	354,345	99.18	2,621	0.73	2,991,386	1,852,463	61.93	1,128,104	37.71		
嘉義縣	226	9,665,063	579,221	573,465	99.01	1,923	0.33	3,849,593	3,224,797	83.77	617,450	16.04		
嘉義市	17	453,427	57,975	47,647	82.19	—	—	165,583	99,916	60.34	65,640	39.64		
屏東縣	152	3,925,376	406,157	360,422	88.74	14,737	3.63	1,732,282	1,145,432	66.12	559,127	32.28		
花蓮縣	55	1,003,207	57,071	53,697	94.09	—	—	699,415	540,385	77.26	158,621	22.68		
臺東縣	40	789,561	58,229	41,659	71.54	—	—	360,902	314,924	87.26	41,808	11.58		
澎湖縣	25	183,815	27,912	25,690	92.04	—	—	134,671	107,900	80.12	26,538	19.71		
金門縣	53	969,904	235,259	230,252	97.87	—	—	405,848	370,784	91.36	34,516	8.50		
連江縣	35	905,110	69,957	68,712	98.22	—	—	514,593	470,150	91.36	42,209	8.20		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 101 億 2,022 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 105 億 422 萬餘元不同，差異 3 億 8,399 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-3 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算綠能建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	2	2,023,000	381,406	381,406	100.00	—	—	1,076,299	1,062,251	98.69	14,047	1.31		
臺南市	2	2,023,000	381,406	381,406	100.00	—	—	1,076,299	1,062,251	98.69	14,047	1.31		

註：1. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

2. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-4 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算數位建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	891	15,381,940	4,557,519	4,515,137	99.07	—	—	7,397,444	7,001,027	94.64	344,865	4.66
臺北市	59	1,519,244	361,960	343,579	94.92	—	—	541,032	533,095	98.53	7,476	1.38
新北市	60	1,678,932	485,240	485,239	100.00	—	—	767,489	759,117	98.91	—	—
桃園市	52	1,120,265	335,297	329,316	98.22	—	—	519,797	485,843	93.47	30,900	5.94
臺中市	63	1,366,298	452,641	452,310	99.93	—	—	597,835	587,000	98.19	8,960	1.50
臺南市	38	938,388	312,608	312,575	99.99	—	—	444,689	442,799	99.57	1,763	0.40
高雄市	57	2,621,147	623,889	616,951	98.89	—	—	1,331,624	1,193,435	89.62	127,093	9.54
基隆市	36	340,143	100,044	99,682	99.64	—	—	161,061	149,630	92.90	11,313	7.02
宜蘭縣	36	480,410	155,459	153,746	98.90	—	—	244,056	241,738	99.05	1,964	0.80
新竹縣	41	488,666	135,698	135,637	99.96	—	—	246,037	242,745	98.66	686	0.28
新竹市	39	329,076	76,702	74,634	97.30	—	—	187,958	185,459	98.67	2,224	1.18
苗栗縣	41	465,322	158,324	158,234	99.94	—	—	259,083	246,526	95.15	11,607	4.48
彰化縣	33	706,083	226,052	225,124	99.59	—	—	375,642	369,531	98.37	3,980	1.06
南投縣	35	455,593	148,456	148,171	99.81	—	—	239,304	214,345	89.57	23,817	9.95
雲林縣	38	530,884	174,771	174,614	99.91	—	—	275,329	244,660	88.86	29,737	10.80
嘉義縣	43	430,463	159,807	159,557	99.84	—	—	220,571	183,978	83.41	36,253	16.44
嘉義市	27	230,493	69,470	68,774	99.00	—	—	110,426	107,702	97.53	392	0.35
屏東縣	40	565,416	209,404	209,384	99.99	—	—	292,071	275,976	94.49	14,738	5.05
花蓮縣	38	362,937	132,055	131,177	99.33	—	—	181,602	178,715	98.41	686	0.38
臺東縣	34	373,135	118,936	117,863	99.10	—	—	199,121	164,896	82.81	26,988	13.55
澎湖縣	29	193,916	52,534	51,840	98.68	—	—	119,612	118,444	99.02	652	0.55
金門縣	25	102,883	38,166	36,816	96.46	—	—	40,928	34,368	83.97	3,431	8.38
連江縣	27	82,235	29,996	29,903	99.69	—	—	42,165	41,015	97.27	196	0.46

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 45 億 5,751 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 45 億 5,793 萬餘元不同，差異 41 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-5 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算城鄉建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	7,090	166,528,779	29,550,338	26,902,693	91.04	1,636,647	5.54	61,058,968	41,897,614	68.62	18,507,677	30.31
臺北市	88	3,141,565	159,661	150,283	94.13	8,000	5.01	498,157	314,277	63.09	179,605	36.05
新北市	412	17,776,311	1,781,099	1,735,968	97.47	20,273	1.14	4,831,406	4,267,733	88.33	533,993	11.05
桃園市	339	16,491,205	2,459,679	2,173,572	88.37	263,602	10.72	4,509,127	3,795,508	84.17	683,693	15.16
臺中市	586	12,376,636	1,965,271	1,909,930	97.18	35,653	1.81	3,238,315	2,505,402	77.37	686,348	21.19
臺南市	819	12,079,228	2,109,029	1,927,638	91.40	110,978	5.26	3,803,252	2,093,273	55.04	1,674,946	44.04
高雄市	426	12,806,522	2,528,463	2,365,688	93.56	143,081	5.66	4,819,329	3,241,803	67.27	1,536,742	31.89
基隆市	132	3,947,728	536,576	428,912	79.93	81,956	15.27	2,024,660	1,189,259	58.74	816,854	40.35
宜蘭縣	320	6,824,088	1,442,742	1,373,378	95.19	39,630	2.75	2,819,560	2,030,783	72.02	722,410	25.62
新竹縣	231	6,361,386	1,257,700	1,218,518	96.88	31,643	2.52	2,210,933	1,667,132	75.40	539,540	24.40
新竹市	144	4,566,332	737,846	591,854	80.21	138,767	18.81	1,923,118	1,229,512	63.93	671,664	34.93
苗栗縣	397	6,395,187	1,437,767	1,356,417	94.34	65,210	4.54	2,849,273	1,968,223	69.08	859,325	30.16

表 2-5 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算城鄉建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形明細表（續）

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
彰化縣	371	7,288,508	1,797,459	1,555,398	86.53	150,890	8.39	2,925,311	1,370,945	46.86	1,509,961	51.62
南投縣	296	5,690,671	875,634	825,760	94.30	19,800	2.26	2,130,041	1,563,174	73.39	519,310	24.38
雲林縣	527	10,186,269	2,315,738	1,709,815	73.83	132,757	5.73	3,626,051	2,549,835	70.32	1,039,432	28.67
嘉義縣	476	8,995,458	2,370,928	2,284,765	96.37	37,490	1.58	3,554,037	2,225,944	62.63	1,290,904	36.32
嘉義市	102	1,963,083	282,250	268,873	95.26	—	—	665,093	442,436	66.52	213,518	32.10
屏東縣	575	13,781,046	2,271,203	2,094,010	92.20	162,787	7.17	6,042,698	3,847,784	63.68	2,145,681	35.51
花蓮縣	311	4,593,725	823,474	790,730	96.02	22,593	2.74	2,742,485	1,809,814	65.99	923,074	33.66
臺東縣	259	4,266,682	923,411	830,597	89.95	51,586	5.59	2,370,208	1,688,890	71.25	622,387	26.26
澎湖縣	137	2,346,159	459,503	441,410	96.06	11,506	2.50	1,365,319	1,085,242	79.49	268,673	19.68
金門縣	76	2,112,070	361,256	322,871	89.37	2,839	0.79	780,410	321,507	41.20	446,562	57.22
連江縣	66	2,538,909	653,638	546,298	83.58	105,599	16.16	1,330,173	689,128	51.81	623,042	46.84

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 295 億 5,033 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 307 億 8,551 萬餘元不同，差異 12 億 3,517 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
 2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-6 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算因應少子化友善育兒空間建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	587	5,155,290	1,699,709	1,541,941	90.72	132,731	7.81	1,927,727	1,060,402	55.01	737,232	38.24
臺北市	93	129,682	24,974	24,884	99.64	—	—	14,105	13,899	98.54	—	—
新北市	96	429,719	60,660	60,660	100.00	—	—	104,827	78,390	74.78	22,800	21.75
桃園市	67	642,530	113,831	99,513	87.42	12,884	11.32	211,629	81,026	38.29	106,779	50.46
臺中市	40	543,674	220,980	217,458	98.41	—	—	160,382	86,339	53.83	65,170	40.63
臺南市	42	403,542	180,318	175,990	97.60	3,058	1.70	150,945	114,819	76.07	22,253	14.74
高雄市	57	696,184	346,710	344,841	99.46	—	—	204,609	172,550	84.33	15,138	7.40
基隆市	9	206,250	76,880	75,380	98.05	—	—	97,000	77,645	80.05	18,371	18.94
宜蘭縣	25	164,341	50,600	49,879	98.58	—	—	95,575	81,947	85.74	6,200	6.49
新竹縣	16	300,877	99,550	99,547	100.00	—	—	160,058	63,028	39.38	90,354	56.45
新竹市	10	78,600	21,957	21,400	97.46	—	—	29,126	9,684	33.25	18,830	64.65
苗栗縣	16	250,719	124,110	124,109	100.00	—	—	102,445	87,546	85.46	6,248	6.10
彰化縣	5	208,293	64,250	64,250	100.00	—	—	103,350	72,982	70.62	30,000	29.03
南投縣	7	42,111	12,464	10,964	87.97	—	—	18,325	9,696	52.91	3,400	18.55
雲林縣	22	222,095	47,785	5,453	11.41	41,000	85.80	102,230	11,014	10.77	78,589	76.88
嘉義縣	16	151,134	17,550	9,900	56.41	5,741	32.71	105,200	6,089	5.79	96,054	91.31
嘉義市	7	28,328	4,600	3,100	67.39	—	—	9,150	7,388	80.75	—	—
屏東縣	15	309,165	95,885	36,985	38.57	57,400	59.86	160,554	34,381	21.41	118,060	73.53
花蓮縣	14	39,799	11,566	11,110	96.07	—	—	16,700	9,515	56.98	5,685	34.04
臺東縣	5	11,373	7,818	6,001	76.77	—	—	3,000	2,857	95.26	—	—
澎湖縣	13	59,442	17,984	17,705	98.45	—	—	30,475	6,360	20.87	23,275	76.37
金門縣	8	167,616	66,990	52,059	77.71	12,648	18.88	32,476	17,748	54.65	10,023	30.86
連江縣	4	69,809	32,247	30,747	95.35	—	—	15,566	15,490	99.52	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 16 億 9,970 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 17 億 3,659 萬餘元不同，差異 3,688 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
 2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-7 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算食品安全建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	63	427,863	169,998	166,119	97.72	—	—	182,230	163,452	89.70	17,215	9.45
新北市	3	31,948	12,403	11,881	95.80	—	—	11,557	11,557	100.00	—	—
桃園市	3	26,738	8,370	8,168	97.59	—	—	11,683	4,181	35.79	6,172	52.83
臺中市	3	16,692	6,704	6,568	97.98	—	—	5,814	3,557	61.19	2,256	38.80
臺南市	3	41,402	22,550	22,311	98.94	—	—	10,571	10,571	100.00	—	—
高雄市	3	49,631	27,312	26,464	96.90	—	—	12,392	12,392	100.00	—	—
基隆市	3	17,535	7,172	7,001	97.63	—	—	6,856	6,856	100.00	—	—
宜蘭縣	3	21,707	12,415	12,049	97.06	—	—	6,035	6,033	99.98	—	—
新竹縣	3	14,243	2,796	2,796	100.00	—	—	8,598	8,597	99.99	—	—
新竹市	3	11,275	2,700	2,299	85.15	—	—	6,320	6,291	99.56	—	—
苗栗縣	3	17,266	7,596	7,384	97.21	—	—	7,942	7,933	99.89	—	—
彰化縣	3	18,868	3,772	3,772	100.00	—	—	11,200	3,765	33.62	7,435	66.38
南投縣	3	18,048	7,520	7,394	98.33	—	—	7,820	7,769	99.35	—	—
雲林縣	3	14,540	4,926	4,644	94.29	—	—	7,432	7,388	99.42	—	—
嘉義縣	3	13,976	5,311	5,310	99.99	—	—	7,266	7,230	99.50	—	—
嘉義市	3	24,347	4,841	4,840	100.00	—	—	14,636	14,636	100.00	—	—
屏東縣	3	25,958	10,190	9,991	98.06	—	—	13,171	13,154	99.88	—	—
花蓮縣	3	14,375	5,670	5,598	98.73	—	—	7,267	7,267	100.00	—	—
臺東縣	3	12,031	4,240	4,236	99.93	—	—	6,587	6,572	99.78	—	—
澎湖縣	3	14,057	5,919	5,910	99.86	—	—	6,731	6,705	99.63	—	—
金門縣	3	9,585	3,156	3,141	99.53	—	—	4,512	3,151	69.84	1,352	29.96
連江縣	3	13,641	4,435	4,352	98.14	—	—	7,840	7,840	100.00	—	—

註：1. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

2. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-8 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算人才培育促進就業建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形明細表

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	74	1,732,762	437,522	420,788	96.18	—	—	992,837	992,837	100.00	—	—
臺北市	11	317,172	86,243	81,541	94.55	—	—	174,711	174,711	100.00	—	—
新北市	16	383,780	95,831	93,499	97.57	—	—	224,820	224,820	100.00	—	—
桃園市	12	267,989	58,809	56,007	95.24	—	—	155,575	155,575	100.00	—	—
臺中市	14	508,322	134,521	128,637	95.63	—	—	285,938	285,938	100.00	—	—
高雄市	11	247,342	59,926	59,245	98.86	—	—	146,978	146,978	100.00	—	—
宜蘭縣	3	1,675	1,335	1,002	75.09	—	—	110	110	100.00	—	—
新竹市	1	923	—	—	—	—	—	777	777	100.00	—	—
苗栗縣	6	5,556	855	855	100.00	—	—	3,924	3,924	100.00	—	—


註：1. 核定補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

2. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

(三) 市縣別

圖1 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算補助地方政府計畫經費情形


單位：億元

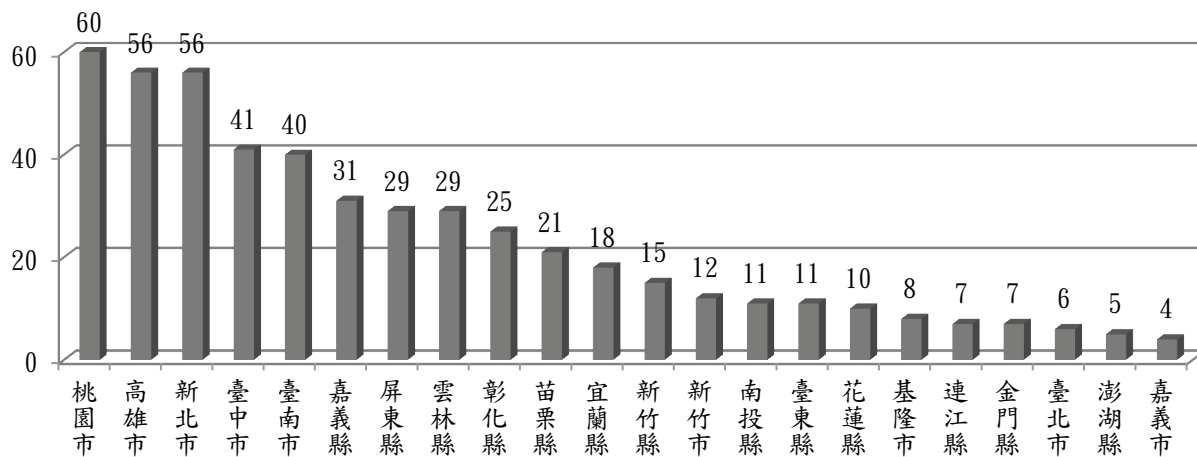

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖2 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算補助地方政府計畫經費情形


單位：億元

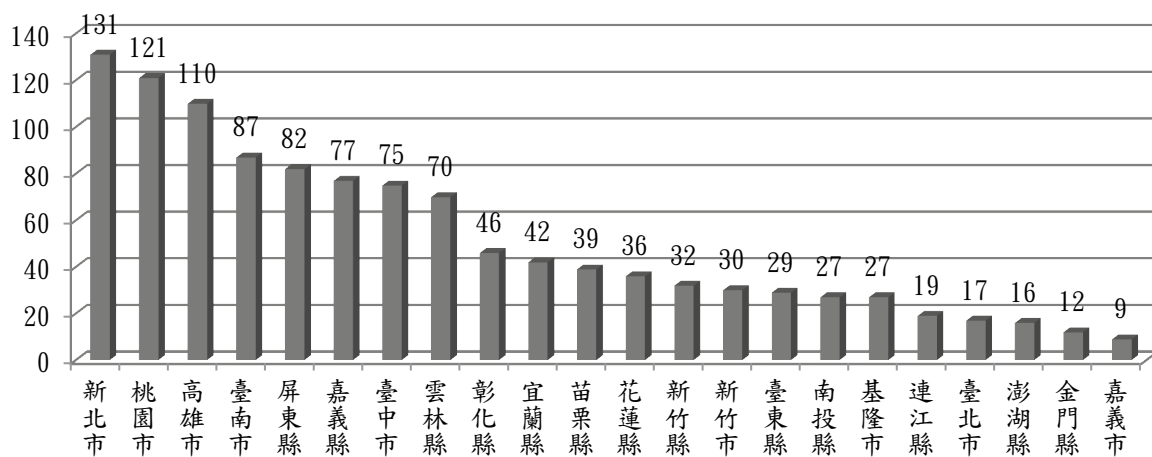

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖 3 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助地方政府計畫經費情形

單位：億元

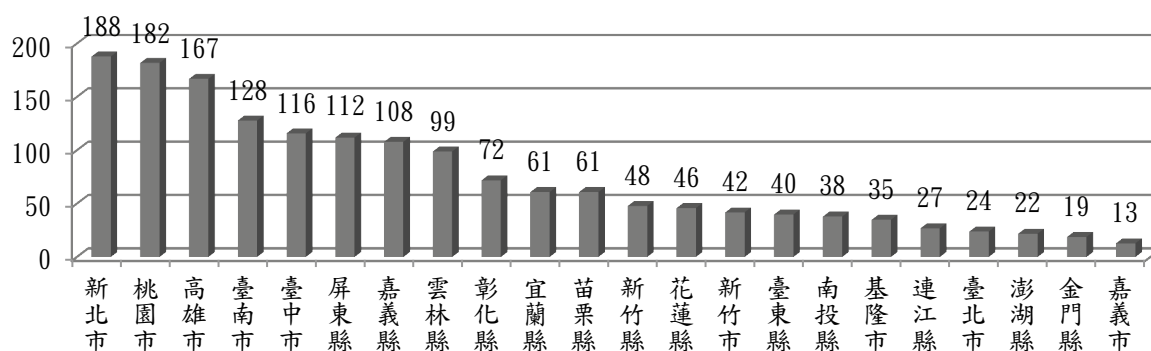

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助地方政府計畫經費執行情形總表（市縣別）

單位：件、新臺幣千元

單位：件、新臺幣千元

市縣別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	10,518	807,437,781	51,203,179	46,349,514	90.52	3,503,920	6.84	114,546,544	81,957,120	71.55	31,212,943	27.25
臺北市	255	142,817,275	632,840	600,288	94.86	8,000	1.26	1,780,405	1,583,769	88.96	191,695	10.77
新北市	660	164,019,653	5,633,270	5,578,323	99.02	20,273	0.36	13,179,832	11,943,881	90.62	1,160,396	8.80
桃園市	581	126,107,493	6,072,928	4,153,045	68.39	1,864,862	30.71	12,149,996	8,181,696	67.34	3,894,379	32.05
臺中市	802	22,004,653	4,101,760	4,014,078	97.86	48,756	1.19	7,551,250	5,431,696	71.93	1,792,987	23.74
臺南市	1,039	22,644,214	4,071,339	3,840,093	94.32	134,301	3.30	8,730,139	6,392,761	73.23	2,274,795	26.06
高雄市	754	192,135,747	5,688,358	5,414,785	95.19	225,068	3.96	11,017,237	7,407,413	67.23	3,525,783	32.00
基隆市	211	5,378,765	819,959	702,147	85.63	81,956	10.00	2,759,485	1,593,645	57.75	1,146,187	41.54
宜蘭縣	445	9,689,644	1,873,794	1,792,479	95.66	40,780	2.18	4,283,040	3,136,100	73.22	995,915	23.25
新竹縣	344	8,329,052	1,580,929	1,525,479	96.49	31,739	2.01	3,230,022	2,374,055	73.50	834,990	25.85
新竹市	261	7,368,036	1,231,277	1,077,525	87.51	141,846	11.52	3,067,426	2,012,797	65.62	1,027,693	33.50
苗栗縣	531	9,369,782	2,167,769	2,080,104	95.96	65,210	3.01	3,987,049	2,877,452	72.17	1,077,690	27.03
彰化縣	508	12,505,286	2,553,818	2,278,271	89.21	158,094	6.19	4,685,345	2,680,704	57.21	1,951,763	41.66
南投縣	382	6,945,790	1,128,420	1,046,601	92.75	19,800	1.75	2,761,935	2,019,253	73.11	645,254	23.36
雲林縣	771	16,323,662	2,900,487	2,248,875	77.53	176,378	6.08	7,002,428	4,665,362	66.62	2,275,864	32.50
嘉義縣	764	19,256,095	3,132,818	3,032,999	96.81	45,154	1.44	7,736,668	5,648,039	73.00	2,040,662	26.38
嘉義市	156	2,699,679	419,137	393,237	93.82	—	—	964,888	672,080	69.65	279,550	28.97
屏東縣	785	18,606,963	2,992,840	2,710,794	90.58	234,925	7.85	8,240,777	5,316,729	64.52	2,837,607	34.43
花蓮縣	421	6,014,044	1,029,836	992,314	96.36	22,593	2.19	3,647,471	2,545,697	69.79	1,088,067	29.83
臺東縣	341	5,452,783	1,112,636	1,000,358	89.91	51,586	4.64	2,939,819	2,178,142	74.09	691,183	23.51
澎湖縣	207	2,797,390	563,853	542,557	96.22	11,506	2.04	1,656,809	1,324,653	79.95	319,139	19.26
金門縣	165	3,362,059	704,827	645,139	91.53	15,487	2.20	1,264,175	747,560	59.13	495,885	39.23
連江縣	135	3,609,705	790,273	680,013	86.05	105,599	13.36	1,910,338	1,223,624	64.05	665,448	34.83

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 512 億 317 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 559 億 6,366 萬餘元不同，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-1-1 臺北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	255	142,817,275	632,840	600,288	94.86	8,000	1.26	1,780,405	1,583,769	88.96	191,695	10.77
行政院（本院）	2	270,008	65,000	56,029	86.20	—	—	70,004	69,990	99.98	—	—
內政部	11	498,193	75,737	66,319	87.56	—	—	80,538	60,560	75.19	19,977	24.81
財政部	2	63,421	19,951	19,951	100.00	—	—	11,751	11,751	100.00	—	—
教育部	73	1,507,533	317,297	312,549	98.50	—	—	672,885	662,576	98.47	8,832	1.31
經濟部	5	815,865	3,770	3,770	100.00	—	—	318,365	318,275	99.97	—	—
交通部	3	138,172,502	—	—	—	—	—	297,447	292,833	98.45	4,613	1.55
衛生福利部	101	614,643	73,624	65,534	89.01	8,000	10.87	153,805	29,899	19.44	123,700	80.43
文化部	58	875,108	77,460	76,135	98.29	—	—	175,608	137,882	78.52	34,572	19.69

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 6 億 3,284 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 6 億 3,377 萬餘元不同，差異 93 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-1-2 臺北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	255	142,817,275	632,840	600,288	94.86	8,000	1.26	1,780,405	1,583,769	88.96	191,695	10.77
軌道建設	1	136,905,710	—	—	—	—	—	235,000	230,386	98.04	4,613	1.96
水環境建設	3	803,900	—	—	—	—	—	317,400	317,400	100.00	—	—
數位建設	59	1,519,244	361,960	343,579	94.92	—	—	541,032	533,095	98.53	7,476	1.38
城鄉建設	88	3,141,565	159,661	150,283	94.13	8,000	5.01	498,157	314,277	63.09	179,605	36.05
因應少子化友善育兒空間建設	93	129,682	24,974	24,884	99.64	—	—	14,105	13,899	98.54	—	—
人才培育促進就業建設	11	317,172	86,243	81,541	94.55	—	—	174,711	174,711	100.00	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 6 億 3,284 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 6 億 3,377 萬餘元不同，差異 93 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-2-1 新北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	660	164,019,653	5,633,270	5,578,323	99.02	20,273	0.36	13,179,832	11,943,881	90.62	1,160,396	8.80
行政院（本院）	2	271,785	41,491	41,491	100.00	—	—	121,580	113,580	93.42	—	—
原住民族委員會	11	115,357	15,379	15,246	99.13	—	—	40,544	38,609	95.23	1,934	4.77
內政部	183	6,677,071	1,566,611	1,557,769	99.44	—	—	1,585,701	1,358,669	85.68	201,465	12.71
財政部	2	41,233	13,840	13,840	100.00	—	—	10,900	10,900	100.00	—	—
教育部	122	3,117,603	812,440	809,738	99.67	—	—	1,361,108	1,074,759	78.96	272,346	20.01
經濟部	85	7,458,423	285,867	247,244	86.49	18,258	6.39	2,537,236	2,107,658	83.07	429,497	16.93
交通部	38	143,901,066	2,714,702	2,714,702	100.00	—	—	6,514,409	6,483,987	99.53	16,375	0.25
農業委員會	7	133,661	6,488	6,488	100.00	—	—	86,918	83,989	96.63	—	—
衛生福利部	125	708,465	99,335	94,933	95.57	2,015	2.03	179,557	99,456	55.39	75,985	42.32
環境保護署	9	345,098	9,796	9,796	100.00	—	—	195,160	56,374	28.89	138,786	71.11
文化部	76	1,249,888	67,316	67,073	99.64	—	—	546,716	515,894	94.36	24,005	4.39

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 56 億 3,327 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 56 億 8,479 萬餘元不同，差異 5,152 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-2-2 新北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	660	164,019,653	5,633,270	5,578,323	99.02	20,273	0.36	13,179,832	11,943,881	90.62	1,160,396	8.80
軌道建設	4	137,667,651	2,139,539	2,139,539	100.00	—	—	5,373,817	5,361,526	99.77	12,290	0.23
水環境建設	69	6,051,309	1,058,497	1,051,535	99.34	—	—	1,865,914	1,240,737	66.49	591,311	31.69
數位建設	60	1,678,932	485,240	485,239	100.00	—	—	767,489	759,117	98.91	—	—
城鄉建設	412	17,776,311	1,781,099	1,735,968	97.47	20,273	1.14	4,831,406	4,267,733	88.33	533,993	11.05
因應少子化友善育兒空間建設	96	429,719	60,660	60,660	100.00	—	—	104,827	78,390	74.78	22,800	21.75
食品安全建設	3	31,948	12,403	11,881	95.80	—	—	11,557	11,557	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	16	383,780	95,831	93,499	97.57	—	—	224,820	224,820	100.00	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 56 億 3,327 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 56 億 8,479 萬餘元不同，差異 5,152 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-3-1 桃園市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	補助金額
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	581	126,107,493	6,072,928	4,153,045	68.39	1,864,862	30.71	12,149,996	8,181,696	67.34	3,894,379	32.05		
行政院（本院）	2	155,248	25,811	21,782	84.39	—	—	67,338	39,767	59.06	25,433	37.77		
原住民族委員會	11	37,111	8,716	7,322	84.01	—	—	19,136	15,758	82.34	3,378	17.66		
客家委員會及所屬	12	1,684,130	483,562	483,541	100.00	—	—	699,668	676,431	96.68	23,237	3.32		
內政部	103	8,331,164	1,228,549	1,222,158	99.48	3,645	0.30	3,055,024	2,219,315	72.64	808,788	26.47		
財政部	2	20,703	7,690	7,690	100.00	—	—	4,730	4,730	100.00	—	—		
教育部	76	4,545,407	926,491	688,609	74.32	235,070	25.37	1,252,785	899,773	71.82	351,682	28.07		
經濟部	103	4,593,627	692,322	644,850	93.14	18,931	2.73	1,568,065	1,094,638	69.81	473,024	30.17		
交通部	37	102,710,203	1,982,790	421,853	21.28	1,560,937	78.72	3,934,295	2,295,233	58.34	1,639,062	41.66		
農業委員會	1	118,500	75,545	75,530	99.98	—	—	—	—	—	—	—		
衛生福利部	142	905,606	172,004	135,121	78.56	22,484	13.07	298,381	96,540	32.35	169,597	56.84		
環境保護署	25	1,174,865	337,763	312,923	92.65	23,792	7.04	433,063	115,132	26.59	317,930	73.41		
文化部	67	1,830,924	131,680	131,662	99.99	—	—	817,506	724,376	88.61	82,245	10.06		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 60 億 7,292 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 60 億 5,538 萬餘元不同，差異 1,754 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
 2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-3-2 桃園市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	補助金額
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	581	126,107,493	6,072,928	4,153,045	68.39	1,864,862	30.71	12,149,996	8,181,696	67.34	3,894,379	32.05		
軌道建設	2	98,407,000	1,609,000	48,062	2.99	1,560,937	97.01	2,968,000	1,328,937	44.78	1,639,062	55.22		
水環境建設	106	9,151,764	1,487,940	1,438,404	96.67	27,437	1.84	3,774,183	2,330,623	61.75	1,427,771	37.83		
數位建設	52	1,120,265	335,297	329,316	98.22	—	—	519,797	485,843	93.47	30,900	5.94		
城鄉建設	339	16,491,205	2,459,679	2,173,572	88.37	263,602	10.72	4,509,127	3,795,508	84.17	683,693	15.16		
因應少子化友善育兒空間建設	67	642,530	113,831	99,513	87.42	12,884	11.32	211,629	81,026	38.29	106,779	50.46		
食品安全建設	3	26,738	8,370	8,168	97.59	—	—	11,683	4,181	35.79	6,172	52.83		
人才培育促進就業建設	12	267,989	58,809	56,007	95.24	—	—	155,575	155,575	100.00	—	—		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 60 億 7,292 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 60 億 5,538 萬餘元不同，差異 1,754 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
 2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-4-1 臺中市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	補助金額
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	802	22,004,653	4,101,760	4,014,078	97.86	48,756	1.19	7,551,250	5,431,696	71.93	1,792,987	23.74		
行政院（本院）	2	94,290	14,952	14,952	100.00	—	—	41,622	41,498	99.70	—	—		
原住民族委員會	9	129,863	28,951	22,923	79.18	—	—	61,177	53,305	87.13	7,871	12.87		
客家委員會及所屬	9	192,415	59,599	59,029	99.04	—	—	78,247	72,247	92.33	6,000	7.67		
內政部	190	6,554,569	879,998	872,849	99.19	—	—	2,299,232	1,741,491	75.74	274,565	11.94		
財政部	2	11,490	1,112	1,105	99.34	—	—	5,547	5,547	100.00	—	—		
教育部	120	2,991,473	952,624	942,397	98.93	—	—	1,281,661	1,101,200	85.92	159,188	12.42		
經濟部	252	2,187,693	693,362	657,598	94.84	29,396	4.24	731,062	465,132	63.62	259,956	35.56		
交通部	28	2,951,948	350,601	337,498	96.26	13,103	3.74	476,582	379,843	79.70	96,738	20.30		
衛生福利部	93	563,767	83,617	71,302	85.27	6,257	7.48	301,862	63,197	20.94	223,968	74.20		
環境保護署	23	3,030,087	804,477	801,960	99.69	—	—	1,197,038	640,129	53.48	556,909	46.52		
文化部	74	3,297,055	232,463	232,463	100.00	—	—	1,077,214	868,101	80.59	207,788	19.29		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 41 億 176 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 40 億 7,338 萬餘元不同，差異 2,837 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-4-2 臺中市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	補助金額
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	802	22,004,653	4,101,760	4,014,078	97.86	48,756	1.19	7,551,250	5,431,696	71.93	1,792,987	23.74		
軌道建設	2	115,026	24,920	11,817	47.42	13,103	52.58	49,200	—	—	49,200	100.00		
水環境建設	94	7,078,004	1,296,722	1,287,356	99.28	—	—	3,213,763	1,963,457	61.10	981,053	30.53		
數位建設	63	1,366,298	452,641	452,310	99.93	—	—	597,835	587,000	98.19	8,960	1.50		
城鄉建設	586	12,376,636	1,965,271	1,909,930	97.18	35,653	1.81	3,238,315	2,505,402	77.37	686,348	21.19		
因應少子化友善育兒空間建設	40	543,674	220,980	217,458	98.41	—	—	160,382	86,339	53.83	65,170	40.63		
食品安全建設	3	16,692	6,704	6,568	97.98	—	—	5,814	3,557	61.19	2,256	38.80		
人才培育促進就業建設	14	508,322	134,521	128,637	95.63	—	—	285,938	285,938	100.00	—	—		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 41 億 176 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 40 億 7,338 萬餘元不同，差異 2,837 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-5-1 臺南市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,039	22,644,214	4,071,339	3,840,093	94.32	134,301	3.30	8,730,139	6,392,761	73.23	2,274,795	26.06
行政院（本院）	2	97,677	24,126	24,124	99.99	—	—	44,248	42,658	96.41	1,563	3.53
原住民族委員會	2	1,867	1,030	1,030	100.00	—	—	837	837	100.00	—	—
內政部	257	6,666,193	1,277,252	1,242,138	97.25	216	0.02	2,862,107	2,162,122	75.54	682,669	23.85
財政部	2	20,192	8,544	8,544	100.00	—	—	5,590	5,590	100.00	—	—
教育部	68	4,390,546	973,221	883,614	90.79	89,457	9.19	1,033,114	574,132	55.57	453,540	43.90
經濟部	354	4,039,341	629,921	599,671	95.20	5,975	0.95	2,031,942	1,805,095	88.84	221,158	10.88
交通部	31	4,300,575	496,285	481,285	96.98	15,000	3.02	1,436,923	983,209	68.42	450,701	31.37
農業委員會	2	27,523	9,557	9,494	99.35	—	—	11,555	11,555	100.00	—	—
衛生福利部	220	609,625	283,773	229,927	81.03	18,388	6.48	202,990	83,269	41.02	102,090	50.29
環境保護署	23	524,993	113,963	108,698	95.38	5,265	4.62	252,971	187,546	74.14	65,425	25.86
文化部	78	1,965,677	253,665	251,565	99.17	—	—	847,857	536,744	63.31	297,645	35.11

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 40 億 7,133 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 70 億 8,226 萬餘元不同，差異 30 億 1,092 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
 2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-5-2 臺南市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,039	22,644,214	4,071,339	3,840,093	94.32	134,301	3.30	8,730,139	6,392,761	73.23	2,274,795	26.06
軌道建設	1	269,000	15,000	—	—	15,000	100.00	97,000	4,564	4.71	92,435	95.29
水環境建設	134	6,889,653	1,050,427	1,020,171	97.12	5,265	0.50	3,147,381	2,664,482	84.66	469,347	14.91
綠能建設	2	2,023,000	381,406	381,406	100.00	—	—	1,076,299	1,062,251	98.69	14,047	1.31
數位建設	38	938,388	312,608	312,575	99.99	—	—	444,689	442,799	99.57	1,763	0.40
城鄉建設	819	12,079,228	2,109,029	1,927,638	91.40	110,978	5.26	3,803,252	2,093,273	55.04	1,674,946	44.04
因應少子化友善育兒空間建設	42	403,542	180,318	175,990	97.60	3,058	1.70	150,945	114,819	76.07	22,253	14.74
食品安全建設	3	41,402	22,550	22,311	98.94	—	—	10,571	10,571	100.00	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 40 億 7,133 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 70 億 8,226 萬餘元不同，差異 30 億 1,092 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
 2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-6-1 高雄市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	754	192,135,747	5,688,358	5,414,785	95.19	225,068	3.96	11,017,237	7,407,413	67.23	3,525,783	32.00
行政院（本院）	2	173,613	24,786	24,784	99.99	—	—	96,743	53,699	55.51	43,043	44.49
原住民族委員會	19	231,723	69,014	62,168	90.08	—	—	78,324	76,976	98.28	1,347	1.72
內政部	209	5,893,376	1,457,591	1,439,573	98.76	—	—	3,110,388	1,821,582	58.56	1,272,902	40.92
財政部	2	27,194	11,005	11,005	100.00	—	—	8,025	8,024	100.00	—	—
教育部	94	3,392,619	1,103,670	1,049,715	95.11	49,707	4.50	1,560,600	1,168,840	74.90	385,607	24.71
經濟部	196	9,498,884	1,359,912	1,352,950	99.49	—	—	2,765,603	2,387,560	86.33	351,408	12.71
交通部	44	169,277,795	760,628	678,640	89.22	81,987	10.78	1,680,520	645,908	38.43	1,034,022	61.53
農業委員會	9	728,631	264,953	262,337	99.01	—	—	316,425	233,874	73.91	72,813	23.01
衛生福利部	99	616,935	228,236	128,471	56.29	93,374	40.91	248,601	142,459	57.30	83,706	33.67
環境保護署	18	439,534	82,882	80,911	97.62	—	—	207,350	116,352	56.11	90,997	43.89
文化部	62	1,855,438	325,678	324,227	99.55	—	—	944,654	752,134	79.62	189,933	20.11

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 56 億 8,835 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 65 億 7,573 萬餘元不同，差異 8 億 8,737 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-6-2 高雄市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	754	192,135,747	5,688,358	5,414,785	95.19	225,068	3.96	11,017,237	7,407,413	67.23	3,525,783	32.00
軌道建設	4	167,142,070	474,000	392,012	82.70	81,987	17.30	1,033,000	—	—	1,033,000	100.00
水環境建設	196	8,572,849	1,628,057	1,609,581	98.87	—	—	3,469,303	2,640,253	76.10	813,808	23.46
數位建設	57	2,621,147	623,889	616,951	98.89	—	—	1,331,624	1,193,435	89.62	127,093	9.54
城鄉建設	426	12,806,522	2,528,463	2,365,688	93.56	143,081	5.66	4,819,329	3,241,803	67.27	1,536,742	31.89
因應少子化友善育兒空間建設	57	696,184	346,710	344,841	99.46	—	—	204,609	172,550	84.33	15,138	7.40
食品安全建設	3	49,631	27,312	26,464	96.90	—	—	12,392	12,392	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	11	247,342	59,926	59,245	98.86	—	—	146,978	146,978	100.00	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 56 億 8,835 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 65 億 7,573 萬餘元不同，差異 8 億 8,737 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-7-1 基隆市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	211	5,378,765	819,959	702,147	85.63	81,956	10.00	2,759,485	1,593,645	57.75	1,146,187	41.54
行政院（本院）	2	119,595	23,397	23,390	99.97	—	—	60,320	49,398	81.89	10,921	18.11
原住民族委員會	1	22,172	—	—	—	—	—	14,203	13,493	95.00	710	5.00
內政部	57	1,353,018	160,649	158,291	98.53	—	—	869,094	493,193	56.75	371,120	42.70
財政部	2	7,200	2,539	2,539	100.00	—	—	2,500	2,500	100.00	—	—
教育部	48	865,754	208,526	182,771	87.65	25,400	12.18	415,491	265,078	63.80	143,528	34.54
經濟部	28	681,631	219,894	152,229	69.23	37,930	17.25	189,456	125,098	66.03	63,928	33.74
交通部	4	505,219	3,720	3,720	100.00	—	—	200,421	200,421	100.00	—	—
農業委員會	1	56,727	—	—	—	—	—	43,673	29,506	67.56	14,166	32.44
衛生福利部	25	115,827	45,525	24,082	52.90	18,626	40.91	50,788	12,730	25.07	35,236	69.38
環境保護署	14	448,779	6,724	6,724	100.00	—	—	336,868	64,891	19.26	271,977	80.74
文化部	29	1,202,840	148,983	148,398	99.61	—	—	576,666	337,332	58.50	234,597	40.68

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 8 億 1,995 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 9 億 4,357 萬餘元不同，差異 1 億 2,361 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
 2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-7-2 基隆市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	211	5,378,765	819,959	702,147	85.63	81,956	10.00	2,759,485	1,593,645	57.75	1,146,187	41.54
水環境建設	31	867,107	99,285	91,171	91.83	—	—	469,907	170,253	36.23	299,648	63.77
數位建設	36	340,143	100,044	99,682	99.64	—	—	161,061	149,630	92.90	11,313	7.02
城鄉建設	132	3,947,728	536,576	428,912	79.93	81,956	15.27	2,024,660	1,189,259	58.74	816,854	40.35
因應少子化友善育兒空間建設	9	206,250	76,880	75,380	98.05	—	—	97,000	77,645	80.05	18,371	18.94
食品安全建設	3	17,535	7,172	7,001	97.63	—	—	6,856	6,856	100.00	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 8 億 1,995 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 9 億 4,357 萬餘元不同，差異 1 億 2,361 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
 2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-8-1 宜蘭縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	445	9,689,644	1,873,794	1,792,479	95.66	40,780	2.18	4,283,040	3,136,100	73.22	995,915	23.25
行政院（本院）	2	164,080	53,664	53,664	100.00	—	—	77,600	77,545	99.93	—	—
原住民族委員會	16	227,179	28,141	27,217	96.72	—	—	116,154	90,376	77.81	25,778	22.19
內政部	83	2,390,799	770,655	737,095	95.65	12,746	1.65	1,036,520	823,327	79.43	204,383	19.72
財政部	2	5,113	2,566	2,566	100.00	—	—	1,525	1,525	100.00	—	—
教育部	66	1,341,661	268,822	260,829	97.03	7,261	2.70	777,078	444,062	57.15	326,872	42.06
經濟部	69	1,757,517	152,706	150,142	98.32	1,150	0.75	809,288	582,814	72.02	222,815	27.53
交通部	29	2,427,102	270,355	270,355	100.00	—	—	676,147	597,578	88.38	2,535	0.37
衛生福利部	112	422,672	168,763	135,651	80.38	19,622	11.63	206,602	103,285	49.99	86,796	42.01
環境保護署	11	123,912	24,927	22,480	90.18	—	—	66,603	59,225	88.92	7,377	11.08
文化部	55	829,605	133,190	132,477	99.46	—	—	515,520	356,360	69.13	119,356	23.15

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 18 億 7,379 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 19 億 4,193 萬餘元不同，差異 6,814 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-8-2 宜蘭縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	445	9,689,644	1,873,794	1,792,479	95.66	40,780	2.18	4,283,040	3,136,100	73.22	995,915	23.25
水環境建設	58	2,197,421	211,242	202,423	95.83	1,150	0.54	1,117,702	775,487	69.38	265,340	23.74
數位建設	36	480,410	155,459	153,746	98.90	—	—	244,056	241,738	99.05	1,964	0.80
城鄉建設	320	6,824,088	1,442,742	1,373,378	95.19	39,630	2.75	2,819,560	2,030,783	72.02	722,410	25.62
因應少子化友善育兒空間建設	25	164,341	50,600	49,879	98.58	—	—	95,575	81,947	85.74	6,200	6.49
食品安全建設	3	21,707	12,415	12,049	97.06	—	—	6,035	6,033	99.98	—	—
人才培育促進就業建設	3	1,675	1,335	1,002	75.09	—	—	110	110	100.00	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 18 億 7,379 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 19 億 4,193 萬餘元不同，差異 6,814 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-9-1 新竹縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	344	8,329,052	1,580,929	1,525,479	96.49	31,739	2.01	3,230,022	2,374,055	73.50	834,990	25.85
行政院（本院）	2	102,168	12,252	12,191	99.50	—	—	59,265	59,251	99.98	—	—
原住民族委員會	12	86,050	9,524	8,949	93.96	—	—	56,176	43,572	77.56	12,603	22.44
客家委員會及所屬	8	325,710	85,390	85,279	99.87	—	—	116,960	116,960	100.00	—	—
內政部	119	2,813,180	677,824	670,517	98.92	3,976	0.59	1,140,206	710,214	62.29	427,099	37.46
財政部	2	11,183	5,071	5,071	100.00	—	—	2,750	2,750	100.00	—	—
教育部	42	675,775	216,603	216,598	100.00	—	—	321,134	301,266	93.81	19,693	6.13
經濟部	74	2,032,626	268,754	252,642	94.00	—	—	647,588	430,865	66.53	215,049	33.21
交通部	20	1,640,755	188,065	188,065	100.00	—	—	576,651	576,651	100.00	—	—
農業委員會	5	109,174	—	—	—	—	—	78,930	52,916	67.04	19,390	24.57
衛生福利部	30	372,188	83,138	52,638	63.31	27,667	33.28	164,824	20,725	12.57	136,866	83.04
環境保護署	3	50,398	15,995	15,215	95.12	95	0.60	11,005	6,718	61.04	4,287	38.96
文化部	27	109,842	18,310	18,310	100.00	—	—	54,529	52,164	95.66	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 15 億 8,092 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 15 億 9,100 萬餘元不同，差異 1,007 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-9-2 新竹縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	344	8,329,052	1,580,929	1,525,479	96.49	31,739	2.01	3,230,022	2,374,055	73.50	834,990	25.85
水環境建設	53	1,163,879	85,184	68,979	80.98	95	0.11	604,395	392,552	64.95	204,409	33.82
數位建設	41	488,666	135,698	135,637	99.96	—	—	246,037	242,745	98.66	686	0.28
城鄉建設	231	6,361,386	1,257,700	1,218,518	96.88	31,643	2.52	2,210,933	1,667,132	75.40	539,540	24.40
因應少子化友善育兒空間建設	16	300,877	99,550	99,547	100.00	—	—	160,058	63,028	39.38	90,354	56.45
食品安全建設	3	14,243	2,796	2,796	100.00	—	—	8,598	8,597	99.99	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 15 億 8,092 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 15 億 9,100 萬餘元不同，差異 1,007 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-10-1 新竹市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		金額	%
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	261	7,368,036	1,231,277	1,077,525	87.51	141,846	11.52	3,067,426	2,012,797	65.62	1,027,693	33.50		
行政院（本院）	2	58,334	12,444	11,600	93.22	—	—	28,390	28,390	100.00	—	—		
原住民族委員會	3	35,575	790	790	100.00	—	—	15,530	15,530	100.00	—	—		
內政部	61	1,837,314	213,382	211,145	98.95	—	—	760,863	672,348	88.37	85,009	11.17		
財政部	2	5,274	2,241	2,241	100.00	—	—	1,450	1,450	100.00	—	—		
教育部	49	1,559,590	443,724	383,536	86.44	60,087	13.54	702,614	229,030	32.60	471,678	67.13		
經濟部	53	1,748,911	267,108	223,237	83.58	42,876	16.05	626,885	431,509	68.83	195,287	31.15		
交通部	17	922,825	25,978	22,899	88.15	3,079	11.85	375,813	297,351	79.12	75,171	20.00		
農業委員會	6	322,643	145,350	143,904	99.01	—	—	102,275	68,380	66.86	33,108	32.37		
衛生福利部	21	161,875	58,367	16,819	28.82	35,804	61.34	34,443	8,196	23.80	25,607	74.35		
環境保護署	10	125,574	8,823	8,823	100.00	—	—	61,948	11,413	18.42	50,534	81.58		
文化部	37	590,119	53,067	52,527	98.98	—	—	357,213	249,198	69.76	91,296	25.56		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 12 億 3,127 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 12 億 3,839 萬餘元不同，差異 712 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-10-2 新竹市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		金額	%
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	261	7,368,036	1,231,277	1,077,525	87.51	141,846	11.52	3,067,426	2,012,797	65.62	1,027,693	33.50		
軌道建設	2	130,280	24,000	20,920	87.17	3,079	12.83	70,200	—	—	70,200	100.00		
水環境建設	62	2,251,548	368,071	366,416	99.55	—	—	849,924	581,071	68.37	264,774	31.15		
數位建設	39	329,076	76,702	74,634	97.30	—	—	187,958	185,459	98.67	2,224	1.18		
城鄉建設	144	4,566,332	737,846	591,854	80.21	138,767	18.81	1,923,118	1,229,512	63.93	671,664	34.93		
因應少子化友善育兒空間建設	10	78,600	21,957	21,400	97.46	—	—	29,126	9,684	33.25	18,830	64.65		
食品安全建設	3	11,275	2,700	2,299	85.15	—	—	6,320	6,291	99.56	—	—		
人才培育促進就業建設	1	923	—	—	—	—	—	777	777	100.00	—	—		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 12 億 3,127 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 12 億 3,839 萬餘元不同，差異 712 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-11-1 苗栗縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	補助金額
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	531	9,369,782	2,167,769	2,080,104	95.96	65,210	3.01	3,987,049	2,877,452	72.17	1,077,690	27.03		
行政院（本院）	2	81,748	14,474	14,434	99.72	—	—	59,100	47,905	81.06	10,627	17.98		
原住民族委員會	16	83,578	24,801	24,408	98.41	—	—	50,818	50,559	99.49	258	0.51		
客家委員會及所屬	20	518,348	102,984	102,781	99.80	—	—	292,884	269,045	91.86	23,838	8.14		
內政部	207	3,649,272	613,678	606,987	98.91	—	—	1,692,542	1,047,871	61.91	638,244	37.71		
財政部	2	5,241	2,541	2,541	100.00	—	—	2,175	2,175	100.00	—	—		
教育部	70	1,154,605	494,861	486,582	98.33	5,184	1.05	510,583	397,675	77.89	102,609	20.10		
經濟部	92	1,865,163	330,246	329,336	99.72	—	—	501,183	331,648	66.17	167,985	33.52		
交通部	21	1,001,757	235,651	235,651	100.00	—	—	438,294	424,803	96.92	13,490	3.08		
農業委員會	1	97,000	84,091	82,552	98.17	—	—	—	—	—	—	—		
衛生福利部	51	356,616	121,418	57,337	47.22	60,026	49.44	109,588	35,062	31.99	63,900	58.31		
環境保護署	11	283,806	111,733	108,214	96.85	—	—	133,115	97,174	73.00	35,940	27.00		
文化部	38	272,644	31,286	29,276	93.58	—	—	196,764	173,532	88.19	20,795	10.57		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 21 億 6,776 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 21 億 9,934 萬餘元不同，差異 3,157 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
 2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-11-2 苗栗縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	補助金額
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	531	9,369,782	2,167,769	2,080,104	95.96	65,210	3.01	3,987,049	2,877,452	72.17	1,077,690	27.03		
水環境建設	68	2,235,731	439,115	433,103	98.63	—	—	764,380	563,297	73.69	200,508	26.23		
數位建設	41	465,322	158,324	158,234	99.94	—	—	259,083	246,526	95.15	11,607	4.48		
城鄉建設	397	6,395,187	1,437,767	1,356,417	94.34	65,210	4.54	2,849,273	1,968,223	69.08	859,325	30.16		
因應少子化友善育兒空間建設	16	250,719	124,110	124,109	100.00	—	—	102,445	87,546	85.46	6,248	6.10		
食品安全建設	3	17,266	7,596	7,384	97.21	—	—	7,942	7,933	99.89	—	—		
人才培育促進就業建設	6	5,556	855	855	100.00	—	—	3,924	3,924	100.00	—	—		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 21 億 6,776 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 21 億 9,934 萬餘元不同，差異 3,157 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
 2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-12-1 彰化縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	508	12,505,286	2,553,818	2,278,271	89.21	158,094	6.19	4,685,345	2,680,704	57.21	1,951,763	41.66
行政院（本院）	2	87,875	10,504	10,059	95.76	—	—	59,796	57,632	96.38	948	1.59
內政部	185	3,871,713	1,034,328	995,639	96.26	—	—	1,347,884	800,177	59.37	519,311	38.53
財政部	2	12,983	6,101	6,101	100.00	—	—	4,140	4,097	98.95	—	—
教育部	56	1,265,007	368,847	364,691	98.87	—	—	619,491	509,594	82.26	105,749	17.07
經濟部	143	4,667,642	726,396	629,496	86.66	51,994	7.16	1,122,624	793,676	70.70	321,711	28.66
交通部	19	575,962	86,781	86,781	100.00	—	—	267,904	263,107	98.21	4,624	1.73
農業委員會	1	97,348	10,662	10,662	100.00	—	—	69,163	52,607	76.06	16,213	23.44
衛生福利部	61	1,388,629	122,547	14,781	12.06	106,099	86.58	966,257	22,510	2.33	933,235	96.58
環境保護署	5	148,800	93,892	93,892	100.00	—	—	22,527	14,785	65.63	7,742	34.37
文化部	34	389,324	93,757	66,166	70.57	—	—	205,556	162,516	79.06	42,227	20.54

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 25 億 5,381 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 26 億 730 萬餘元不同，差異 5,348 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-12-2 彰化縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	508	12,505,286	2,553,818	2,278,271	89.21	158,094	6.19	4,685,345	2,680,704	57.21	1,951,763	41.66
水環境建設	96	4,283,533	462,284	429,726	92.96	7,203	1.56	1,269,841	863,480	68.00	400,385	31.53
數位建設	33	706,083	226,052	225,124	99.59	—	—	375,642	369,531	98.37	3,980	1.06
城鄉建設	371	7,288,508	1,797,459	1,555,398	86.53	150,890	8.39	2,925,311	1,370,945	46.86	1,509,961	51.62
因應少子化友善育兒空間建設	5	208,293	64,250	64,250	100.00	—	—	103,350	72,982	70.62	30,000	29.03
食品安全建設	3	18,868	3,772	3,772	100.00	—	—	11,200	3,765	33.62	7,435	66.38

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 25 億 5,381 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 26 億 730 萬餘元不同，差異 5,348 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-13-1 南投縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元												
中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	382	6,945,790	1,128,420	1,046,601	92.75	19,800	1.75	2,761,935	2,019,253	73.11	645,254	23.36
行政院（本院）	2	62,250	10,800	10,666	98.76	—	—	39,000	15,623	40.06	22,651	58.08
原住民族委員會	28	186,824	51,522	45,768	88.83	—	—	114,965	112,699	98.03	2,265	1.97
內政部	145	2,943,433	544,301	513,225	94.29	—	—	1,176,438	912,445	77.56	210,328	17.88
財政部	2	5,667	2,809	2,809	100.00	—	—	1,725	1,725	100.00	—	—
教育部	48	744,316	189,784	189,350	99.77	—	—	436,429	308,127	70.60	125,660	28.79
經濟部	40	1,508,044	66,557	47,248	70.99	6,300	9.47	140,787	114,349	81.22	26,231	18.63
交通部	18	802,596	133,000	133,000	100.00	—	—	423,535	413,899	97.72	9,635	2.28
衛生福利部	64	469,255	91,236	66,604	73.00	13,500	14.80	296,390	48,644	16.41	236,647	79.84
環境保護署	8	48,477	14,614	14,614	100.00	—	—	18,393	18,393	100.00	—	—
文化部	27	174,924	23,794	23,314	97.98	—	—	114,270	73,344	64.19	11,834	10.36

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 11 億 2,842 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 11 億 5,441 萬餘元不同，差異 2,599 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
 2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-13-2 南投縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元												
建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	382	6,945,790	1,128,420	1,046,601	92.75	19,800	1.75	2,761,935	2,019,253	73.11	645,254	23.36
水環境建設	41	739,366	84,345	54,311	64.39	—	—	366,443	224,267	61.20	98,726	26.94
數位建設	35	455,593	148,456	148,171	99.81	—	—	239,304	214,345	89.57	23,817	9.95
城鄉建設	296	5,690,671	875,634	825,760	94.30	19,800	2.26	2,130,041	1,563,174	73.39	519,310	24.38
因應少子化友善育兒空間建設	7	42,111	12,464	10,964	87.97	—	—	18,325	9,696	52.91	3,400	18.55
食品安全建設	3	18,048	7,520	7,394	98.33	—	—	7,820	7,769	99.35	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 11 億 2,842 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 11 億 5,441 萬餘元不同，差異 2,599 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
 2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-14-1 雲林縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	771	16,323,662	2,900,487	2,248,875	77.53	176,378	6.08	7,002,428	4,665,362	66.62	2,275,864	32.50
行政院（本院）	2	63,389	10,771	10,662	99.00	—	—	39,940	10,299	25.79	28,757	72.00
內政部	207	5,312,552	1,151,027	1,139,430	98.99	746	0.06	2,134,732	1,664,688	77.98	454,887	21.31
財政部	2	11,365	5,536	5,536	100.00	—	—	3,550	3,550	100.00	—	—
教育部	62	722,845	159,519	159,265	99.84	—	—	432,844	373,125	86.20	59,580	13.76
經濟部	237	6,037,251	764,611	292,120	38.21	14,665	1.92	2,093,603	1,518,656	72.54	558,388	26.67
交通部	24	1,059,132	259,085	259,085	100.00	—	—	489,999	371,821	75.88	118,177	24.12
衛生福利部	155	916,878	218,582	52,817	24.16	160,653	73.50	490,309	55,337	11.29	419,018	85.46
環境保護署	23	1,466,931	189,374	188,793	99.69	313	0.17	896,243	326,100	36.39	570,142	63.61
文化部	59	733,316	141,980	141,163	99.42	—	—	421,205	341,781	81.14	66,911	15.89

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 29 億 48 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 30 億 4,648 萬餘元不同，差異 1 億 4,599 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-14-2 雲林縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	771	16,323,662	2,900,487	2,248,875	77.53	176,378	6.08	7,002,428	4,665,362	66.62	2,275,864	32.50
水環境建設	181	5,369,873	357,265	354,345	99.18	2,621	0.73	2,991,386	1,852,463	61.93	1,128,104	37.71
數位建設	38	530,884	174,771	174,614	99.91	—	—	275,329	244,660	88.86	29,737	10.80
城鄉建設	527	10,186,269	2,315,738	1,709,815	73.83	132,757	5.73	3,626,051	2,549,835	70.32	1,039,432	28.67
因應少子化友善育兒空間建設	22	222,095	47,785	5,453	11.41	41,000	85.80	102,230	11,014	10.77	78,589	76.88
食品安全建設	3	14,540	4,926	4,644	94.29	—	—	7,432	7,388	99.42	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 29 億 48 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 30 億 4,648 萬餘元不同，差異 1 億 4,599 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-15-1 嘉義縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	補助金額
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	764	19,256,095	3,132,818	3,032,999	96.81	45,154	1.44	7,736,668	5,648,039	73.00	2,040,662	26.38		
行政院（本院）	2	53,525	22,673	22,504	99.26	—	—	25,500	25,479	99.92	—	—		
原住民族委員會	10	30,790	8,296	7,331	88.37	—	—	17,996	17,363	96.48	632	3.52		
內政部	260	5,405,473	1,587,113	1,566,695	98.71	—	—	2,051,131	1,259,835	61.42	774,639	37.77		
財政部	2	5,716	2,545	2,545	100.00	—	—	2,600	2,600	100.00	—	—		
教育部	55	725,448	215,561	209,319	97.10	1,935	0.90	392,806	241,577	61.50	149,742	38.12		
經濟部	241	10,934,463	814,524	811,146	99.59	1,923	0.24	4,016,139	3,346,804	83.33	657,893	16.38		
交通部	20	900,540	227,378	227,378	100.00	—	—	446,156	412,966	92.56	30,344	6.80		
農業委員會	1	7,111	—	—	—	—	—	6,400	—	—	3,841	60.02		
衛生福利部	127	685,224	145,723	94,709	64.99	41,296	28.34	473,144	74,418	15.73	391,522	82.75		
環境保護署	7	52,188	14,433	13,279	92.01	—	—	28,403	28,403	100.00	—	—		
文化部	39	455,613	94,568	78,089	82.57	—	—	276,391	238,589	86.32	32,045	11.59		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 31 億 3,281 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 31 億 5,759 萬餘元不同，差異 2,477 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
 2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-15-2 嘉義縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	補助金額
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	764	19,256,095	3,132,818	3,032,999	96.81	45,154	1.44	7,736,668	5,648,039	73.00	2,040,662	26.38		
水環境建設	226	9,665,063	579,221	573,465	99.01	1,923	0.33	3,849,593	3,224,797	83.77	617,450	16.04		
數位建設	43	430,463	159,807	159,557	99.84	—	—	220,571	183,978	83.41	36,253	16.44		
城鄉建設	476	8,995,458	2,370,928	2,284,765	96.37	37,490	1.58	3,554,037	2,225,944	62.63	1,290,904	36.32		
因應少子化友善育兒空間建設	16	151,134	17,550	9,900	56.41	5,741	32.71	105,200	6,089	5.79	96,054	91.31		
食品安全建設	3	13,976	5,311	5,310	99.99	—	—	7,266	7,230	99.50	—	—		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 31 億 3,281 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 31 億 5,759 萬餘元不同，差異 2,477 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
 2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-16-1 嘉義市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	156	2,699,679	419,137	393,237	93.82	—	—	964,888	672,080	69.65	279,550	28.97
行政院（本院）	2	53,304	12,313	12,313	100.00	—	—	25,000	24,999	100.00	—	—
內政部	46	1,092,580	167,365	155,819	93.10	—	—	409,264	231,337	56.53	171,740	41.96
財政部	2	7,220	3,126	3,126	100.00	—	—	1,925	1,925	100.00	—	—
教育部	30	316,576	82,542	81,422	98.64	—	—	160,469	128,685	80.19	29,542	18.41
經濟部	14	349,021	43,354	39,962	92.18	—	—	53,696	45,805	85.30	7,890	14.70
交通部	2	8,600	2,612	2,612	100.00	—	—	5,737	5,737	100.00	—	—
衛生福利部	18	80,094	21,636	14,804	68.43	—	—	35,043	28,370	80.96	3,500	9.99
環境保護署	10	100,454	11,222	9,560	85.19	—	—	60,098	31,224	51.96	28,874	48.04
文化部	32	691,828	74,964	73,614	98.20	—	—	213,655	173,994	81.44	38,003	17.79

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 4 億 1,913 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 6 億 63 萬餘元不同，差異 1 億 8,149 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-16-2 嘉義市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	156	2,699,679	419,137	393,237	93.82	—	—	964,888	672,080	69.65	279,550	28.97
水環境建設	17	453,427	57,975	47,647	82.19	—	—	165,583	99,916	60.34	65,640	39.64
數位建設	27	230,493	69,470	68,774	99.00	—	—	110,426	107,702	97.53	392	0.35
城鄉建設	102	1,963,083	282,250	268,873	95.26	—	—	665,093	442,436	66.52	213,518	32.10
因應少子化友善育兒空間建設	7	28,328	4,600	3,100	67.39	—	—	9,150	7,388	80.75	—	—
食品安全建設	3	24,347	4,841	4,840	100.00	—	—	14,636	14,636	100.00	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 4 億 1,913 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 6 億 63 萬餘元不同，差異 1 億 8,149 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-17-1 屏東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	785	18,606,963	2,992,840	2,710,794	90.58	234,925	7.85	8,240,777	5,316,729	64.52	2,837,607	34.43
行政院（本院）	2	52,532	24,279	24,279	100.00	—	—	23,000	23,000	100.00	—	—
原住民族委員會	50	436,881	116,948	111,535	95.37	—	—	242,562	172,462	71.10	70,099	28.90
內政部	279	5,235,626	1,329,484	1,311,070	98.61	—	—	2,039,353	1,672,113	81.99	351,679	17.24
財政部	2	9,376	4,394	4,394	100.00	—	—	4,025	4,022	99.93	—	—
教育部	64	1,663,050	410,876	409,934	99.77	—	—	1,037,080	777,376	74.96	256,798	24.76
經濟部	165	3,290,649	231,559	183,462	79.23	31,874	13.77	1,528,012	921,752	60.32	601,915	39.39
交通部	32	4,203,687	206,224	206,224	100.00	—	—	1,141,701	721,011	63.15	420,690	36.85
農業委員會	3	308,687	13,266	13,266	100.00	—	—	156,213	129,743	83.06	8,740	5.59
衛生福利部	117	1,526,755	275,348	68,581	24.91	201,406	73.15	924,363	60,921	6.59	850,490	92.01
環境保護署	24	564,962	178,677	176,794	98.95	1,643	0.92	197,420	135,263	68.52	62,156	31.48
文化部	47	1,314,753	201,782	201,250	99.74	—	—	947,045	699,063	73.82	215,036	22.71

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 29 億 9,284 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 31 億 3,971 萬餘元不同，差異 1 億 4,687 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-17-2 屏東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	785	18,606,963	2,992,840	2,710,794	90.58	234,925	7.85	8,240,777	5,316,729	64.52	2,837,607	34.43
水環境建設	152	3,925,376	406,157	360,422	88.74	14,737	3.63	1,732,282	1,145,432	66.12	559,127	32.28
數位建設	40	565,416	209,404	209,384	99.99	—	—	292,071	275,976	94.49	14,738	5.05
城鄉建設	575	13,781,046	2,271,203	2,094,010	92.20	162,787	7.17	6,042,698	3,847,784	63.68	2,145,681	35.51
因應少子化友善育兒空間建設	15	309,165	95,885	36,985	38.57	57,400	59.86	160,554	34,381	21.41	118,060	73.53
食品安全建設	3	25,958	10,190	9,991	98.06	—	—	13,171	13,154	99.88	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 29 億 9,284 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 31 億 3,971 萬餘元不同，差異 1 億 4,687 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-18-1 花蓮縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	421	6,014,044	1,029,836	992,314	96.36	22,593	2.19	3,647,471	2,545,697	69.79	1,088,067	29.83
行政院（本院）	2	13,347	3,848	3,426	89.06	—	—	8,164	7,984	97.80	—	—
原住民族委員會	44	376,252	109,750	105,759	96.36	—	—	204,796	182,990	89.35	21,287	10.39
內政部	98	2,776,735	336,767	335,334	99.57	—	—	1,671,582	972,634	58.19	698,603	41.79
財政部	2	3,307	1,063	1,063	100.00	—	—	1,800	1,800	100.00	—	—
教育部	47	735,366	159,711	159,617	99.94	—	—	471,777	361,113	76.54	106,442	22.56
經濟部	81	826,753	65,494	62,202	94.97	—	—	539,870	408,230	75.62	131,566	24.37
交通部	17	681,695	242,944	242,944	100.00	—	—	337,074	337,074	100.00	—	—
衛生福利部	102	179,373	60,074	33,696	56.09	22,593	37.61	86,382	27,186	31.47	57,154	66.16
環境保護署	2	16,267	—	—	—	—	—	14,585	14,585	100.00	—	—
文化部	26	404,945	50,182	48,269	96.19	—	—	311,438	232,098	74.52	73,012	23.44

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 10 億 2,983 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 10 億 3,427 萬餘元不同，差異 443 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-18-2 花蓮縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	421	6,014,044	1,029,836	992,314	96.36	22,593	2.19	3,647,471	2,545,697	69.79	1,088,067	29.83
水環境建設	55	1,003,207	57,071	53,697	94.09	—	—	699,415	540,385	77.26	158,621	22.68
數位建設	38	362,937	132,055	131,177	99.33	—	—	181,602	178,715	98.41	686	0.38
城鄉建設	311	4,593,725	823,474	790,730	96.02	22,593	2.74	2,742,485	1,809,814	65.99	923,074	33.66
因應少子化友善育兒空間建設	14	39,799	11,566	11,110	96.07	—	—	16,700	9,515	56.98	5,685	34.04
食品安全建設	3	14,375	5,670	5,598	98.73	—	—	7,267	7,267	100.00	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 10 億 2,983 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 10 億 3,427 萬餘元不同，差異 443 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-19-1 臺東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數			補助金額	實現數		應付保留數		
				金額	%	金額	%			金額	%	金額	%	
合計	341	5,452,783	1,112,636	1,000,358	89.91	51,586	4.64		2,939,819	2,178,142	74.09	691,183	23.51	
行政院（本院）	2	72,601	17,437	16,657	95.53	—	—		47,905	21,127	44.10	26,096	54.48	
原住民族委員會	40	424,947	128,266	117,911	91.93	—	—		219,130	198,627	90.64	19,896	9.08	
內政部	88	1,939,206	323,060	304,775	94.34	—	—		1,079,360	712,959	66.05	364,983	33.81	
財政部	2	3,854	2,194	2,194	100.00	—	—		1,275	1,275	100.00	—	—	
教育部	47	596,520	133,211	115,802	86.93	17,409	13.07		372,661	237,001	63.60	126,364	33.91	
經濟部	44	776,478	59,025	33,651	57.01	—	—		338,142	250,372	74.04	43,974	13.00	
交通部	28	1,004,725	207,329	207,329	100.00	—	—		559,036	552,362	98.81	4,552	0.81	
農業委員會	2	10,555	—	—	—	—	—		8,346	6,045	72.44	1,264	15.15	
衛生福利部	47	211,207	89,349	50,392	56.40	34,177	38.25		109,851	23,826	21.69	82,086	74.72	
文化部	41	412,688	152,762	151,644	99.27	—	—		204,110	174,544	85.51	21,964	10.76	

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 11 億 1,263 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 11 億 1,632 萬餘元不同，差異 368 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
 2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-19-2 臺東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數			補助金額	實現數		應付保留數		
				金額	%	金額	%			金額	%	金額	%	
合計	341	5,452,783	1,112,636	1,000,358	89.91	51,586	4.64		2,939,819	2,178,142	74.09	691,183	23.51	
水環境建設	40	789,561	58,229	41,659	71.54	—	—		360,902	314,924	87.26	41,808	11.58	
數位建設	34	373,135	118,936	117,863	99.10	—	—		199,121	164,896	82.81	26,988	13.55	
城鄉建設	259	4,266,682	923,411	830,597	89.95	51,586	5.59		2,370,208	1,688,890	71.25	622,387	26.26	
因應少子化友善育兒空間建設	5	11,373	7,818	6,001	76.77	—	—		3,000	2,857	95.26	—	—	
食品安全建設	3	12,031	4,240	4,236	99.93	—	—		6,587	6,572	99.78	—	—	

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 11 億 1,263 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 11 億 1,632 萬餘元不同，差異 368 萬餘元，原因詳表 1 註 1。
 2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-20-1 澎湖縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	207	2,797,390	563,853	542,557	96.22	11,506	2.04	1,656,809	1,324,653	79.95	319,139	19.26
行政院（本院）	2	63,459	6,742	6,719	99.66	—	—	50,370	50,307	99.88	—	—
內政部	63	1,322,440	329,918	327,313	99.21	—	—	655,669	562,947	85.86	85,360	13.02
財政部	2	2,474	1,498	1,498	100.00	—	—	725	725	100.00	—	—
教育部	23	258,891	45,831	45,831	100.00	—	—	175,065	77,295	44.15	97,333	55.60
經濟部	31	216,673	36,227	35,495	97.98	—	—	143,645	88,691	61.74	54,072	37.64
交通部	13	530,600	58,748	58,748	100.00	—	—	372,544	372,544	100.00	—	—
衛生福利部	40	191,637	69,367	51,429	74.14	11,506	16.59	86,060	31,379	36.46	52,087	60.52
環境保護署	4	4,053	697	697	100.00	—	—	2,788	2,788	100.00	—	—
文化部	29	207,160	14,823	14,823	100.00	—	—	169,941	137,974	81.19	30,283	17.82

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 5 億 6,385 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 5 億 6,735 萬餘元不同，差異 350 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-20-2 澎湖縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	207	2,797,390	563,853	542,557	96.22	11,506	2.04	1,656,809	1,324,653	79.95	319,139	19.26
水環境建設	25	183,815	27,912	25,690	92.04	—	—	134,671	107,900	80.12	26,538	19.71
數位建設	29	193,916	52,534	51,840	98.68	—	—	119,612	118,444	99.02	652	0.55
城鄉建設	137	2,346,159	459,503	441,410	96.06	11,506	2.50	1,365,319	1,085,242	79.49	268,673	19.68
因應少子化友善育兒空間建設	13	59,442	17,984	17,705	98.45	—	—	30,475	6,360	20.87	23,275	76.37
食品安全建設	3	14,057	5,919	5,910	99.86	—	—	6,731	6,705	99.63	—	—

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 5 億 6,385 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 5 億 6,735 萬餘元不同，差異 350 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-21-1 金門縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	165	3,362,059	704,827	645,139	91.53	15,487	2.20	1,264,175	747,560	59.13	495,885	39.23
行政院（本院）	2	8,588	3,192	2,640	82.72	—	—	2,820	2,820	100.00	—	—
內政部	49	1,320,982	265,539	242,708	91.40	124	0.05	416,342	217,306	52.19	198,982	47.79
財政部	2	1,421	540	540	100.00	—	—	450	442	98.36	—	—
教育部	19	147,284	39,454	39,454	100.00	—	—	60,208	38,713	64.30	19,021	31.59
經濟部	45	945,806	196,754	191,748	97.46	—	—	352,274	222,242	63.09	120,680	34.26
交通部	5	43,477	2,190	2,190	100.00	—	—	29,565	29,565	100.00	—	—
農業委員會	7	303,317	52,772	52,772	100.00	—	—	177,665	155,017	87.25	22,525	12.68
衛生福利部	20	348,410	85,192	64,346	75.53	15,363	18.03	119,158	24,456	20.52	89,051	74.73
文化部	16	242,771	59,193	48,738	82.34	—	—	105,689	56,994	53.93	45,624	43.17

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 7 億 482 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 7 億 2,968 萬餘元不同，差異 2,485 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-21-2 金門縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算					第 2 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	165	3,362,059	704,827	645,139	91.53	15,487	2.20	1,264,175	747,560	59.13	495,885	39.23
水環境建設	53	969,904	235,259	230,252	97.87	—	—	405,848	370,784	91.36	34,516	8.50
數位建設	25	102,883	38,166	36,816	96.46	—	—	40,928	34,368	83.97	3,431	8.38
城鄉建設	76	2,112,070	361,256	322,871	89.37	2,839	0.79	780,410	321,507	41.20	446,562	57.22
因應少子化友善育兒空間建設	8	167,616	66,990	52,059	77.71	12,648	18.88	32,476	17,748	54.65	10,023	30.86
食品安全建設	3	9,585	3,156	3,141	99.53	—	—	4,512	3,151	69.84	1,352	29.96

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 7 億 482 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 7 億 2,968 萬餘元不同，差異 2,485 萬餘元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-22-1 連江縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	補助金額
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	135	3,609,705	790,273	680,013	86.05	105,599	13.36	1,910,338	1,223,624	64.05	665,448	34.83		
行政院（本院）	2	12,741	3,467	3,462	99.86	—	—	8,000	7,995	99.95	—	—		
內政部	41	1,192,592	353,927	353,145	99.78	—	—	515,600	334,389	64.85	166,166	32.23		
財政部	2	1,459	959	959	100.00	—	—	350	350	100.00	—	—		
教育部	19	627,299	191,769	86,169	44.93	105,599	55.07	281,339	23,656	8.41	257,300	91.46		
經濟部	32	1,074,045	78,687	78,010	99.14	—	—	633,884	433,445	68.38	198,660	31.34		
交通部	3	35,000	—	—	—	—	—	31,925	30,145	94.42	1,326	4.15		
衛生福利部	10	94,551	45,484	43,607	95.87	—	—	24,926	24,812	99.54	—	—		
環境保護署	1	8,736	—	—	—	—	—	7,441	7,041	94.63	399	5.37		
文化部	25	563,279	115,980	114,658	98.86	—	—	406,869	361,788	88.92	41,595	10.22		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 7 億 9,027 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 7 億 9,027 萬餘元不同，差異 3,000 元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-22-2 連江縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫經費執行情形明細表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	第 1 期特別預算						第 2 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	補助金額
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	135	3,609,705	790,273	680,013	86.05	105,599	13.36	1,910,338	1,223,624	64.05	665,448	34.83		
水環境建設	35	905,110	69,957	68,712	98.22	—	—	514,593	470,150	91.36	42,209	8.20		
數位建設	27	82,235	29,996	29,903	99.69	—	—	42,165	41,015	97.27	196	0.46		
城鄉建設	66	2,538,909	653,638	546,298	83.58	105,599	16.16	1,330,173	689,128	51.81	623,042	46.84		
因應少子化友善育兒空間建設	4	69,809	32,247	30,747	95.35	—	—	15,566	15,490	99.52	—	—		
食品安全建設	3	13,641	4,435	4,352	98.14	—	—	7,840	7,840	100.00	—	—		

註：1. 本表第 1 期特別預算補助金額 7 億 9,027 萬餘元與中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告所列金額 7 億 9,027 萬餘元不同，差異 3,000 元，原因詳表 1 註 1。

2. 受補助計畫總件數不含第 1 期及第 2 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

二、地方政府自籌經費預算編列及執行情形

依前瞻基礎建設特別條例第 3 條規定，中央執行機關負責各項具體執行之前瞻基礎建設計畫之研擬、預算編列及推動。地方執行機關負責就其執行之前瞻基礎建設計畫，依預算程序配合編列相關預算，經各該直轄市、縣（市）議會通過後動支。各地方政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫地方自籌經費預算已納入各該政府 106 至 109 年度預算編列者，分別為 298 億 2,545 萬餘元及 433 億 6,780 萬餘元，經議會同意墊付支應金額分別為 4 億 597 萬餘元及 34 億 630 萬餘元，其他（主要係以後年度補辦預算及公所等其他受補助單位自籌款等）分別為 11 億 7,717 萬餘元及 77 億 1,442 萬餘元，執行結果，第 1 期及第 2 期實際支用數各為 249 億 2,854 萬餘元及 345 億 9,541 萬餘元(表 4、表 5)。

表 4 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助地方政府計畫地方政府自籌經費預算編列及執行情形總表

單位：新臺幣千元

市縣別	地方政府自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	31,408,601	29,825,452	405,976	1,177,173	24,928,542
臺北市	1,328,488	1,296,015	—	32,473	1,207,567
新北市	9,393,724	9,293,147	73,997	26,580	8,962,764
桃園市	3,637,262	3,577,931	—	59,331	3,419,634
臺中市	3,049,926	2,872,334	—	177,592	2,458,376
臺南市	3,037,936	3,033,864	4,072	—	1,898,641
高雄市	2,189,790	1,904,620	77,627	207,543	1,544,150
基隆市	563,370	508,381	33,558	21,431	293,656
宜蘭縣	659,826	653,807	—	6,019	415,801
新竹縣	617,093	607,593	9,000	500	424,658
新竹市	906,046	650,529	73,523	181,994	370,509
苗栗縣	594,322	420,077	1,410	172,835	424,472
彰化縣	607,474	593,778	11,600	2,096	425,053
南投縣	439,351	402,895	—	36,456	261,697
雲林縣	837,579	789,402	8,622	39,555	639,092
嘉義縣	663,881	653,712	1,500	8,669	322,218
嘉義市	680,306	680,306	—	—	514,654
屏東縣	975,063	765,180	91,018	118,865	514,921
花蓮縣	194,508	188,739	—	5,769	167,386
臺東縣	256,566	164,006	16,781	75,779	203,594

表4 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算補助地方政府計畫地方政府自籌經費預算編列及執行情形總表（續）

單位：新臺幣千元

市縣別	地方政府自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入106至109年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
澎湖縣	122,981	119,295	—	3,686	89,941
金門縣	412,312	410,429	1,883	—	245,227
連江縣	240,797	239,412	1,385	—	124,531

註：1. 目前中央主管機關未完整控管受補助地方政府地方自籌經費預算編列及執行情形。

2. 本表其他主要係以後年度補辦預算及公所等其他受補助單位自籌款等。

3. 實際支用數係包含實現數、暫（預）付數、墊付款等。

4. 各市縣別明細詳表4-1-1至表4-22-2。

5. 資料來源：整理自各地方政府提供資料。

表5 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算補助地方政府計畫地方政府自籌經費預算編列及執行情形總表

單位：新臺幣千元

市縣別	地方政府自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入108至109年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	54,488,537	43,367,808	3,406,304	7,714,425	34,595,412
臺北市	2,734,872	2,612,593	—	122,279	2,207,713
新北市	16,843,452	10,556,154	1,076,144	5,211,154	15,025,508
桃園市	7,474,730	6,871,393	582,388	20,949	6,013,423
臺中市	5,293,339	5,093,533	—	199,806	1,955,190
臺南市	1,972,291	1,838,151	134,140	—	814,705
高雄市	3,624,386	3,006,944	507,321	110,121	2,066,366
基隆市	889,510	849,424	28,804	11,282	412,584
宜蘭縣	961,797	936,166	—	25,631	644,671
新竹縣	1,831,237	1,787,657	41,980	1,600	578,844
新竹市	1,634,815	1,385,525	195,881	53,409	696,395
苗栗縣	772,358	344,245	730	427,383	295,941
彰化縣	1,356,254	1,184,525	126,288	45,441	562,342
南投縣	401,121	346,829	1,279	53,013	204,425
雲林縣	1,968,895	1,465,701	38,296	464,898	1,006,684
嘉義縣	1,298,595	1,086,260	204	212,131	555,651
嘉義市	1,050,759	669,877	—	380,882	469,011
屏東縣	2,029,793	1,743,397	62,000	224,396	227,911
花蓮縣	519,453	489,254	3,125	27,074	250,159
臺東縣	369,181	236,882	50,971	81,328	286,322
澎湖縣	685,828	129,424	537,101	19,303	73,652
金門縣	297,299	271,632	3,322	22,345	131,409
連江縣	478,572	462,242	16,330	—	116,506

註：1. 目前中央主管機關未完整控管受補助地方政府地方自籌經費預算編列及執行情形。

2. 本表其他主要係以後年度補辦預算及公所等其他受補助單位自籌款等。

3. 實際支用數係包含實現數、暫（預）付數、墊付款等。

4. 各市縣別明細詳表5-1-1至表5-22-2。

5. 資料來源：整理自各地方政府提供資料。

茲將市縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算補助計畫地方政府自籌經費預算編列及執行情形分別列表如下：

(一) 臺北市府

表 4-1-1 臺北市府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	1,328,488	1,296,015	—	32,473	1,207,567
衛生福利部	710,682	710,682	—	—	634,797
教育部	228,527	228,527	—	—	218,711
文化部	189,888	165,905	—	23,983	167,866
內政部	110,687	102,197	—	8,490	104,125
行政院（本院）	61,593	61,593	—	—	55,020
財政部	19,959	19,959	—	—	19,951
經濟部	7,150	7,150	—	—	7,095

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應。
3. 資料來源：整理自臺北市府提供資料。

表 4-1-2 臺北市府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	1,328,488	1,296,015	—	32,473	1,207,567
城鄉建設	909,319	885,336	—	23,983	815,748
數位建設	341,703	333,213	—	8,490	320,713
因應少子化友善育兒空間建設	61,093	61,093	—	—	55,560
人才培育促進就業之建設	16,372	16,372	—	—	15,544

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應。
3. 資料來源：整理自臺北市府提供資料。

表 5-1-1 臺北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	地方自籌經費	自籌經費預算編列情形			實際支用數
		已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	2,734,872	2,612,593	—	122,279	2,207,713
交通部	1,338,372	1,338,372	—	—	1,152,080
衛生福利部	343,745	343,745	—	—	247,550
經濟部	275,100	275,100	—	—	193,793
教育部	252,984	252,984	—	—	233,866
文化部	240,867	118,588	—	122,279	180,165
內政部	202,048	202,048	—	—	118,514
行政院（本院）	70,004	70,004	—	—	69,990
財政部	11,751	11,751	—	—	11,751

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應。

3. 資料來源：整理自臺北市政府提供資料。

表 5-1-2 臺北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	2,734,872	2,612,593	—	122,279	2,207,713
城鄉建設	1,339,127	1,216,848	—	122,279	980,186
軌道建設	810,019	810,019	—	—	742,364
水環境建設	275,100	275,100	—	—	193,793
數位建設	242,499	242,499	—	—	241,898
因應少子化友善育兒空間建設	34,921	34,921	—	—	32,523
人才培育促進就業之建設	33,205	33,205	—	—	16,946

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應。

3. 資料來源：整理自臺北市政府提供資料。

（二）新北市政府

表 4-2-1 新北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	9,393,724	9,293,147	73,997	26,580	8,962,764
交通部	6,907,861	6,907,861	—	—	6,783,795
內政部	1,306,695	1,263,154	43,541	—	1,130,805
教育部	436,193	412,533	23,660	—	382,835

表 4-2-1 新北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）（續）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
經濟部	434,063	434,063	—	—	376,793
衛生福利部	132,986	132,986	—	—	130,366
文化部	105,876	72,500	6,796	26,580	100,976
行政院（本院）	27,661	27,661	—	—	27,651
原住民族委員會	20,540	20,540	—	—	10,196
財政部	9,226	9,226	—	—	9,403
環境保護署	8,120	8,120	—	—	3,298
農業委員會	4,500	4,500	—	—	6,640

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
 2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應。
 3. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。
 4. 資料來源：整理自新北市政府提供資料。

表 4-2-2 新北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	9,393,724	9,293,147	73,997	26,580	8,962,764
軌道建設	6,374,576	6,374,576	—	—	6,261,469
城鄉建設	2,173,117	2,107,468	39,069	26,580	1,909,986
水環境建設	540,102	540,102	—	—	497,584
數位建設	171,702	136,774	34,928	—	170,564
因應少子化友善育兒空間建設	111,800	111,800	—	—	111,531
人才培育促進就業建設	18,289	18,289	—	—	8,073
食品安全建設	4,135	4,135	—	—	3,553

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
 2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應。
 3. 資料來源：整理自新北市政府提供資料。

表 5-2-1 新北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	16,843,452	10,556,154	1,076,144	5,211,154	15,025,508
交通部	13,585,162	8,396,927	280,440	4,907,795	12,398,883
經濟部	957,361	880,946	75,629	786	1,073,900
內政部	799,166	268,837	313,052	217,277	441,605
文化部	528,863	447,963	42,321	38,579	434,974
教育部	465,418	389,400	63,540	12,478	272,409

表 5-2-1 新北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）（續）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
衛生福利部	246,508	34,122	207,981	4,405	226,642
環境保護署	126,112	3,100	93,179	29,833	24,846
行政院（本院）	81,053	81,053	—	—	81,022
農業委員會	37,327	37,327	—	—	58,352
原住民族委員會	9,209	9,209	—	—	5,591
財政部	7,267	7,267	—	—	7,279

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指以前年度保留數、納入受補助民間單位自行支應及區公所自籌等。

3. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

4. 資料來源：整理自新北市政府提供資料。

表 5-2-2 新北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	16,843,452	10,556,154	1,076,144	5,211,154	15,025,508
軌道建設	11,033,032	6,125,237	—	4,907,795	10,451,459
城鄉建設	4,565,970	3,823,317	699,669	42,984	3,897,250
水環境建設	737,183	360,879	128,408	247,896	217,243
因應少子化友善育兒空間建設	248,350	40,450	207,900	—	229,214
數位建設	231,960	191,794	40,166	—	204,826
人才培育促進就業建設	23,099	10,621	—	12,478	21,662
食品安全建設	3,853	3,853	—	—	3,851

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指以前年度保留數、納入受補助民間單位自行支應及區公所自籌等。

3. 資料來源：整理自新北市政府提供資料。

（三）桃園市政府

表 4-3-1 桃園市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	3,637,262	3,577,931	—	59,331	3,419,634
交通部	1,817,529	1,817,529	—	—	1,734,610
內政部	576,498	576,498	—	—	543,696
教育部	410,420	410,420	—	—	408,927
經濟部	306,804	247,483	—	59,321	279,652
文化部	141,310	141,310	—	—	105,716
客家委員會及所屬	139,937	139,937	—	—	110,791
環境保護署	107,116	107,116	—	—	102,657
衛生福利部	78,852	78,842	—	10	77,546

表 4-3-1 桃園市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）（續）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
農業委員會	35,550	35,550	—	—	35,550
行政院（本院）	17,207	17,207	—	—	14,521
財政部	5,128	5,128	—	—	5,126
原住民族委員會	909	909	—	—	837

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指由相關基金補辦預算支應。

3. 資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

表 4-3-2 桃園市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	3,637,262	3,577,931	—	59,331	3,419,634
城鄉建設	1,653,119	1,593,788	—	59,331	1,457,505
軌道建設	1,389,000	1,389,000	—	—	1,389,000
水環境建設	413,903	413,903	—	—	396,067
數位建設	108,980	108,980	—	—	105,826
因應少子化友善育兒空間建設	56,082	56,082	—	—	55,723
人才培育促進就業建設	13,386	13,386	—	—	12,970
食品安全建設	2,790	2,790	—	—	2,541

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指由相關基金補辦預算支應。

3. 資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

表 5-3-1 桃園市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	7,474,730	6,871,393	582,388	20,949	6,013,423
交通部	3,805,494	3,737,994	67,500	—	3,478,008
內政部	1,583,160	1,321,636	260,474	1,050	1,119,296
文化部	530,465	525,825	4,640	—	334,401
經濟部	478,399	234,813	223,628	19,898	418,963
教育部	392,823	370,593	22,230	—	304,039
衛生福利部	245,875	245,875	—	—	69,890
客家委員會及所屬	230,565	230,565	—	—	175,328
環境保護署	158,641	154,726	3,915	—	65,351
行政院（本院）	44,892	44,892	—	—	43,795
財政部	3,153	3,153	—	—	3,153
原住民族委員會	1,317	1,317	—	—	1,195

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指由 107 年度保留款或於 110 年度補辦預算支應。

3. 資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

表 5-3-2 桃園市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	7,474,730	6,871,393	582,388	20,949	6,013,423
城鄉建設	3,814,083	3,662,205	131,980	19,898	2,846,688
軌道建設	2,356,972	2,356,972	—	—	2,356,972
水環境建設	917,309	485,150	432,159	—	594,123
因應少子化友善育兒空間建設	226,517	226,517	—	—	58,360
數位建設	137,703	136,653	—	1,050	136,314
人才培育促進就業建設	18,249	—	18,249	—	17,513
食品安全建設	3,895	3,895	—	—	3,451

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
 2. 本表其他係指由 107 年度保留款或於 110 年度補辦預算支應。
 3. 資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

（四）臺中市政府

表 4-4-1 臺中市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	3,049,926	2,872,334	—	177,592	2,458,376
內政部	1,043,111	1,042,940	—	171	720,518
交通部	581,677	581,677	—	—	511,117
教育部	439,671	435,204	—	4,467	353,584
環境保護署	311,961	310,246	—	1,715	291,450
經濟部	290,055	118,817	—	171,238	267,173
文化部	259,076	259,076	—	—	235,624
衛生福利部	64,920	64,920	—	—	40,601
客家委員會及所屬	28,690	28,690	—	—	21,846
原住民族委員會	19,896	19,896	—	—	5,755
行政院（本院）	9,968	9,968	—	—	9,968
財政部	898	898	—	—	736

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
 2. 本表其他係指於以後年度補辦預算等。
 3. 資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

表 4-4-2 臺中市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	3,049,926	2,872,334	—	177,592	2,458,376
城鄉建設	2,308,474	2,136,504	—	171,970	1,802,449
水環境建設	473,723	472,008	—	1,715	443,010
數位建設	147,499	143,592	—	3,907	144,755
因應少子化友善育兒空間建設	91,329	91,329	—	—	52,151
軌道建設	15,340	15,340	—	—	3,333
人才培育促進就業建設	11,324	11,324	—	—	10,486
食品安全建設	2,235	2,235	—	—	2,189

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指於以後年度補辦預算等。

3. 資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

表 5-4-1 臺中市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	5,293,339	5,093,533	—	199,806	1,955,190
交通部	2,947,129	2,947,129	—	—	459,776
內政部	865,248	865,248	—	—	650,932
環境保護署	586,897	585,783	—	1,114	322,500
教育部	283,416	268,096	—	15,320	193,917
經濟部	252,273	94,747	—	157,526	98,169
文化部	158,923	158,923	—	—	123,775
衛生福利部	154,313	128,468	—	25,845	61,324
行政院（本院）	27,748	27,748	—	—	27,665
客家委員會及所屬	12,610	12,610	—	—	12,402
財政部	3,698	3,698	—	—	3,698
原住民族委員會	1,080	1,080	—	—	1,027

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係於以後年度補辦預算。

3. 資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

表 5-4-2 臺中市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	5,293,339	5,093,533	—	199,806	1,955,190
城鄉建設	3,990,208	3,818,357	—	171,851	1,074,707

表 5-4-2 臺中市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）（續）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
水環境建設	1,015,509	1,014,395	—	1,114	662,322
數位建設	163,518	155,798	—	7,720	161,567
因應少子化友善育兒空間建設	87,746	68,626	—	19,120	41,706
人才培育促進就業建設	28,851	28,851	—	—	13,673
軌道建設	5,566	5,566	—	—	—
食品安全建設	1,939	1,939	—	—	1,211

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係於以後年度補辦預算。
3. 資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

（五）臺南市政府

表 4-5-1 臺南市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	3,037,936	3,033,864	4,072	—	1,898,641
教育部	975,873	975,873	—	—	564,915
經濟部	629,389	629,389	—	—	285,927
內政部	582,984	582,984	—	—	394,783
文化部	410,771	406,699	4,072	—	261,728
交通部	291,006	291,006	—	—	269,744
衛生福利部	68,714	68,714	—	—	55,658
環境保護署	62,417	62,417	—	—	49,204
行政院（本院）	10,339	10,339	—	—	10,338
財政部	3,663	3,663	—	—	3,661
農業委員會	2,778	2,778	—	—	2,677

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 資料來源：整理自臺南市政府提供資料。

表 4-5-2 臺南市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	3,037,936	3,033,864	4,072	—	1,898,641
城鄉建設	1,873,470	1,869,398	4,072	—	1,083,503
水環境建設	803,381	803,381	—	—	473,695

表 4-5-2 臺南市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）（續）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
綠能建設	210,000	210,000	—	—	202,128
數位建設	80,702	80,702	—	—	80,469
因應少子化友善育兒空間建設	61,744	61,744	—	—	44,765
食品安全建設	5,638	5,638	—	—	5,579
軌道建設	3,000	3,000	—	—	8,500

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

3. 資料來源：整理自臺南市政府提供資料。

表 5-5-1 臺南市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	1,972,291	1,838,151	134,140	—	814,705
交通部	611,194	611,194	—	—	100,979
內政部	415,162	400,782	14,380	—	302,524
經濟部	301,701	296,195	5,506	—	130,326
文化部	291,354	268,488	22,866	—	96,814
教育部	200,585	130,725	69,860	—	99,116
衛生福利部	78,125	56,597	21,528	—	38,099
環境保護署	49,465	49,465	—	—	22,907
行政院（本院）	18,964	18,964	—	—	18,282
農業委員會	3,344	3,344	—	—	3,259
財政部	2,396	2,396	—	—	2,396

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 資料來源：整理自臺南市政府提供資料。

表 5-5-2 臺南市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	1,972,291	1,838,151	134,140	—	814,705
城鄉建設	1,447,130	1,313,688	133,442	—	512,289
水環境建設	349,487	349,487	—	—	155,840
數位建設	88,345	88,345	—	—	85,703
綠能建設	50,000	50,000	—	—	50,000
軌道建設	19,000	19,000	—	—	912
因應少子化友善育兒空間建設	15,685	14,987	698	—	7,315
食品安全建設	2,643	2,643	—	—	2,643

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 資料來源：整理自臺南市政府提供資料。

(六) 高雄市政府

表 4-6-1 高雄市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	2,189,790	1,904,620	77,627	207,543	1,544,150
交通部	505,418	500,668	—	4,750	149,366
內政部	485,185	452,258	32,927	—	330,019
經濟部	473,148	426,208	44,340	2,600	434,593
教育部	291,857	102,746	—	189,111	244,899
文化部	174,906	172,441	360	2,105	147,017
農業委員會	125,696	125,696	—	—	121,501
衛生福利部	69,786	69,786	—	—	59,322
環境保護署	32,207	30,972	—	1,235	26,682
行政院（本院）	10,623	10,623	—	—	10,621
原住民族委員會	8,499	8,499	—	—	7,668
科技部	7,741	—	—	7,741	7,741
財政部	4,719	4,719	—	—	4,716

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應及併決算辦理等。
3. 資料來源：整理自高雄市政府提供資料。

表 4-6-2 高雄市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	2,189,790	1,904,620	77,627	207,543	1,544,150
城鄉建設	1,257,030	1,103,840	77,627	75,563	852,682
軌道建設	348,750	344,000	—	4,750	87,348
水環境建設	340,240	339,005	—	1,235	368,416
數位建設	145,618	85,640	—	59,978	144,312
因應少子化友善育兒空間建設	80,908	25,303	—	55,605	74,362
人才培育促進就業建設	10,409	—	—	10,409	10,409
食品安全建設	6,829	6,829	—	—	6,616

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應及併決算辦理等。
3. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。
4. 資料來源：整理自高雄市政府提供資料。

表 5-6-1 高雄市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	3,624,386	3,006,944	507,321	110,121	2,066,366
經濟部	1,244,070	979,496	243,520	21,054	552,946
交通部	839,995	815,472	19,721	4,802	762,711
內政部	524,997	433,537	88,043	3,417	169,407
文化部	370,377	312,896	52,036	5,445	224,185
教育部	350,046	226,935	52,355	70,756	183,553
衛生福利部	98,387	73,937	24,450	—	60,802
農業委員會	60,852	60,852	—	—	39,432
環境保護署	59,824	53,723	4,180	1,921	7,879
行政院（本院）	41,462	18,447	23,015	—	41,461
科技部	17,584	14,860	—	2,724	15,793
原住民族委員會	13,347	13,347	—	—	4,754
財政部	3,439	3,439	—	—	3,439

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應及併決算辦理等。

3. 資料來源：整理自高雄市政府提供資料。

表 5-6-2 高雄市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	3,624,386	3,006,944	507,321	110,121	2,066,366
城鄉建設	1,739,914	1,551,205	158,030	30,679	885,600
水環境建設	1,087,505	741,750	323,700	22,055	437,464
軌道建設	435,838	435,838	—	—	416,760
數位建設	249,163	195,921	23,015	30,227	243,508
因應少子化友善育兒空間建設	81,706	79,130	2,576	—	52,776
人才培育促進就業建設	27,158	—	—	27,158	27,158
食品安全建設	3,098	3,098	—	—	3,098

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應及併決算辦理等。

3. 資料來源：整理自高雄市政府提供資料。

(七) 基隆市政府

表 4-7-1 基隆市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	563,370	508,381	33,558	21,431	293,656
文化部	315,099	300,609	—	14,490	143,145
教育部	121,336	98,669	22,667	—	61,916
內政部	69,882	58,991	10,891	—	51,591
經濟部	23,092	23,092	—	—	10,592
衛生福利部	13,528	6,587	—	6,941	12,988
行政院（本院）	10,027	10,027	—	—	10,024
環境保護署	9,314	9,314	—	—	2,308
財政部	1,089	1,089	—	—	1,088

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指由公益彩券盈餘分配基金、社會救助金、動支第二預備金、民間單位自行支應等。

3. 資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

表 4-7-2 基隆市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	563,370	508,381	33,558	21,431	293,656
城鄉建設	486,328	438,169	33,558	14,601	234,421
數位建設	37,596	37,596	—	—	37,058
水環境建設	19,113	19,113	—	—	9,736
因應少子化友善育兒空間建設	18,538	11,708	—	6,830	10,689
食品安全建設	1,793	1,793	—	—	1,750

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指由公益彩券盈餘分配基金、社會救助金、動支第二預備金、民間單位自行支應等。

3. 資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

表 5-7-1 基隆市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	889,510	849,424	28,804	11,282	412,584
內政部	278,907	273,907	—	5,000	64,010
交通部	194,566	194,566	—	—	183,812
教育部	129,507	112,197	17,310	—	52,565
環保署	95,098	95,098	—	—	16,574
經濟部	74,614	63,120	11,494	—	62,067

表 5-7-1 基隆市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）（續）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
文化部	53,669	49,669	—	4,000	10,901
行政院（本院）	25,851	25,851	—	—	14,280
衛生福利部	19,470	17,188	—	2,282	3,328
農業委員會	12,318	12,318	—	—	1,632
原住民族委員會	4,434	4,434	—	—	2,339
財政部	1,072	1,072	—	—	1,071

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指由公益彩券盈餘分配基金、社會救助金、動支第二預備金、民間單位自行支應等。

3. 資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

表 5-7-2 基隆市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	889,510	849,424	28,804	11,282	412,584
城鄉建設	692,861	655,548	27,957	9,356	347,032
水環境建設	125,441	124,594	847	—	27,533
數位建設	42,404	42,404	—	—	30,609
因應少子化友善育兒空間建設	27,870	25,944	—	1,926	6,488
食品安全建設	934	934	—	—	921

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指由公益彩券盈餘分配基金、社會救助金、動支第二預備金、民間單位自行支應等。

3. 資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

（八）宜蘭縣政府

表 4-8-1 宜蘭縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	659,826	653,807	—	6,019	415,801
內政部	231,183	231,183	—	—	143,683
教育部	126,191	125,607	—	584	110,461
原住民族委員會	82,990	82,990	—	—	15,945
文化部	72,438	67,003	—	5,435	44,961
交通部	55,366	55,366	—	—	33,349
經濟部	33,180	33,180	—	—	19,704
衛生福利部	32,555	32,555	—	—	24,023

表 4-8-1 宜蘭縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）（續）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
行政院（本院）	13,416	13,416	—	—	13,146
環境保護署	11,864	11,864	—	—	9,887
財政部	641	641	—	—	641

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指公所自籌款及納入受補助民間單位自行支應。
3. 資料來源：整理自宜蘭縣政府提供資料。

表 4-8-2 宜蘭縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	659,826	653,807	—	6,019	415,801
城鄉建設	571,084	565,649	—	5,435	344,043
水環境建設	41,072	41,072	—	—	25,697
數位建設	32,399	31,815	—	584	31,407
因應少子化友善育兒空間建設	12,913	12,913	—	—	12,346
食品安全建設	2,192	2,192	—	—	2,182
人才培育促進就業建設	165	165	—	—	123

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指公所自籌款及納入受補助民間單位自行支應。
3. 資料來源：整理自宜蘭縣政府提供資料。

表 5-8-1 宜蘭縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	961,797	936,166	—	25,631	644,671
內政部	258,681	248,685	—	9,996	164,068
交通部	187,677	187,677	—	—	130,613
教育部	128,871	125,599	—	3,272	106,565
文化部	120,443	108,081	—	12,362	89,838
經濟部	93,287	93,287	—	—	46,730
原住民族委員會	78,320	78,320	—	—	22,906
衛生福利部	43,586	43,586	—	—	37,381
行政院（本院）	38,800	38,800	—	—	38,772
環境保護署	11,746	11,746	—	—	7,413
財政部	382	382	—	—	382

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指公所自籌款及納入受補助民間單位自行支應。
3. 資料來源：整理自宜蘭縣政府提供資料。

表 5-8-2 宜蘭縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	961,797	936,166	—	25,631	644,671
城鄉建設	770,530	745,172	—	25,358	512,500
水環境建設	96,058	96,058	—	—	40,205
數位建設	61,942	61,670	—	272	61,596
因應少子化友善育兒空間建設	32,196	32,196	—	—	29,301
食品安全建設	1,065	1,065	—	—	1,064
人才培育促進就業建設	2	2	—	—	2

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指公所自籌款及納入受補助民間單位自行支應。

3. 資料來源：整理自宜蘭縣政府提供資料。

（九）新竹縣政府

表 4-9-1 新竹縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	617,093	607,593	9,000	500	424,658
內政部	240,818	240,818	—	—	208,992
經濟部	194,100	184,600	9,000	500	52,891
教育部	64,844	64,844	—	—	61,077
交通部	54,741	54,741	—	—	54,741
客家委員會及所屬	24,513	24,513	—	—	14,487
衛生福利部	10,748	10,748	—	—	10,178
環境保護署	10,524	10,524	—	—	5,662
文化部	8,617	8,617	—	—	8,666
行政院（本院）	5,251	5,251	—	—	5,286
財政部	2,184	2,184	—	—	2,173
原住民族委員會	750	750	—	—	501

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應。

3. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

4. 資料來源：整理自新竹縣政府提供資料。

表 4-9-2 新竹縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	617,093	607,593	9,000	500	424,658
城鄉建設	516,356	506,856	9,000	500	346,496
數位建設	36,925	36,925	—	—	36,416

表 4-9-2 新竹縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）（續）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
水環境建設	35,162	35,162	—	—	15,717
因應少子化友善育兒空間建設	27,951	27,951	—	—	25,329
食品安全建設	699	699	—	—	699

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應。
3. 資料來源：整理自新竹縣政府提供資料。

表 5-9-1 新竹縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	1,831,237	1,787,657	41,980	1,600	578,844
交通部	925,464	918,904	6,560	—	269,460
經濟部	322,411	314,971	7,440	—	63,594
內政部	269,682	269,682	—	—	111,491
衛生福利部	157,512	148,512	9,000	—	15,997
教育部	47,416	35,616	11,800	—	42,988
客家委員會及所屬	34,924	34,924	—	—	15,566
行政院（本院）	25,400	25,400	—	—	25,393
農業委員會	24,010	22,740	1,270	—	14,928
文化部	16,520	14,791	129	1,600	17,720
原住民族委員會	6,152	371	5,781	—	—
財政部	1,179	1,179	—	—	1,178
環境保護署	565	565	—	—	525

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應。
3. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。
4. 資料來源：整理自新竹縣政府提供資料。

表 5-9-2 新竹縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	1,831,237	1,787,657	41,980	1,600	578,844
城鄉建設	1,485,608	1,459,738	24,270	1,600	489,789
水環境建設	144,272	135,562	8,710	—	31,562
因應少子化友善育兒空間建設	141,873	132,873	9,000	—	2,607
數位建設	57,332	57,332	—	—	52,736
食品安全建設	2,150	2,150	—	—	2,149

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應。
3. 資料來源：整理自新竹縣政府提供資料。

(十) 新竹市政府

表 4-10-1 新竹市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	906,046	650,529	73,523	181,994	370,509
經濟部	264,132	153,457	60,675	50,000	93,172
內政部	253,723	252,523	1,200	—	106,801
教育部	222,763	89,824	4,435	128,504	24,919
文化部	58,856	57,570	1,286	—	28,325
衛生福利部	50,287	46,797	—	3,490	66,264
農業委員會	44,486	44,486	—	—	40,639
行政院（本院）	5,333	—	5,333	—	4,971
環境保護署	2,794	2,200	594	—	2,465
交通部	2,280	2,280	—	—	1,699
財政部	989	989	—	—	989
原住民族委員會	400	400	—	—	259

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應或民間捐款。
3. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。
4. 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

表 4-10-2 新竹市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	906,046	650,529	73,523	181,994	370,509
城鄉建設	729,705	485,940	61,771	181,994	221,975
水環境建設	136,552	130,133	6,419	—	114,898
數位建設	21,805	16,472	5,333	—	20,904
因應少子化友善育兒空間建設	15,027	15,027	—	—	10,456
軌道建設	2,280	2,280	—	—	1,699
食品安全建設	675	675	—	—	574

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應或民間捐款。
3. 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

表 5-10-1 新竹市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	1,634,815	1,385,525	195,881	53,409	696,395
交通部	660,391	660,391	—	—	224,239
經濟部	344,423	223,252	71,171	50,000	142,573
內政部	242,331	218,051	24,280	—	147,842

表 5-10-1 新竹市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）（續）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
文化部	174,502	110,802	63,700	—	72,646
教育部	108,656	107,671	985	—	38,582
衛生福利部	47,393	8,239	35,745	3,409	42,598
農業委員會	25,985	25,985	—	—	11,903
行政院（本院）	12,167	12,167	—	—	12,167
環境保護署	11,174	11,174	—	—	2,786
原住民族委員會	7,000	7,000	—	—	265
財政部	790	790	—	—	790

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
 2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應或民間捐款。
 3. 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

表 5-10-2 新竹市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	1,634,815	1,385,525	195,881	53,409	696,395
城鄉建設	1,317,167	1,139,907	123,851	53,409	528,278
水環境建設	254,653	188,095	66,558	—	125,146
數位建設	39,510	39,345	165	—	37,254
因應少子化友善育兒空間建設	12,995	7,689	5,306	—	2,337
軌道建設	8,800	8,800	—	—	1,699
食品安全建設	1,580	1,580	—	—	1,572
人才培育促進就業建設	106	106	—	—	106

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
 2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應或民間捐款。
 3. 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

（十一）苗栗縣政府

表 4-11-1 苗栗縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	594,322	420,077	1,410	172,835	424,472
內政部	180,483	106,524	1,410	72,549	131,328
經濟部	89,605	74,489	—	15,116	78,170
衛生福利部	75,912	15,271	—	60,641	40,604

表 4-11-1 苗栗縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）（續）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
教育部	72,550	72,050	—	500	46,739
環境保護署	71,983	71,983	—	—	49,118
交通部	42,456	42,456	—	—	36,876
客家委員會及所屬	35,634	14,856	—	20,778	19,456
文化部	12,078	9,463	—	2,615	10,579
農業委員會	9,700	9,700	—	—	9,172
行政院（本院）	3,000	3,000	—	—	1,603
原住民族委員會	635	—	—	635	613
財政部	282	282	—	—	206

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指納入公所或受補助民間單位自行支應。
3. 資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

表 4-11-2 苗栗縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	594,322	420,077	1,410	172,835	424,472
城鄉建設	396,593	233,168	1,090	162,335	284,372
水環境建設	151,643	141,143	—	10,500	117,718
數位建設	24,178	23,858	320	—	21,040
因應少子化友善育兒空間建設	20,965	20,965	—	—	401
食品安全建設	845	845	—	—	845
人才培育促進就業建設	96	96	—	—	94

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指納入公所或受補助民間單位自行支應。
3. 資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

表 5-11-1 苗栗縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	772,358	344,245	730	427,383	295,941
內政部	496,672	111,471	730	384,471	121,812
交通部	60,116	57,716	—	2,400	51,040
教育部	51,520	51,470	—	50	33,272
客家委員會及所屬	39,877	22,996	—	16,881	27,710
經濟部	31,952	16,114	—	15,838	26,928
環境保護署	29,756	29,756	—	—	9,872
文化部	29,703	27,712	—	1,991	12,656
衛生福利部	20,855	15,105	—	5,750	5,246

表 5-11-1 苗栗縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）（續）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
行政院（本院）	10,458	10,458	—	—	6,247
原住民族委員會	1,203	1,203	—	—	1,019
財政部	241	241	—	—	135

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指納入公所或受補助民間單位自行支應。
3. 資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

表 5-11-2 苗栗縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	772,358	344,245	730	427,383	295,941
城鄉建設	679,717	264,118	730	414,869	238,204
水環境建設	52,716	40,202	—	12,514	29,286
數位建設	35,001	35,001	—	—	26,942
因應少子化友善育兒空間建設	3,725	3,725	—	—	310
食品安全建設	883	883	—	—	882
人才培育促進就業建設	315	315	—	—	315

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指納入公所或受補助民間單位自行支應。
3. 資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

（十二）彰化縣政府

表 4-12-1 彰化縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	607,474	593,778	11,600	2,096	425,053
內政部	230,587	230,587	—	—	143,901
教育部	198,017	186,417	11,600	—	173,252
經濟部	82,519	82,519	—	—	35,011
衛生福利部	32,964	30,868	—	2,096	25,178
文化部	28,549	28,549	—	—	12,933
環境保護署	15,818	15,818	—	—	15,775
交通部	14,888	14,888	—	—	14,888
農業委員會	2,340	2,340	—	—	2,340
財政部	1,529	1,529	—	—	1,525
行政院（本院）	260	260	—	—	246

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指公所自籌款。
3. 資料來源：整理自彰化縣政府提供資料。

表 4-12-2 彰化縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	607,474	593,778	11,600	2,096	425,053
城鄉建設	500,690	486,994	11,600	2,096	321,410
水環境建設	48,988	48,988	—	—	46,069
數位建設	42,319	42,319	—	—	42,096
因應少子化友善育兒空間建設	14,810	14,810	—	—	14,810
食品安全建設	666	666	—	—	666

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指公所自籌款。

3. 資料來源：整理自彰化縣政府提供資料。

表 5-12-1 彰化縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	1,356,254	1,184,525	126,288	45,441	562,342
內政部	403,481	389,306	14,175	—	169,192
經濟部	390,485	315,310	70,531	4,644	184,034
交通部	227,562	218,518	9,044	—	57,544
衛生福利部	163,315	116,900	13,038	33,377	35,807
教育部	78,767	55,741	15,606	7,420	50,225
文化部	46,452	43,819	2,633	—	23,621
農業委員會	15,670	15,670	—	—	14,069
行政院（本院）	14,949	14,949	—	—	14,645
環境保護署	14,500	13,240	1,260	—	12,176
財政部	1,068	1,068	—	—	1,025

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指公所自籌款。

3. 資料來源：整理自彰化縣政府提供資料。

表 5-12-2 彰化縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	1,356,254	1,184,525	126,288	45,441	562,342
城鄉建設	926,792	788,848	97,147	40,797	311,663
水環境建設	343,032	313,171	25,217	4,644	192,658
數位建設	60,175	56,475	3,700	—	54,788
因應少子化友善育兒空間建設	23,023	22,800	223	—	2,567
食品安全建設	3,230	3,230	—	—	665

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指公所自籌款。

3. 資料來源：整理自彰化縣政府提供資料。

(十三) 南投縣政府

表 4-13-1 南投縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	439,351	402,895	—	36,456	261,697
經濟部	153,125	152,788	—	337	10,454
內政部	123,718	123,718	—	—	113,015
交通部	59,625	59,625	—	—	56,492
教育部	52,439	31,232	—	21,207	41,436
衛生福利部	34,722	19,812	—	14,910	25,074
文化部	9,454	9,454	—	—	9,364
行政院（本院）	2,700	2,700	—	—	2,700
原住民族委員會	1,962	1,962	—	—	1,962
環境保護署	900	900	—	—	496
財政部	702	702	—	—	699

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指公所或基金配合款。

3. 資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

表 4-13-2 南投縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	439,351	402,895	—	36,456	261,697
城鄉建設	375,883	350,510	—	25,373	219,811
水環境建設	26,873	26,873	—	—	10,864
因應少子化友善育兒空間建設	18,016	18,016	—	—	12,870
數位建設	17,273	6,190	—	11,083	16,844
食品安全建設	1,305	1,305	—	—	1,305

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指公所或基金配合款。

3. 資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

表 5-13-1 南投縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	401,121	346,829	1,279	53,013	204,425
內政部	154,609	154,609	—	—	39,034
交通部	61,798	61,798	—	—	61,798
教育部	60,052	24,620	1,279	34,153	30,211
衛生福利部	57,102	42,436	—	14,666	20,411
文化部	27,282	27,282	—	—	16,861
經濟部	16,704	12,659	—	4,045	12,609
環境保護署	11,432	11,432	—	—	11,360

表 5-13-1 南投縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）（續）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
行政院（本院）	7,420	7,420	—	—	7,420
原住民族委員會	4,286	4,286	—	—	4,286
財政部	431	284	—	147	431

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指公所或基金配合款。

3. 資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

表 5-13-2 南投縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	401,121	346,829	1,279	53,013	204,425
城鄉建設	297,970	268,455	152	29,363	141,164
水環境建設	60,096	60,096	—	—	26,228
數位建設	35,303	10,527	1,126	23,650	35,481
因應少子化友善育兒空間建設	3,885	3,885	—	—	485
食品安全建設	3,865	3,865	—	—	1,065

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指公所或基金配合款。

3. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

4. 資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

（十四） 雲林縣政府

表 4-14-1 雲林縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	837,579	789,402	8,622	39,555	639,092
內政部	346,516	316,764	—	29,752	277,627
文化部	111,940	111,940	—	—	44,063
經濟部	92,195	92,195	—	—	98,829
環境保護署	89,801	89,801	—	—	56,771
交通部	82,853	82,853	—	—	68,388
衛生福利部	73,805	73,805	—	—	58,164
教育部	36,389	17,964	8,622	9,803	31,198
行政院（本院）	2,693	2,693	—	—	2,665
財政部	1,385	1,385	—	—	1,384

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指公所等其他受補助單位自籌款。

3. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

4. 資料來源：整理自雲林縣政府提供資料。

表 4-14-2 雲林縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	837,579	789,402	8,622	39,555	639,092
城鄉建設	588,590	540,413	8,622	39,555	421,389
水環境建設	163,075	163,075	—	—	138,147
因應少子化友善育兒空間建設	51,332	51,332	—	—	45,290
數位建設	33,711	33,711	—	—	33,394
食品安全建設	870	870	—	—	870

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指公所等其他受補助單位自籌款。
3. 資料來源：整理自雲林縣政府提供資料。

表 5-14-1 雲林縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	1,968,895	1,465,701	38,296	464,898	1,006,684
內政部	941,318	475,835	25,527	439,956	328,529
交通部	285,626	285,626	—	—	241,113
環境保護署	250,930	245,966	—	4,964	103,197
經濟部	195,049	178,779	580	15,690	195,384
衛生福利部	129,862	127,792	423	1,647	58,123
文化部	105,511	105,511	—	—	47,743
教育部	49,721	35,317	11,765	2,639	21,941
行政院（本院）	9,985	9,985	—	—	9,764
財政部	887	887	—	—	887

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指公所等其他受補助單位自籌款。
3. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。
4. 資料來源：整理自雲林縣政府提供資料。

表 5-14-2 雲林縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	1,968,895	1,465,701	38,296	464,898	1,006,684
城鄉建設	1,429,005	934,337	37,307	457,361	628,043
水環境建設	419,822	412,965	580	6,277	299,422
因應少子化友善育兒空間建設	74,073	74,073	—	—	47,213
數位建設	44,259	42,591	409	1,259	30,701
食品安全建設	1,735	1,735	—	—	1,304

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指公所等其他受補助單位自籌款。
3. 資料來源：整理自雲林縣政府提供資料。

(十五) 嘉義縣政府

表 4-15-1 嘉義縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	663,881	653,712	1,500	8,669	322,218
內政部	295,841	295,841	—	—	207,472
經濟部	196,931	196,931	—	—	13,384
交通部	63,949	63,949	—	—	30,005
文化部	44,751	34,582	1,500	8,669	33,457
教育部	44,145	44,145	—	—	26,254
衛生福利部	13,402	13,402	—	—	7,809
行政院（本院）	2,519	2,519	—	—	2,500
環境保護署	2,058	2,058	—	—	1,042
財政部	282	282	—	—	291

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應。
3. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。
4. 資料來源：整理自雲林縣政府提供資料。

表 4-15-2 嘉義縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	663,881	653,712	1,500	8,669	322,218
城鄉建設	509,298	499,129	1,500	8,669	283,996
水環境建設	124,031	124,031	—	—	12,567
數位建設	19,400	19,400	—	—	19,186
因應少子化友善育兒空間建設	9,581	9,581	—	—	5,876
食品安全建設	1,570	1,570	—	—	591

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應。
3. 資料來源：整理自嘉義縣政府提供資料。

表 5-15-1 嘉義縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	1,298,595	1,086,260	204	212,131	555,651
內政部	528,567	387,255	204	141,108	108,478
經濟部	519,482	484,284	—	35,198	349,047
交通部	150,648	129,648	—	21,000	46,927
教育部	42,075	42,075	—	—	13,254
文化部	34,196	19,372	—	14,824	26,996

表 5-15-1 嘉義縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）（續）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
衛生福利部	16,630	16,630	—	—	4,564
環境保護署	3,161	3,161	—	—	3,155
行政院（本院）	2,833	2,833	—	—	2,831
農業委員會	711	711	—	—	—
財政部	288	288	—	—	394

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
 2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應及公所自籌款。
 3. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。
 4. 資料來源：整理自嘉義縣政府提供資料。

表 5-15-2 嘉義縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	1,298,595	1,086,260	204	212,131	555,651
城鄉建設	914,453	737,521	—	176,932	286,602
水環境建設	348,056	312,654	204	35,198	250,916
數位建設	23,768	23,768	—	—	14,187
因應少子化友善育兒空間建設	11,508	11,508	—	—	3,141
食品安全建設	808	808	—	—	804

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
 2. 本表其他係指納入受補助民間單位自行支應及公所自籌款。
 3. 資料來源：整理自嘉義縣政府提供資料。

（十六）嘉義市政府

表 4-16-1 嘉義市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	680,306	680,306	—	—	514,654
文化部	336,746	336,746	—	—	265,224
內政部	233,973	233,973	—	—	163,939
教育部	51,728	51,728	—	—	43,432
經濟部	34,365	34,365	—	—	21,281
衛生福利部	12,811	12,811	—	—	11,412
行政院（本院）	5,277	5,277	—	—	5,277
環境保護署	4,062	4,062	—	—	2,746
財政部	1,342	1,342	—	—	1,340

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
 2. 資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

表 4-16-2 嘉義市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	680,306	680,306	—	—	514,654
城鄉建設	620,986	620,986	—	—	461,737
數位建設	24,798	24,798	—	—	21,485
水環境建設	23,864	23,864	—	—	21,229
因應少子化友善育兒空間建設	9,446	9,446	—	—	8,989
食品安全建設	1,211	1,211	—	—	1,211

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

表 5-16-1 嘉義市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	1,050,759	669,877	—	380,882	469,011
交通部	377,297	—	—	377,297	15,428
文化部	363,681	360,888	—	2,793	273,892
內政部	177,066	176,526	—	540	92,307
教育部	55,112	54,860	—	252	43,341
經濟部	24,958	24,958	—	—	19,870
衛生福利部	24,675	24,675	—	—	14,526
環境保護署	16,429	16,429	—	—	7,746
行政院（本院）	10,714	10,714	—	—	1,071
財政部	826	826	—	—	826

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係部分地方自籌款編列於交通作業基金及民間單位出資。

3. 資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

表 5-16-2 嘉義市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	1,050,759	669,877	—	380,882	469,011
城鄉建設	944,296	564,809	—	379,487	407,302
水環境建設	58,698	58,698	—	—	30,047
數位建設	31,256	29,861	—	1,395	18,218
因應少子化友善育兒空間建設	12,849	12,849	—	—	9,782
食品安全建設	3,659	3,659	—	—	3,658

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係部分地方自籌款編列於交通作業基金及民間單位出資。

3. 資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

(十七) 屏東縣政府

表 4-17-1 屏東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	975,063	765,180	91,018	118,865	514,921
交通部	197,268	115,636	81,632	—	39,537
內政部	193,396	190,717	2,475	204	141,088
衛生福利部	193,132	76,181	—	116,951	92,725
經濟部	132,279	129,446	2,833	—	33,519
文化部	108,547	107,756	179	612	88,229
教育部	93,487	89,589	3,898	—	81,590
環境保護署	42,831	41,733	—	1,098	31,436
原住民族委員會	7,135	7,135	—	—	2,131
農業委員會	3,795	3,795	—	—	1,474
行政院（本院）	2,698	2,698	—	—	2,698
財政部	491	491	—	—	489

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指公所自籌款或納入 110 年度預算等。
3. 資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

表 4-17-2 屏東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	975,063	765,180	91,018	118,865	514,921
城鄉建設	686,802	516,067	83,949	86,786	400,783
水環境建設	173,285	169,354	2,833	1,098	59,725
因應少子化友善育兒空間建設	81,801	50,821	—	30,980	22,720
數位建設	32,039	27,804	4,235	—	30,579
食品安全建設	1,133	1,133	—	—	1,110

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指公所自籌款或納入 110 年度預算等。
3. 資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

表 5-17-1 屏東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	2,029,793	1,743,397	62,000	224,396	227,911
交通部	1,448,837	1,448,837	—	—	53,456
內政部	227,141	35,338	—	191,803	53,586
衛生福利部	174,633	145,262	—	29,371	21,215
教育部	79,758	42,758	37,000	—	38,267

表 5-17-1 屏東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）（續）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
文化部	43,723	43,111	—	612	13,944
經濟部	39,307	14,307	25,000	—	35,692
環境保護署	9,545	8,592	—	953	5,132
原住民族委員會	3,842	2,186	—	1,656	3,614
行政院（本院）	2,555	2,555	—	—	2,555
財政部	447	447	—	—	447

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指公所自籌款或納入 110 年度預算等。
3. 資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

表 5-17-2 屏東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	2,029,793	1,743,397	62,000	224,396	227,911
城鄉建設	1,880,499	1,633,086	37,000	210,413	137,380
因應少子化友善育兒空間建設	51,978	38,948	—	13,030	6,221
水環境建設	49,009	23,056	25,000	953	40,899
數位建設	46,842	46,842	—	—	41,948
食品安全建設	1,464	1,464	—	—	1,462

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指公所自籌款或納入 110 年度預算等。
3. 資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

（十八）花蓮縣政府

表 4-18-1 花蓮縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	194,508	188,739	—	5,769	167,386
內政部	66,038	65,021	—	1,017	51,112
交通部	61,176	61,176	—	—	58,109
教育部	28,265	28,265	—	—	28,114
經濟部	21,672	16,921	—	4,751	14,393
原住民族委員會	8,156	8,156	—	—	7,482
文化部	5,236	5,236	—	—	4,179
衛生福利部	3,417	3,417	—	—	3,495
行政院（本院）	428	428	—	—	380
財政部	118	118	—	—	118

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指該府另行自籌之其他配合經費。
3. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。
4. 資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。

表 4-18-2 花蓮縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	194,508	188,739	—	5,769	167,386
城鄉建設	154,859	153,842	—	1,017	134,260
水環境建設	19,631	14,880	—	4,751	12,704
數位建設	18,436	18,436	—	—	18,863
因應少子化友善育兒空間建設	950	950	—	—	936
食品安全建設	630	630	—	—	622

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
 2. 本表其他係指該府另行自籌之其他配合經費。
 3. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。
 4. 資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。

表 5-18-1 花蓮縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	519,453	489,254	3,125	27,074	250,159
內政部	295,623	279,454	3,125	13,044	99,302
經濟部	94,893	80,865	—	14,028	68,714
教育部	51,268	51,268	—	—	25,836
文化部	36,318	36,317	—	1	20,493
交通部	19,127	19,127	—	—	17,330
衛生福利部	10,093	10,093	—	—	8,540
原住民族委員會	9,368	9,368	—	—	7,225
環境保護署	1,627	1,627	—	—	1,621
行政院（本院）	907	907	—	—	887
財政部	226	226	—	—	207

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
 2. 本表其他係指編列於 110 年度之預算及該府另行自籌之其他配合經費。
 3. 資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。

表 5-18-2 花蓮縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	519,453	489,254	3,125	27,074	250,159
城鄉建設	380,653	366,859	3,125	10,669	141,868
水環境建設	108,883	92,478	—	16,405	79,735
數位建設	24,931	24,931	—	—	24,537
因應少子化友善育兒空間建設	4,176	4,176	—	—	3,208
食品安全建設	808	808	—	—	808

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
 2. 本表其他係指編列於 110 年度之預算及該府另行自籌之其他配合經費。
 3. 資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。

(十九) 臺東縣政府

表 4-19-1 臺東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	256,566	164,006	16,781	75,779	203,594
內政部	107,748	62,033	1,256	44,459	75,450
交通部	66,183	39,684	—	26,499	66,256
文化部	30,575	28,890	1,244	441	26,178
經濟部	22,165	11,015	11,150	—	6,785
教育部	16,171	11,061	3,130	1,980	15,980
原住民族委員會	6,504	4,104	—	2,400	6,350
衛生福利部	5,038	5,038	—	—	4,498
行政院（本院）	1,937	1,937	—	—	1,850
財政部	243	243	—	—	243

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指公所自籌、或由受委託民間單位自籌。
3. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。
4. 資料來源：整理自臺東縣政府提供資料。

表 4-19-2 臺東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	256,566	164,006	16,781	75,779	203,594
城鄉建設	225,495	132,935	16,781	75,779	181,032
數位建設	19,172	19,172	—	—	18,659
水環境建設	11,015	11,015	—	—	3,147
食品安全建設	472	472	—	—	472
因應少子化友善育兒空間建設	412	412	—	—	282

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指公所自籌、或由受委託民間單位自籌。
3. 資料來源：整理自臺東縣政府提供資料。

表 5-19-1 臺東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	369,181	236,882	50,971	81,328	286,322
內政部	138,381	85,720	—	52,661	103,888
經濟部	113,919	64,459	49,460	—	95,290
交通部	39,723	16,000	—	23,723	34,798
文化部	36,250	33,259	1,200	1,791	29,484

表 5-19-1 臺東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）（續）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
教育部	24,455	24,455	—	—	14,357
衛生福利部	9,931	6,468	311	3,152	2,442
行政院（本院）	5,322	5,322	—	—	5,247
農業委員會	1,055	1,055	—	—	671
財政部	141	141	—	—	141

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指公所自籌、或由受委託民間單位自籌。
3. 資料來源：整理自臺東縣政府提供資料。

表 5-19-2 臺東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	369,181	236,882	50,971	81,328	286,322
城鄉建設	234,370	145,410	7,632	81,328	172,028
水環境建設	113,409	70,070	43,339	—	96,717
數位建設	20,512	20,512	—	—	16,696
食品安全建設	732	732	—	—	730
因應少子化友善育兒空間建設	157	157	—	—	150

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指公所自籌、或由受委託民間單位自籌。
3. 資料來源：整理自臺東縣政府提供資料。

（二十）澎湖縣政府

表 4-20-1 澎湖縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意 墊付支應金額	其他	
合計	122,981	119,295	—	3,686	89,941
內政部	52,151	50,741	—	1,410	42,998
交通部	41,400	41,400	—	—	29,793
經濟部	12,043	12,043	—	—	2,642
教育部	6,138	3,862	—	2,276	4,327
衛生福利部	5,567	5,567	—	—	4,837
文化部	4,674	4,674	—	—	4,350
行政院（本院）	750	750	—	—	746
財政部	166	166	—	—	166
環境保護署	90	90	—	—	78

- 註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。
2. 本表其他係指公所自籌款，或基金依據預算法第 88 條第 1 項報經核准後先行辦理（超支併決算）。
3. 資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

表 4-20-2 澎湖縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	122,981	119,295	—	3,686	89,941
城鄉建設	109,550	106,340	—	3,210	79,425
數位建設	6,079	5,603	—	476	6,000
水環境建設	5,224	5,224	—	—	2,620
因應少子化友善育兒空間建設	1,467	1,467	—	—	1,236
食品安全建設	659	659	—	—	659

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指公所自籌款，或基金依據預算法第 88 條第 1 項報經核准後先行辦理（超支併決算）。

3. 資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

表 5-20-1 澎湖縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	685,828	129,424	537,101	19,303	73,652
交通部	544,392	16,224	528,168	—	16,179
內政部	51,770	36,923	—	14,847	29,803
教育部	37,530	25,021	8,530	3,979	9,867
衛生福利部	22,539	22,136	403	—	2,629
經濟部	13,684	13,684	—	—	4,427
文化部	8,920	8,911	—	9	3,582
行政院（本院）	6,820	6,353	—	467	7,032
環境保護署	90	90	—	—	90
財政部	80	80	—	—	41

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指公所自籌款，或基金依據預算法第 88 條第 1 項報經核准後先行辦理（超支併決算）。

3. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

4. 資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

表 5-20-2 澎湖縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	685,828	129,424	537,101	19,303	73,652
城鄉建設	647,564	91,707	537,101	18,756	55,463
因應少子化友善育兒空間建設	19,828	19,828	—	—	357
數位建設	14,146	13,600	—	546	14,237
水環境建設	3,540	3,540	—	—	2,876
食品安全建設	748	748	—	—	717

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指公所自籌款，或基金依據預算法第 88 條第 1 項報經核准後先行辦理（超支併決算）。

3. 實際支用數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

4. 資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

(二十一) 金門縣政府

表 4-21-1 金門縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	412,312	410,429	1,883	—	245,227
內政部	179,936	179,936	—	—	103,021
經濟部	98,870	98,352	518	—	56,328
衛生福利部	68,246	68,246	—	—	27,826
文化部	39,387	39,387	—	—	37,715
農業委員會	17,095	15,730	1,365	—	15,414
教育部	7,176	7,176	—	—	3,556
行政院（本院）	1,368	1,368	—	—	1,135
財政部	234	234	—	—	232

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 資料來源：整理自金門縣政府提供資料。

表 4-21-2 金門縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	412,312	410,429	1,883	—	245,227
城鄉建設	215,442	215,442	—	—	141,551
水環境建設	115,964	114,081	1,883	—	65,127
因應少子化友善育兒空間建設	65,054	65,054	—	—	24,271
數位建設	15,063	15,063	—	—	14,278
食品安全建設	789	789	—	—	—

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 資料來源：整理自金門縣政府提供資料。

表 5-21-1 金門縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	297,299	271,632	3,322	22,345	131,409
內政部	90,743	68,398	—	22,345	15,009
文化部	54,333	54,333	—	—	18,306
農業委員會	52,900	50,656	2,244	—	34,432
衛生福利部	46,406	46,406	—	—	15,652
經濟部	26,269	25,951	318	—	24,599
教育部	13,235	12,615	620	—	11,288
交通部	10,724	10,724	—	—	10,724
行政院（本院）	2,494	2,494	—	—	1,209
財政部	195	55	140	—	190

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指編列於 110 年度預算。

3. 資料來源：整理自金門縣政府提供資料。

表 5-21-2 金門縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	297,299	271,632	3,322	22,345	131,409
城鄉建設	176,014	153,049	620	22,345	65,432
水環境建設	79,169	76,607	2,562	—	59,031
因應少子化友善育兒空間建設	30,777	30,777	—	—	—
數位建設	10,211	10,071	140	—	6,158
食品安全建設	1,128	1,128	—	—	788

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 本表其他係指編列於 110 年度預算。

3. 資料來源：整理自金門縣政府提供資料。

（二十二）連江縣政府

表 4-22-1 連江縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	240,797	239,412	1,385	—	124,531
內政部	65,167	65,167	—	—	54,351
經濟部	51,966	51,966	—	—	2,871
教育部	50,502	50,502	—	—	15,377
衛生福利部	43,614	43,614	—	—	40,633
文化部	29,056	27,671	1,385	—	10,807
行政院（本院）	385	385	—	—	385
財政部	107	107	—	—	107

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 資料來源：整理自連江縣政府提供資料。

表 4-22-2 連江縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 106 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	240,797	239,412	1,385	—	124,531
城鄉建設	184,911	184,911	—	—	77,425
因應少子化友善育兒空間建設	42,520	42,520	—	—	39,529
數位建設	10,250	8,865	1,385	—	4,461
水環境建設	2,622	2,622	—	—	2,622
食品安全建設	494	494	—	—	494

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 資料來源：整理自連江縣政府提供資料。

表 5-22-1 連江縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	478,572	462,242	16,330	—	116,506
文化部	269,003	264,840	4,163	—	17,546
經濟部	65,166	65,166	—	—	16,066
內政部	60,061	60,061	—	—	45,437
教育部	51,771	51,771	—	—	23,726
衛生福利部	15,576	15,576	—	—	9,446
交通部	15,190	3,023	12,167	—	2,530
行政院（本院）	889	889	—	—	888
環境保護署	875	875	—	—	827
財政部	40	40	—	—	40

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 資料來源：整理自連江縣政府提供資料。

表 5-22-2 連江縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	自籌經費預算編列情形				實際支用數
	合計	已納入 108 至 109 年度預算金額	經議會同意墊付支應金額	其他	
合計	478,572	462,242	16,330	—	116,506
城鄉建設	438,244	423,299	14,945	—	83,662
水環境建設	19,720	19,720	—	—	18,489
因應少子化友善育兒空間建設	14,535	14,535	—	—	8,456
數位建設	5,201	3,816	1,385	—	5,078
食品安全建設	872	872	—	—	821

註：1. 本表依自籌經費預算編列金額由高至低排序。

2. 資料來源：整理自連江縣政府提供資料。

肆、國家發展委員會前瞻基礎建設計畫 109 年度總績效檢討報告 第 2 期特別預算執行情形摘要

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算，截至 109 年底（108 年 1 月至 109 年 12 月）止，特別預算累積分配數 2,229.541 億元，執行數 2,043.366 億元，計畫經費達成率為 91.65%。依主管機關別計畫經費達成率自高至低排序，依序為行政院資通安全處及中央研究院均為 100%、科技部 99.35%、客家委員會 99.24%、行政院農業委員會 98.98%、行政院環境保護署 98.88%、原住民族委員會 96.73%、

經濟部 94.99%、國家發展委員會 94.37%、國家通訊傳播委員會 93.07%，其餘部會之計畫經費達成率均低於平均值 91.65%（表 1）。依建設類別計畫經費達成率自高至低排序，依序為「人才培育促進就業建設」98.90%、「數位建設」98.65%、「水環境建設」98.05%、「綠能建設」91.17%、「食品安全建設」88.26%、「軌道建設」86.86%、「因應少子化友善育兒空間建設」86.78%、「城鄉建設」85.87%（表 2）。

表 1 前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算執行情形統計表（依主管機關）
（108 年 1 月至 109 年 12 月）

單位：億元、%

項次	主管機關	計畫項數	第 2 期預算數 (108-109 年)	截至 109 年 12 月 分配數 (A)	執行數 (B)	計畫經費 達成率(%) (B/A)
1	交通部	38	562.805	562.805	507.939	90.25
2	經濟部	27	578.016	578.016	549.054	94.99
3	科技部	12	165.145	165.145	164.069	99.35
4	教育部	7	183.601	183.601	164.720	89.72
5	內政部	4	317.330	317.330	283.876	89.46
6	文化部	4	156.306	156.306	141.660	90.63
7	衛生福利部	4	71.263	71.263	40.768	57.21
8	行政院資通安全處	2	20.206	20.206	20.206	100.00
9	國家通訊傳播委員會	2	10.352	10.352	9.634	93.07
10	國家發展委員會	1	23.819	23.819	22.477	94.37
11	行政院農業委員會	1	70.389	70.389	69.669	98.98
12	客家委員會	1	11.878	11.878	11.787	99.24
13	原住民族委員會	1	13.191	13.191	12.759	96.73
14	中央研究院	1	1.250	1.250	1.250	100.00
15	行政院環境保護署	0	43.990	43.990	43.498	98.88
	合計	105	2,229.541	2,229.541	2,043.366	91.65

註：1. 若計畫屬多機關共同辦理（如「建構民生公共物聯網」等），預算執行原則全列計於計畫彙整機關；惟以下 4 支計畫之預算執行分別歸屬各辦理機關：

- (1) 加強水庫集水區保育治理計畫（經濟部、行政院農業委員會、行政院環境保護署）。
- (2) 縣市管河川及區域排水整體改善計畫（經濟部、內政部、行政院農業委員會、交通部）。
- (3) 全國水環境改善計畫（經濟部、內政部、交通部、行政院農業委員會、行政院環境保護署）。
- (4) 公有危險建築補強重建（內政部、經濟部、衛生福利部）。

2. 行政院環境保護署為「加強水庫集水區保育治理計畫」及「全國水環境改善計畫」之共同辦理機關，無主辦計畫。

資料來源：前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算、行政院政府計畫管理資訊網（GPMnet）、各計畫 109 年度執行進度及績效報告。

表2 前瞻基礎建設計畫第2期特別預算執行情形統計表（依建設類別）
（108年1月至109年12月）

單位：億元、%

項次	建設類別	計畫 項數	第2期預算數 (108-109年)	截至109年 12月分配數 (A)	執行數 (B)	計畫經費 達成率(%) (B/A)
1	軌道建設	35	416.204	416.204	361.508	86.86
2	水環境建設	18	581.558	581.558	570.202	98.05
3	綠能建設	12	114.050	114.050	103.977	91.17
4	數位建設	19	272.309	272.309	268.638	98.65
5	城鄉建設	12	719.752	719.752	618.043	85.87
6	因應少子化友善育兒空間建設	2	22.192	22.192	19.257	86.78
7	食品安全建設	1	5.615	5.615	4.956	88.26
8	人才培育促進就業建設	6	97.859	97.859	96.784	98.90
	合計	105	2,229.541	2,229.541	2,043.366	91.65

資料來源：前瞻基礎建設計畫第2期特別預算、行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet)、各計畫109年度執行進度及績效報告。
