2.規劃辦理五股疏左地區高保護工程及新建觀音坑溪下游堤防與成州抽水站，解決當地水患，惟工程界面未整合，且部分僅止於規劃設計階段，仍潛存淹水風險，亟待妥謀善策。

水利局為解除五股二重疏洪道左岸高速公路以北淡水河二級洪水平原管制，解決當地水患問題，自 99 年起規劃辦理「五股疏左地區高保護工程」、「觀音坑溪獅子橋下游堤防工程」及「成州抽水站新建工程」等計畫，計畫總經費約 13 億 2,907 萬餘元(圖 1)。截至 107 年底止，僅完成觀音坑溪獅子橋下游堤防工程，其餘計畫尚處規劃設計階段。經查執行情形：(1)五股疏左地區高保護工程規劃設計觀音坑溪口設置閘門，卻仍辦理觀音坑溪獅子橋下游堤防工程，兩者未能相互配合，肇致堤防工程投入經費恐未達效益目標;(2)規劃新建成州抽水站迄今將屆 10 年，僅止於紙上作業，肇致成州地區仍潛存淹水風險;(3)五股疏左地區高保護工程設計完成後，卻以未具急迫性為由暫緩推動後續工程，已投入技術服務費用迄未能發揮效用等情事，經函請妥謀善策。據復：(1)已將檢討報告函送水利署審查，並研議後續改善方案，避免投資浪費；(2)成州抽水站因用地取得問題，遲遲無法落實推動，需持續檢討優

圖 1　五股疏左地區水患治理計畫執行情形概況圖




資料來源：整理自水利局提供資料。

先以公有地作為設置地點，並積極進行規劃設計作業及後續工程，以解決當地淹水問題；(3)持續向中央爭取經費，俟經費來源確定後發包施作，以發揮規劃設計預算執行效益。

3.推動無自來水及供水不佳地區飲用水品質改善計畫，改善家庭飲用水品質，惟未落實督促區公所輔導設置簡水系統，及加強水權登記暨完善水質檢驗作業，亟待研謀改善。

水利局為解決無自來水地區供水問題，改善民眾飲用水品質及配合政府照顧弱勢政策，於本年度配合經濟部編列7千萬元預算辦理「無自來水及供水不佳地區飲用水品質改善計畫」，新建及改善簡易自來水(下稱簡水)供水系統；另為促進使用簡水系統用戶落實自主營運管理，於103年訂定新北市簡易自來水事業管理辦法，輔導用戶成立簡易自來水管理委員會，加強水權登記及水質檢驗作業。經查：(1)新北市貢寮區之自來水供水率僅60.98%，且尚未輔導設置簡水系統，亟待督促輔導區公所，協助民眾加強設置簡水系統，改善家庭飲用水品質；(2)截至107年底止，列管簡水系統125處，其中未成立簡水管理委員會者有41處(圖2)，比率為32.80%，尚待輔導民眾成立；(3)截至107年底止，因涉及土地問題無法申辦水權者有93處(圖2)，比率為74.40%，亟待協助民眾排除困難並與有關單位協商研謀善策；(4)未落實督導各區公所及簡水管理委員會辦理水質檢驗，及建立相關追蹤改善機制；(5)部分簡水系統工程完成後迄未訂定收費機制，亟待積極輔導訂定。鑑於行政院國家永續發展委員會已於107年12月14日通過臺灣永續發展目標，其中核心目標6之第1項具體目標揭示：「供給量足質優的水源及自來水，保障用水安全。」經函請加強水權登記及完善水質檢驗作業。據復：(1)已積極協助偏遠地區用戶設置簡易自來水系統，並輔導自來水可及地區用戶申接自來水；(2)將加強推動輔導，逐步提升管

圖2　截至107年底止簡水系統未成立管理委員會及無法申辦水權情形圖

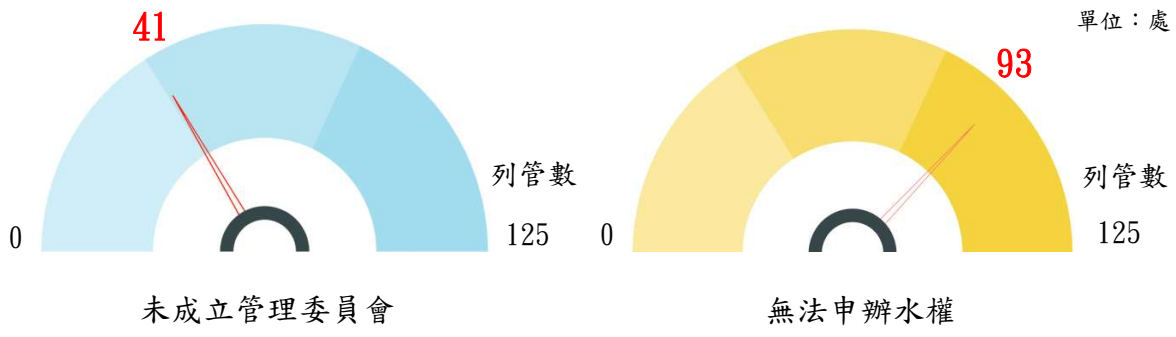

資料來源：整理自水利局提供資料。
