
年底止已完成四期建設計畫，民國104至109年度賡續辦理第五期建設計畫，據內政部統計截至民國105年底止，全國污水處理率為53.35%，其中新北市達78.45%(圖2)，僅次於臺北市及連江縣為全國第三，已接管用戶數約119萬餘戶，本年度獲內政部營建署考核甲等。經查污水下水道系統興建及營運管理情形，核有：(1)新莊、土城等地區污水下水道系統計畫期程將屆，惟實際接管率低於3成；(2)促進民間參與公共建設之廠商資產負債表償債能力比率欠佳，且出現短期借款遽增，易有營運資金調度經營困境風險，允應強化財務監督機制，慎防污水處理廠營運及相關管線工程運轉缺口；(3)未針對易引起油脂堆積地方定期巡檢；(4)江翠礫間設備損壞逾1年迄未修復等情事，經函請檢討改善。據復：(1)執行過程中將配合現況進行計畫檢討修訂以符實際，並持續辦理用戶接管事宜；(2)因興建第二期污水廠，導致廠商投資工程款較往年度增加，俟後將隨營運收益挹注而逐漸改善，並請廠商優先償還短期借貸等流動負債且於管理月報說明，以達控制之效；(3)將重新檢討巡檢頻率，並針對營業用戶之油脂截留器進行輔導及檢查，宣導正確使用觀念，以避免阻塞情形；(4)廠商已完成修繕，並延長設備保固期間。

圖 2　新北市污水處理率及接管戶數統計

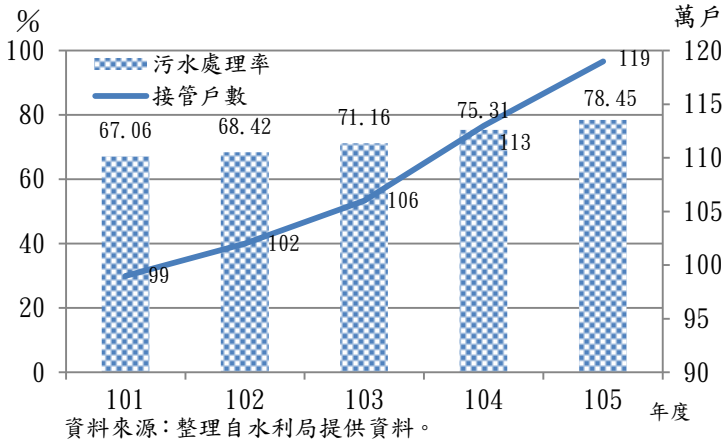

資料來源：整理自水利局提供資料。

4.轄區內汰換自來水鉛管進度攸關民眾飲用水安全，亦為各方關注焦點，惟部分地區自來水輸送管仍為鉛管，亟待研謀妥處，以維護民眾權益。

新北市轄內自來水輸送及自來水鉛管管線汰換業務，分由台灣自來水公司及臺北市政府臺北自來水事業處(以下簡稱：北水處)負責，經查三重、中和、永和及新店區等256個路段、18,727戶自來水輸送管仍是鉛管，截至105年底止已改善1萬餘戶(表9)，惟仍引發民眾對飲用水安全之憂慮，且市政府亦屢遭新聞媒體等輿論質疑隱匿相關資訊，經函請加強與北水處之溝通協調，有效掌握辦理進度，並主動定期發布資訊，以維護民眾權益。據復：將主動召開鉛管汰換平臺會議，積極給予北水處行政上協助，並每週持續追蹤控管鉛管汰換進度，加速汰換鉛管期程，適時發布汰換之資訊，俾利民眾了解，預計民國106年完成轄區90%自來水鉛管汰換，民國107年辦理完竣。

表 9　民國 105 年底止新北市鉛管分布及汰換情形

單位：戶

行政區	鉛管戶數	改善戶數	進度(%)
合　　計	**18,727**	**11,627**	**62.09**
中和區	9,187	4,839	52.67
永和區	6,870	4,522	65.82
新店區	1,397	1,084	77.59
三重區	1,273	1,182	92.85

資料來源：整理自水利局提供資料。
